

SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR (SPS) - SERVIS NON-OA
SPECIAL TERMS AND CONDITIONS (STC)

Perjanjian Nomor 2547/SPS/SCM/PP/EPC/725001/XI/2025

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di **Jakarta** pada hari **Rabu** tanggal **Dua Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-11-2025)** oleh dan antara:

nama : Niekke Kusuma Wardani
jabatan : SVP, HEAD OF OPERATION CONTROL & SUPPLY CHAIN CONTROL DIV.

nama : Bakhtiyar Efendi
jabatan : SVP, HEAD OF EPC OPERATION DIVISION

nama : Randy Mario Sihombing
jabatan : PROJECT MANAGER

alamat : Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia
nomor telepon : (021) 840 3883

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut sah mewakili untuk dan atas nama **PT PP (Persero) Tbk.** sebagai Pemberi Kerja, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

nama : Hana Gus Dwi Wijaya
jabatan : Direktur Utama

berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT SEMANGAT WAJA TAMA Nomor 763 tanggal 10-11-2019 yang dibuat di hadapan Widyarini Suryandari, S.h., M.kn, Notaris di BOGOR dengan perubahan terakhir Nomor 02 tanggal 01-10-2024 yang dibuat di hadapan Widyarini Suryandari, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor

alamat : GEDUNG M GOLD TOWER LANTAI 20 UNIT G JL KH NOER ALI, PEKAYONJAYA, Bekasi, Jawa Barat, 17148, Indonesia
nomor telepon : 622128087297

yang dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut sah mewakili untuk dan atas nama **PT SEMANGAT WAJA TAMA** sebagai penerima kerja (Vendor), yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Surat Perjanjian ini disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "**PIHAK**".

Dengan menimbang:

- berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No: 3291/SKT/SCM/PP/X/2025 tanggal 27-10-2025
- berdasarkan Surat Penawaran Harga Nomor 0001/SWT/SPH-PP/X/2025 tanggal 27-10-2025
- berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 11984/BA NEGO SERVICE/PT SEMANGAT WAJA TAMA/725001/EPC/X/2025 tanggal 31-10-2025
- berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara ("SPMKS") No. 3614/SPMKS/PP/EPC/725001/XI/2025 tanggal 09-11-2025

PARA PIHAK dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian untuk pelaksanaan **PEKERJAAN OPEN CUT & AUGER BORING PAKET 1** pada proyek **Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

- Nilai Perjanjian yang Disetujui a. Nilai Perjanjian yang disetujui yakni sebesar Rp 32.748.179.040 (terbilang: Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah).
b. Nilai sebagaimana dimaksud pada paragraf (a) di atas:



MGR-PC EPC



GM-OPS



MGR-PROC OPS EPC



SM-SCC



- i. bersifat Unit Price; dan
 - ii. sudah termasuk PPN, PPh (jika ada), keuntungan, keseluruhan biaya koordinasi dan *Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE)* di lapangan, serta biaya pajak-pajak lain sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku.
 - c. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa harga yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** akan berlaku selama Periode Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 [*Periode Pelaksanaan Pekerjaan*] STC ini.
2. Periode Pelaksanaan Pekerjaan : Periode pelaksanaan Pekerjaan terhitung sejak tanggal 12 November 2025 sampai tanggal 31 Oktober 2026.
3. Masa Perbaikan Cacat Mutu
- a. Masa Perbaikan Cacat Mutu berlaku selama dua belas (12) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan BAST I sebagaimana diatur dalam GTC Pasal 13 [*Penerimaan Sementara*].
 - b. **PIHAK KEDUA** menjamin harga yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** jika seluruh Pekerjaan atas Perjanjian ini telah selesai dilaksanakan (progress 100%)
4. Lingkup Pekerjaan
- Lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian ini terdiri dari:
- a. PEKERJAAN OPEN CUT & AUGER BORING PAKET 1 sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan HSE, Quality, Teknis dan lain lain yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pengadaan, pengiriman dan pemasangan Pekerjaan sesuai dengan *Work Order (WO)* dan *Bill of Quantity* yang tercantum pada ayat 8.a. Perjanjian ini;
 - c. pembuatan *shop drawing* dan *as build drawing, master schedule, schedule man power, schedule alat, S Curve* dan metode pelaksanaan yang dilampirkan menjadi satu kesatuan kontrak dan dipresentasikan pada saat Kick Off Meeting (KOM);
 - d. pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi personel, bahan-bahan, peralatan, dan alat-alat sesuai *manpower* dan *equipment schedule* yang disetujui **PIHAK PERTAMA**;
 - e. penyampaian informasi tertulis jika akan memobilisasi dan demobilisasi peralatan dan alat-alat; mobilisasi dan demobilisasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - f. pekerjaan persiapan yaitu kantor sementara dan bedeng pekerja serta penyediaan lahan kerja penyiapan akses/jalan menuju area konstruksi dan Lay down (jika diperlukan) untuk pelaksanaan Pekerjaan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pekerjaan dan
 - g. penyediaan tim pemeliharaan sebanyak dua (2) orang untuk pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** di Masa Perbaikan Cacat Mutu;
 - h. pelaksanaan Pekerjaan dalam dua (2) *shift* (jika diperlukan) untuk pemenuhan *schedule* yang didukung dengan terbukanya lahan/area dan adanya Pekerjaan yang tersedia; dan
 - i. pengetesan mutu Pekerjaan yang mencakup semua prosedur tes, pelaksanaan tes, dan laporan hasil pengetesan sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku dan ketentuan yang disyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan Pemilik Proyek.
 - j. Harga mengikat sampai proyek selesai
 - k. Biaya yang timbul selama standby atau kondisi tidak beroperasi karena alasan apapun termasuk namun tidak terbatas pada kondisi cuaca, keamanan dan isu sosial adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
 - l. Biaya koordinasi lingkungan dan sosial menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
 - m. Keamanan alat menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
 - n. Pekerjaan penggalian dan penimbun tanah kembali yang menjadi lingkup kerja **PIHAK KEDUA**
 - o. Penyampaian informasi tertulis jika akan ada memobilisasi dan demobilisasi peralatan
 - p. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan (*Intelligent pig*)
 - q. **PIHAK KEDUA** harus memenuhi produktivitas pekerjaan sesuai dengan yang disetujui dengan **PIHAK PERTAMA**
 - r. *Recovery Plan* apabila terjadi keterlambatan pekerjaan dari rencana (*Baseline*) yang sudah di setujui **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
 - s. **PIHAK KEDUA** menyediakan *area laydown* untuk pekerjaan ini.
 - t. Penyelesaian pekerjaan *re-instatement* **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah pekerjaan selesai
 - u. **PIHAK KEDUA** wajib untuk melakukan koordinasi untuk identifikasi dan penyelesaian pekerjaan *re-instatement*
 - v. **PIHAK KEDUA** wajib dan bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan secara menyeluruh sesuai dengan alur dan rencana pekerjaan
 - w. **PIHAK PERTAMA** dapat mengurangi volume pekerjaan jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi target yang di sampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan terdapat indikasi keterlambatan pekerjaan
 - x. **PIHAK PERTAMA** dapat merubah volume pekerjaan **PIHAK KEDUA** berdasarkan evaluasi kinerja dan waktu penambahan volume bisa diberikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme Change Order yang disepakati.
 - y. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap *housekeeping* dan bekerjasama dengan pihak terkait dalam pengelolaan limbah
 - z. Apabila **PIHAK KEDUA** dinilai tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutus kontrak secara sepihak dan dapat mengalihkan sisa pekerjaan tersebut ke vendor yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dengan semua beban dan ganti rugi menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**.

5

MGR-PC EPC

1

GM-OPS

GM

MGR-PROC OPS EPC

OK

SM-SCC



PT PP (PERSERO) TBK.



CONSTRUCTION & INVESTMENT
Empowering The Future

DIVISI : OC & SCC
DIVISI OPERASI : EPC (EPC)
PROYEK : Penyediaan Jasa PIPANISASI Bbm Cikampek - Plumpang
PROFIT CENTER : 725001
ALAMAT : Ruko Roxy Blok A No. 2 Lippo Cikarang

- aa. Mengikuti seluruh peraturan atau regulasi dari **PEMILIK PROYEK, PIHAK PERTAMA**, dan otoritas setempat terkait HSSE (*Health, Safety, Security, and Environment*)
- ab. Membuat, Memastikan dan memenuhi traffic management.
- ac. Perhitungan volume pekerjaan berdasarkan meter lari jalur pipa sesuai ROW, bukan berdasarkan meter lari pipa yang terpasang
- ad. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan informasi dan data sebagaimana diatur didalam perjanjian, jika ada, dengan ketentuan bahwa **PIHAK PERTAMA** tidak menjamin akuratnya dan/atau memadainya informasi. Informasi dan data tersebut dan risiko penggunaan informasi adalah tanggung jawab penuh **PIHAK KEDUA**.
- ae. **PIHAK KEDUA** wajib menyiapkan segala hal yang diperlukan dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi lapangan, termasuk potensi kondisi yang tidak terduga (*unforeseen conditions*), sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan. Segala biaya yang timbul akibat kondisi lapangan, termasuk namun tidak terbatas pada potensi kondisi tidak terduga (*unforeseen conditions*), menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat diklaim atau dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**
- af. **PIHAK KEDUA** wajib menyiapkan Planning sebelum memulai pekerjaan, mulai dari Schedule Pekerjaan, Metode kerja, Man Power Schedule, Equipment Schedule dan Langkah - Langkah strategis yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan dan dipresentasikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum memulai pekerjaan
- ag. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keberlangsungan dan perlindungan terhadap fasilitas umum, material Pihak Pertama, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan terhadap fasilitas umum, kondisi eksisting seperti jalan, jaringan pipa (air, gas, BBM dan lain lain), maupun isu sosial di lapangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- ah. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh pihak (pemangku kepentingan) guna memastikan penyelesaian secara efektif dan tepat waktu apabila terdapat pekerjaan yang memiliki *interface* atau keterkaitan dengan pekerjaan lain selama masa pelaksanaan
- ai. **PIHAK KEDUA** wajib menyusun dan mengimplementasikan Rencana QHSE (*Quality, Health, Safety, and Environment*) sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** serta Pihak Owner (**PT Pertamina Gas**), dan wajib mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA** sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai.
- aj. **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi dan menaati seluruh peraturan, pedoman, dan kebijakan QHSE yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan Pihak Owner (**PT Pertamina Gas**). Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran terhadap regulasi tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan internal dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau Pihak Owner
5. Pembayaran, a. Uang Muka
Prosedur Tidak ada uang muka.
Penagihan, dan b. Dasar Penagihan
Perpajakan
- i. Penerbitan *invoice* dan Faktur Pajak oleh **PIHAK KEDUA** mengacu kepada Berita Acara Lapangan (BAL) yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- ii. BAL sebagaimana disebutkan di poin (i) di atas diterbitkan berdasarkan kemajuan pelaksanaan Pekerjaan per periode satu (1) bulan atau sesuai periode yang disepakati **PARA PIHAK**.
- iii. Satu (1) *invoice* dan satu (1) Faktur Pajak dapat terdiri atas beberapa BAL, selama BAL tersebut merupakan pelaksanaan Pekerjaan yang terjadi dalam satu (1) bulan kalender.
- c. Metode Pembayaran
- SKBDN Usance 180 Hari**
- i. Pembayaran uang muka (jika ada) dan retensi dilakukan dengan metode reguler, yang akan dibayar pada waktu yang ditentukan di GTC Pasal 7 [*Pembayaran dan Prosedur Penagihan*] paragraf (c).
- ii. Pembayaran untuk selain pembayaran uang muka (jika ada) dan retensi dilakukan dengan SKBDN atau LC *Usance* 180 hari, dimana pembayaran akan dilakukan 180 hari setelah Bank Penerbit menerima Dokumen Akseptasi pembayaran yang telah divalidasi dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.
- iii. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran progres Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulan (*Monthly Progress Payment*) berdasarkan progres Pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian yang dituangkan dalam Berita Acara Lapangan (BAL) yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- iv. Nilai penerbitan SKBDN atau LC adalah nilai *Work Order* (WO) yang diterbitkan termasuk/tidak termasuk PPN dan dikurangi potongan uang muka, retensi dan PPh (jika ada).
- v. Pengembalian uang muka (jika ada) dan retensi diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran progres Pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat Pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).
- vi. Pembayaran retensi 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian yang disetujui dilaksanakan setelah ditandatanganinya BAST - II oleh **PARA PIHAK**
- d. Faktur Pajak
- i. Sehubungan dengan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai pemungut PPN, **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan kode transaksi 030 dalam setiap penerbitan Faktur Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Ketentuan Hukum Yang Berlaku



MGR-PC EPC



GM-OPS



MGR-PROC OPS EPC



SM-SCC



DIVISI : OC & SCC
DIVISI OPERASI : EPC (EPC)
PROYEK : Penyediaan Jasa Pipanisasi Bbm Cikampek - Plumpang
PROFIT CENTER : 725001
ALAMAT : Ruko Roxy Blok A No. 2 Lippo Cikarang

- ii. Penyerahan Faktur Pajak kepada **PIHAK PERTAMA** wajib disertai dengan dokumen kelengkapan pembayaran sebagaimana tertera pada GTC Pasal 7 [Pembayaran dan Prosedur Penagihan] paragraf (d).
- iii. **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN kepada **PIHAK KEDUA** atas penyeteroran PPN yang telah dipungut dari **PIHAK KEDUA** paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah penyeteroran PPN dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- iv. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** memberikan surat konfirmasi pelaporan faktur pajak kepada **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan jawaban atas surat tersebut dalam waktu maksimal 7 hari sejak **PIHAK KEDUA** menerima surat tersebut
- v. Penyerahan Faktur Pajak yang melewati tanggal lima (5) di bulan berikutnya seperti diatur dalam GTC Pasal 7 [Pembayaran dan Prosedur Penagihan] paragraf (d) atau karena alasan lainnya sehingga Faktur Pajak belum dilaporkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk dikenakan denda Faktur Pajak.
- e. Dokumen Khusus Pembayaran L/C
 - i. Dokumen yang dimaksud di sini adalah dokumen yang digunakan untuk keperluan presentasi ke Bank untuk pembayaran dengan SKBDN atau LC sebagaimana dimaksud dalam GTC Pasal 7 [Pembayaran dan Prosedur Penagihan] paragraf (j).
 - ii. Dokumen harus menggunakan format yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - iii. Dokumen dapat dibuat dari beberapa invoice dan Faktur Pajak.
 - iv. Dokumen dapat dibuat dan dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** secara bertahap, dengan syarat nilai minimal untuk setiap dokumen adalah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - v. Ketentuan pada poin (iv) di atas tidak berlaku untuk sisa tagihan atas Perjanjian ini/atau total pendatangan barang dalam satu bulan kalender yang tidak mencapai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- f. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - i. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihitung sesuai dengan rumus $12\% \times 11/12 \times \text{Nilai Kontrak}$; atau
 - ii. Nilai PPN adalah $12\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$ dimana DPP dihitung dari $11/12 \times \text{Nilai Kontrak}$.
 - iii. Tarif PPN yang tertera dalam kontrak adalah 12%, adapun perhitungan nilai PPN sesuai dengan poin (i) atau (ii) diatas.
- g. Pajak Penghasilan (PPH)
 - i. Tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar satu koma tujuh puluh lima persen (1,75%) atau sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, yang akan dipotong oleh **PIHAK PERTAMA** saat melakukan pembayaran.
 - ii. **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah penyeteroran PPh dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- h. Pembayaran atas transaksi dalam surat perjanjian dilakukan ke :
PT SEMANGAT WAJA TAMA
BANK MANDIRI Cabang Bekasi Grand Metropolitan Mall
Nomor Rekening 1670003678900

6. Pelaksanaan Pekerjaan

- a. **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan *Work Order* (WO) kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap sebagai dasar Pelaksanaan Pekerjaan, untuk tahap Awal Pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan 3 titik area pelaksanaan pekerjaan sebagai referensi untuk evaluasi performa (Qualitas, Waktu dan HSE) **PIHAK KEDUA**
- b. WO yang berlaku adalah WO yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui system SAP.
- c. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab terhadap pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebelum diterbitkannya WO dari **PIHAK PERTAMA** (Divisi OC & SCC) melalui alamat surat elektronik scm@ptpp.co.id, atau erp@ptpp.co.id.
- d. Pihak penandatangan WO dari **PIHAK PERTAMA** adalah *Manager Production and Cost Control Sect. (Mgr. PC) dan Manager, Head of Procurement Ops. Sub Dept. (Mgr. Proc - Ops.)*. Tanda tangan ini dituangkan dalam bentuk QR Code yang dibuat secara otomatis oleh sistem yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa penggunaan tanda tangan dalam bentuk QR Code tersebut sah dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- e. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi secara berkala setiap bulan untuk menilai performa atau kinerja **PIHAK KEDUA**. Apabila dalam hasil evaluasi tersebut **PIHAK KEDUA** dinyatakan mengalami keterlambatan atau tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak, atas pertimbangannya sendiri, untuk mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa menghapus kewajiban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun akibat yang ditimbulkannya
- f. Selama masa pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk sewaktu-waktu memindahkan atau mengalihkan lokasi pekerjaan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan atau mengurangi pekerjaan **PIHAK KEDUA** jika dinilai tidak perform sesuai point 6.e



MGR-PC EPC



GM-OPS



MGR-PROC OPS EPC



SM-SCC



PT PP (PERSERO) TBK.



CONSTRUCTION & INVESTMENT
Empowering The Future

DIVISI : OC & SCC
DIVISI OPERASI : EPC (EPC)
PROYEK : Penyediaan Jasa Pipanisasi Bbm Cikampek - Plumpang
PROFIT CENTER : 725001
ALAMAT : Ruko Roxy Blok A No. 2 Lippo Cikarang

7. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

- a. **PIHAK KEDUA** harus menerbitkan Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan Pasal 15 [*Jaminan*] paragraph (d) GTC berupa Bank Garansi sebesar sepuluh persen (10%) dari nilai kontrak kepada **PIHAK PERTAMA** setelah kontrak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- b. **PIHAK KEDUA** harus menjamin bahwa barang atau material yang dipasang dalam pelaksanaan pekerjaan adalah 100% (seratus persen) baru, tidak pernah digunakan, dapat dioperasikan, bersih dan bebas dari cacat apapun dan sesuai dengan spesifikasi berdasarkan perjanjian. **PIHAK KEDUA** wajib memperbaiki atau mengganti barang atau material yang rusak atau cacat atas biayanya sendiri.
- c. Peralatan dan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan harus bersertifikat dan dikalibrasi secara rutin sesuai ketentuan Hukum yang Berlaku.
- d. **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan bahwa kualitas Pekerjaan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 8 [*Uraian Nilai Perjanjian yang Disetujui*] paragraph (a) STC ini harus sesuai dengan spesifikasi yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** serta Pemilik Proyek.
- e. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan perbaikan (jika ada) dengan biayanya sendiri pada Masa Perbaikan Cacat Mutu. Jika **PIHAK KEDUA** gagal memperbaiki pekerjaan yang cacat atau rusak dalam jangka waktu wajar yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka
 - i. **PIHAK PERTAMA** berhak menugaskan atau membayarkan pihak lain untuk memperbaiki pekerjaan tersebut.
 - ii. **PIHAK KEDUA** harus menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** untuk memperbaiki pekerjaan tersebut.
 - iii. **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan GTC Pasal 34 Paragraf (h).
- f. Setelah Masa Perbaikan Cacat Mutu selesai, **PIHAK KEDUA** harus tetap bertanggung jawab terhadap setiap kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh cacat tersembunyi yang ditemukan pada Pekerjaan atau ketidaksempurnaan pada Pekerjaan. Segala biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki Pekerjaan atau mengganti barang harus ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hukum yang berlaku.
- g. Jika terdapat penambahan nilai perjanjian dan atau perpanjangan masa pelaksanaan, maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan ketentuan pada GTC Pasal (15.d.iv) dan (15.d.vi)

MGR-PC EPC

GM-OPS

MGR-PROC OPS EPC

SM-SCC



PT PP (PERSERO) TBK.



CONSTRUCTION & INVESTMENT
Empowering The Future

DIVISI : OC & SCC
DIVISI OPERASI : EPC (EPC)
PROYEK : Penyediaan Jasa PIPANISASI Bbm Cikampek - Plumpang
PROFIT CENTER : 725001
ALAMAT : Ruko Roxy Blok A No. 2 Lipso Cikarang

8. Uraian Nilai Perjanjian yang Disetujui
- a. Uraian (Unit Price) Nilai Perjanjian yang Disetujui adalah sebagai berikut.

No	Kuantitas/Volume	Deskripsi	Spesifikasi & Standar	Harga Satuan	Jumlah Harga
PEKERJAAN OPEN CUT DAN AUGER BORING PAKET 1					
KP 0+000 s/d 18+740 (ZONE-1)					
A. OPEN CUT					
	8.288,00 m	Open Cut Non Tol (Land Clearing, Stringing, Welding, NDT, FJC, Holiday test, Trenching, Lowering & Backfilling)	Sesuai dengan RFQ, BA Nego, Schedule, QHSE, TBE, Spesifikasi, dan Penawaran PIHAK KEDUA	1.878.000	15.564.864.000
	85,00 m	Pemasangan Pipeline Above Ground at LBCV		2.850.000	242.250.000
	300,00 m	Open Cut River Crossing (Zinker Under Ground)		2.850.000	855.000.000
	90,00 m	Push-Pull		2.150.000	193.500.000
	9.565,00 m	HDD Stringing, Welding, NDT, FJC		850.000	8.130.250.000
	193,00 m	Tie in Open Cut to HDD		2.800.000	540.400.000
	384,00 m	Tie in HDD to HDD		2.800.000	1.075.200.000
	10,00 m	Open Cut Road Crossing		2.800.000	28.000.000
B. BORING STRINGING, WELDING, NDT, FJC					
	74,00 m	Manual Boring		2.500.000	185.000.000
	85,00 m	Auger Boring with Casing		4.500.000	382.500.000
C. PIPELINE PRE- COMM					
	18.690,00 m	Pre-Comm (Cleaning, Gauging, Water Filling, Hydrostatic Test, Dewatering, Swabbing, Drying)		110.000	2.055.900.000
	1,00 Ls	KP marker, marker post, warning sign, aerial marker		250.000.000	250.000.000
D. PROJECT MANAGEMENT & OTHERS					
	1 Ls	Project Management		include	
	1 Ls	Mobilization dan Demobilization		include	
	1 Ls	Project Facilities & Utilities		include	
	1 Ls	Work Permit, Social, HSE Cost		include	
	1 Ls	Any other Certificate (if Needed)		include	
Total					29.502.864.000
PPN (12% x 11/12 x Total)					3.245.315.040
Nilai Perjanjian yang Disetujui					32.748.179.040
terbilang: Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah					



MGR-PC EPC



GN-OPS



MGR-PROC OPS EPC



SM-SCC



9. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- Nilai Minimum TKDN yang wajib dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar 84,07.% melalui penyampaian *Form Self Assessment* TKDN sebelum dilaksanakannya Pekerjaan.
 - Apabila kewajiban pemenuhan TKDN tidak tercapai, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda TKDN dengan besaran maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Kontrak. Verifikasi TKDN paling lambat akan dilaksanakan pada 01 Juli 2027.
 - PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan *monitoring* selama masa penyelesaian Pekerjaan
 - Untuk memastikan ketercapaian komitmen TKDN sesuai dengan *Form Self Assessment* TKDN, **PIHAK PERTAMA**, tanpa membebankan biaya kepada **PIHAK KEDUA**, akan melakukan verifikasi TKDN atas hasil penyelesaian pekerjaan **PIHAK KEDUA**
 - Verifikasi TKDN akan dilakukan oleh Pihak yang ditunjuk Pemilik Proyek, yang dilakukan secepat-cepatnya enam bulan sebelum berakhirnya masa penyelesaian pekerjaan **PIHAK PERTAMA** kepada Pemilik Proyek

10. Pernyataan dan Jaminan **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa :

- PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang diatur dan secara sah berdiri berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah memiliki seluruh kekuatan hukum yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini dan untuk melaksanakan ketentuan, syarat dan pengaturan Perjanjian ini
- Tidak ada tindakan, tuntutan atau proses hukum yang sedang tertunda atau, atas pengetahuan **PIHAK KEDUA**, yang mengancam, melawan atau mempengaruhi **PIHAK KEDUA** di hadapan pengadilan atau badan administratif atau majelis arbitrase yang mungkin secara material dan/atau secara merugikan dapat mempengaruhi kemampuan **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan
- Penandatanganan, penyerahan, pelaksanaan perjanjian ini telah disahkan oleh seluruh tindakan korporasi yang diperlukan, dan tidak akan bertentangan dengan ketentuan, atau merupakan cidera janji, dalam setiap perjanjian lainnya.

11. Korespondensi Alamat **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut.

a. **PIHAK PERTAMA**

DIV OC & SCC PT PP (Persero) Tbk.
Untuk Penerima : Restian Dini Malini
: Randy Mario Sihombing
Alamat : Jl. Letjend. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Alamat Surat Elektronik : scm@ptpp.co.id ; smart-eproc@ptpp.co.id
Nomor Ponsel : 08118727788

b. **PIHAK KEDUA**

PT SEMANGAT WAJA TAMA

Untuk Penerima : Maulana Reza
: Hana Gus Dwi Wijaya
Alamat : GEDUNG M GOLD TOWER LANTAI 20 UNIT G JL KH NOER ALI, PEKAYONJAYA, Bekasi, Jawa Barat, 17148, Indonesia
Alamat Surat Elektronik : sales@ptsemangat.co.id ; maulanareza@ptsemangat.co.id
Nomor Ponsel : 089675605139

- c. Jika para pihak melakukan pergantian personil, maka **PARA PIHAK** wajib melakukan amandemen perjanjian ini.

12. Lain-Lain

- PARA PIHAK** menyatakan bahwa penandatanganan Perjanjian ini adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili, untuk dan atas nama perseroan berdasarkan anggaran dasar masing-masing.
- PARA PIHAK** menjamin bahwa dirinya adalah badan hukum yang didirikan secara sah dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan bidang usahanya.
- Denda Keterlambatan
 - PIHAK KEDUA** menjamin penyelesaian pekerjaan selesai tepat waktu sesuai dengan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, jika terjadi keterlambatan dari **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan Pekerjaan sesuai jangka waktu penyelesaian Pekerjaan tersebut yang disebabkan karena kesengajaan dan kelalaian dari **PIHAK KEDUA** yang nyata, maka **PIHAK PERTAMA** berhak meminta pembayaran denda sebesar dua per mil (2‰) dari nilai Material yang terlambat dikirimkan, per hari keterlambatan, dengan denda maksimum keterlambatan sebesar sepuluh persen (10%) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui, denda mana merupakan hak dan upaya eksklusif **PIHAK PERTAMA** terhadap keterlambatan Pekerjaan yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Apabila ternyata **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan **PIHAK PERTAMA** telah melakukan teguran secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali mengenai hal tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak untuk memutus kontrak dan menunjuk pihak lain atas pertimbangan waktu dan kinerja untuk menyelesaikan pekerjaan, segala biaya yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** akan mendapatkan pembayaran sesuai pencapaian progress yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan Pemilik Proyek.



MGR-PC EPC



GM-OPS



MGR-PROC OPS EPC



SM-SCC



- d. Dokumen-dokumen yang membentuk Perjanjian harus dianggap saling menjelaskan satu sama lain. Jika ada konflik, ambiguitas, atau perbedaan, prioritas dokumen harus sesuai dengan urutan :
- Addendum Perjanjian ini (jika ada);
 - Special Terms and Conditions (STC) Perjanjian ini;
 - Appendix
 - General Terms and Conditions (GTC) Perjanjian ini;
 - SPMKS (jika ada)
 - RFQ dan TBE (Schedule, Spesifikasi, QHSE, AML, Spesifikasi);
 - Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
 - Surat Penawaran Harga
 - Dokumen-dokumen lain yang diterima **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan **PIHAK KEDUA**.
- e. Hal-hal yang tidak diatur dalam STC ini diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum (GTC) yang merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian ini.
- f. Dengan terbitnya Perjanjian ini, maka Perjanjian yang telah ada sebelumnya (yang tidak dapat disebutkan satu per satu) dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan dibubuhi meterai yang cukup di Jakarta pada 12 November 2025 tersebut pada awal Perjanjian ini dalam rangkap dua (2).

PIHAK KEDUA
PT SEMANGAT WAJA TAMA



Hana Gus Dwi Wijaya
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT PP (Persero) Tbk.



Nieke Kusuma Wardani
SVP, HEAD OF OPERATION CONTROL & SUPPLY
CHAIN CONTROL DIV.

Rakhtiyar Efendi
SVP, HEAD OF EPC OPERATION
DIVISION

Randy Mario Sihombing
PROJECT MANAGER



MGR-PC EPC



GM-OPS



MGR-PROC OPS EPC



SM-SCC



CONTENTS	DAFTAR ISI
1. Definition	1. Definisi
2. Acceptance of the Agreement	2. Penerimaan Perjanjian
3. Interpretation	3. Interpretasi
4. Purpose and Duration of the Agreement	4. Tujuan dan Waktu Perjanjian
5. Works Duration and Delay Damage	5. Durasi Pekerjaan dan Denda Keterlambatan
6. Accepted Amount of the Agreement	6. Nilai Perjanjian yang Disetujui
7. Payment and Invoicing Procedure	7. Pembayaran dan Prosedur Penagihan
8. Personnel	8. Personel
9. Equipment and Tools	9. Peralatan dan Alat-Alat
10. Vendor's General Obligation	10. Kewajiban Umum Vendor
11. Defect Liability Period	11. Masa Perbaikan Cacat Mutu
12. Quality and Time Assurance	12. Jaminan Kualitas dan Waktu
13. Provisional Acceptance	13. Penerimaan Sementara
14. Final Acceptance	14. Penerimaan Akhir
15. Bonds	15. Jaminan
16. Safety, Occupational Health, and Environmental Management	16. Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
17. Green Contractor Commitment	17. Komitmen Green Contractor
18. Permits, Authorization, and Licenses	18. Izin, Otorisasi, dan Lisensi
19. Documentation and Information to be Provided by the Vendor	19. Dokumentasi dan Informasi yang Akan Diberikan oleh Vendor
20. Subcontracting/Transfer of the Works	20. Subkontrak/Pengalihan Pekerjaan
21. Assignment of the Agreement	21. Penempatan Perjanjian
22. Insurance	22. Asuransi
23. Liability	23. Kewajiban
24. Force Majeure	24. Keadaan Kahar
25. Termination of the Agreement for Cause	25. Pemutusan Perjanjian Atas Sebab
26. Termination of the Agreement Without Cause	26. Pemutusan Perjanjian Tanpa Sebab
27. Applicable Law	27. Hukum yang Berlaku
28. Law Requirements	28. Persyaratan Hukum
29. Dispute Settlement	29. Penyelesaian Sengketa
30. Good Faith	30. Iktikad Baik
31. Prohibition of Corruption, Collusion, Nepotism, and Fraud	31. Larangan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dan Penipuan
32. Amendment of the Agreement	32. Amendemen Perjanjian
33. Correspondence	33. Korespondensi
34. Miscellaneous	34. Lain-Lain

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

- 1 **Definition**
 - a. Appendix means appendix STC in the Outline Agreement (OA)
 - b. Bank means the financing institution (if any) that being used for the issuance of the SKBDN or L/C and/or the Bond.
 - c. BAP means Payment Certificate approved by PT PP.
 - d. BAPS means Certificate of Progress approved by PT PP.
 - e. BAST I means Provisional Acceptance Certificate as mentioned in Article 13 [Provisional Acceptance] herein.
 - f. BAST II means Final Acceptance Certificate as mentioned in Article 14 [Final Acceptance] herein.
 - g. BASTB means Goods Handover Certificate approved by PT PP.
 - h. DO means a Delivery Order issued by PT PP to Vendor in stages.
 - i. List of Remedy means list of any minor or defect of the Vendor's Works that need to be remedied and completed by the Vendor as stipulated in Article 13 [Provisional Acceptance] herein.
 - j. GTC means General Terms and Conditions of this Agreement.
 - k. Equipment Schedule means a list that arrange the equipment needed throughout the performance of the Works.
 - l. Manpower Schedule means a list that arrange the manpower needed throughout the performance of the Works.
 - m. Lumpsum means the Accepted Amount of the Agreement is fixed and shall not be changed except in relation to variation order instructed in writing by PT PP, which changes the scope of Works.
 - n. L/C means letter of credit.
 - o. Defects Liability Period means the maintenance period provided by Vendor to PT PP with regards to its responsibility under this Agreement as stipulated in Article 11 [Defects Liability Period] herein.
 - p. Accepted Amount of the Agreement means the amount as stipulated in the Article 6 [Accepted Amount of the Agreement] herein.
 - q. Works means the permanent works, and/or the temporary works, and/or supply of goods, and/or supply of equipment, and/or supply of transportation service that need to be executed by the Vendor under the Agreement.
 - r. Taxable Business Entity means business entities that deliver taxable goods/services according to Law of Value Added Tax of Goods and Services and Luxury Sales Tax of the Republic of Indonesia.
 - s. Agreement means the STC, the GTC, the specification, the drawings, the schedules, the minutes of clarification and negotiation, and further documents (if any), as stipulated in Article 3 [Interpretation] of these GTC.
 - t. Outline Agreement (OA) is a form of Agreement that applies to all projects of PT PP or a specific project that being stipulated in the Appendix of the STC.
 - u. Non-Outline Agreement (Non-OA) is a form of Agreement that only applies to one (1) project of PT PP.
 - v. Party means PT PP or the Vendor, as the context requires.
 - w. PO means purchase order issued by PT PP.
 - x. PPh means income tax.
 - y. PPN means value added tax (VAT).
 - z. Price List means a list of unit prices for each goods/services that can be an attachment of the STC.
 - aa. PT PP means PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. as the employer.
 - bb. Owner means the party that appoints PT PP as the Contractor to carry out the Project as specified in STC
 - cc. SKBDN means Domestic Documented Credit Letters.
 - dd. SPJB means Sales of Goods Agreement.
 - ee. SPKP means Transportation Agreement.
 - ff. SPS means Subcontractor Agreement.
 - gg. SPSA means Equipment Rental Agreement.
 - hh. SPT Masa PPN means notice of Value Added Tax Period.
 - ii. STC means Special Terms and Conditions of this Agreement.
 - jj. Vendor means any legal entity named in the Agreement as a goods/services provider, or any legal entity appointed by the Agreement as a vendor.
 - kk. Unit Price means the measurement of works shall be based on the

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

- 1 **Definisi**
 - a. Appendix adalah appendix STC Perjanjian OA
 - b. Bank adalah institusi pendanaan (bila ada) yang digunakan dalam penerbitan SKBDN atau L/C dan/atau Jaminan.
 - c. BAP adalah berita acara pembayaran yang disetujui oleh PT PP.
 - d. BAPS adalah Berita Acara Progres yang disetujui oleh PT PP.
 - e. BAST I adalah Berita Acara Serah Terima sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 [Penerimaan Sementara] GTC ini.
 - f. BAST II adalah Berita Acara Serah Terima Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 [Penerimaan Akhir] GTC ini.
 - g. BASTB adalah Berita Acara Serah Terima Barang yang disetujui oleh PT PP.
 - h. DO adalah Delivery Order yang diterbitkan secara bertahap oleh PT PP kepada Vendor
 - i. Daftar Perbaikan Pekerjaan adalah daftar yang berisi kekurangan atau cacat dari hasil Pekerjaan Vendor yang harus diperbaiki dan diselesaikan oleh Vendor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 [Penerimaan Sementara] GTC ini.
 - j. GTC adalah Syarat dan Ketentuan Umum dalam Perjanjian ini.
 - k. Jadwal Peralatan adalah daftar yang mengatur kebutuhan penggunaan peralatan selama pelaksanaan Pekerjaan.
 - l. Jadwal Tenaga Kerja adalah daftar yang mengatur kebutuhan tenaga kerja selama pelaksanaan Pekerjaan.
 - m. Lumpsum adalah Nilai Perjanjian yang Disetujui tetap dan tidak berubah kecuali ada variation order yang diinstruksikan tertulis oleh PT PP yang merubah lingkup Pekerjaan
 - n. L/C adalah letter of credit.
 - o. Masa Perbaikan Cacat Mutu adalah jangka waktu pemeliharaan oleh Vendor kepada PT PP sehubungan dengan tanggung jawabnya dalam Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 [Masa Perbaikan Cacat Mutu] GTC ini.
 - p. Nilai Perjanjian yang Disetujui adalah nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 [Nilai Perjanjian yang Disetujui] GTC ini.
 - q. Pekerjaan adalah pekerjaan permanen dan/atau pekerjaan sementara, dan/atau penyediaan barang, dan/atau penyediaan alat, dan/atau penyediaan jasa transportasi yang membutuhkan pelaksanaan oleh Vendor sesuai dengan Perjanjian.
 - r. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang/jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Republik Indonesia.
 - s. Perjanjian adalah STC, GTC, spesifikasi, gambar, jadwal, berita acara klarifikasi dan negosiasi, dan dokumen lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 [Interpretasi] GTC ini.
 - t. Perjanjian OA (Outline Agreement) adalah bentuk Perjanjian yang berlaku untuk seluruh proyek PT PP atau proyek PT PP yang diatur dalam Apendiks STC.
 - u. Perjanjian Non-OA (Non-Outline Agreement) adalah bentuk Perjanjian yang hanya berlaku untuk satu (1) proyek PT PP.
 - v. Pihak adalah PT PP Vendor, sesuai dengan konteks.
 - w. PO adalah surat pembelian yang dikeluarkan oleh PT PP.
 - x. PPh adalah pajak penghasilan.
 - y. PPN adalah pajak pertambahan nilai.
 - z. Price List adalah daftar harga satuan untuk setiap barang/jasa yang dapat menjadi lampiran STC.
 - aa. PT PP adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebagai pemberi kerja.
 - bb. Pemilik Proyek adalah pihak yang menunjuk PT PP sebagai kontraktor untuk pelaksanaan Proyek yang ditentukan di STC
 - cc. SKBDN adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.
 - dd. SPJB adalah Surat Perjanjian Jual Beli.
 - ee. SPKP adalah Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan.
 - ff. SPS adalah Surat Perjanjian Subkontraktor.
 - gg. SPSA adalah Surat Perjanjian Sewa Alat.
 - hh. SPT Masa PPN adalah surat pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai.
 - ii. STC adalah Syarat dan Ketentuan Khusus dari Perjanjian ini.
 - jj. Vendor adalah setiap badan usaha yang ada dalam Perjanjian ini sebagai penyedia barang/jasa, atau setiap badan usaha yang ditunjuk dalam Perjanjian sebagai Vendor.
 - kk. Unit Price adalah perhitungan hasil pekerjaan berdasarkan

actual quantities, and any quantities set out in the BoQ are estimated quantities.

- ii. WO means a Work Order issued by PT PP to Vendor in stages
mm. Back List Sanction means a sanction imposed to Vendor prohibiting Vendor from participating in the procurement of goods/services at PT PP within a certain period.

2 Acceptance of the Agreement

The Vendor shall provide PT PP a written acceptance of Agreement and signed by a person with legal authorization for such purposes not later than five (5) days from the date of Agreement documents are received. The failure to do so shall entitle PT PP to unilaterally cancel the Agreement.

3 Interpretation

a. The Agreement embodies the entire agreement between PT PP and the Vendor. Parties shall not be bound by any statement, representation, promise, inducement, or understanding of any kind not set forth in the Agreement. Any change, amendment, or modification of any of the term and condition of the Agreement shall be made in writing and executed by the Parties. The Vendor that execute the Works with its own conditions which those conditions haven't been specifically agreed by the Parties and incorporated in the Agreement or its Addendum, then those conditions shall be waived.

b. In these GTC, unless they are otherwise stated, or the context otherwise requires:

i. the headings are designed for ease of reference only, and shall not be used to interpret any provision of these GTC;

ii. words indicating one gender include all genders;

iii. words indicating the singular also include the plural and words indicating the plural also include the singular;

iv. the term "Article" refers to the specified Article of these GTC;

v. all references to days shall be deemed to be references to calendar days; and

vi. reference to the word "including" or variations thereof shall be construed without limitation.

c. The documents forming the Agreement are to be taken as mutually explanatory of one another. If there is any conflict, ambiguity, or discrepancy, the priority of the documents shall be in accordance with the following sequence:

i. the Addendum of the Agreement (if any);

ii. the STC, Appendix (Appendix for OA Agreement);

iii. these GTC;

iv. the minutes of clarification and negotiation;

v. the specification;

vi. the drawings (if any);

vii. the schedule (if any); and

viii. further documents (if any) which are listed in the Agreement.

4 Purpose and Duration of the Agreement

a. The purpose of the Agreement is the provision of the Works stated under the terms and conditions provided in the Agreement.

b. The Agreement shall be in effect until the end of the Works performance period as stipulated in the STC or until the effective date of Agreement termination (if any) pursuant to Article 25 [Termination of the Agreement for Cause] or Article 26 [Termination of the Agreement Without Cause] of these GTC.

c. If Article 11 [Defects Liability Period] is not waived in the STC, then the end of the Agreement shall be until the end of the Defects Liability Period or until the effective date of Agreement termination (if any) pursuant to Article 25 [Termination of the Agreement for Cause] or Article 26 [Termination of the Agreement Without Cause] of these GTC.

5 Works Duration and Delay Damage

a. Duration of the completion of Works is as Works Period stipulated under the STC.

volume realisasi, dan volume yang tercantum dalam BoQ merupakan volume perkiraan.

ii. WO adalah Work Order yang diterbitkan oleh PT PP kepada Vendor secara bertahap.

mm. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Vendor berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di PT PP dalam jangka waktu tertentu.

2 Penerimaan Perjanjian

Vendor harus menyerahkan kepada PT PP penerimaan Perjanjian secara tertulis dan ditandatangani oleh seseorang yang berwenang dan sah secara hukum untuk hal tersebut tidak lebih dari lima (5) hari dari tanggal dokumen Perjanjian diterima. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut akan memberikan hak kepada PT PP untuk membatalkan Perjanjian tersebut secara sepihak.

3 Interpretasi

a. Perjanjian meliputi seluruh perjanjian antara PT PP dan Vendor. Para Pihak tidak akan terikat dengan pernyataan, gambaran, janji, bujukan, atau pemahaman apa pun yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini. Setiap perubahan, amandemen, atau modifikasi atas setiap syarat dan ketentuan dari Perjanjian harus dibuat secara tertulis dan dilaksanakan oleh Para Pihak. Vendor yang melaksanakan Pekerjaan dengan syarat tertentu, di mana syarat tertentu tersebut tanpa disetujui Para Pihak yang dimasukkan dalam Perjanjian atau Addendum Perjanjian, maka syarat tertentu tersebut akan diabaikan.

b. Dalam GTC ini, kecuali disebutkan sebaliknya, atau hubungan sebaliknya membutuhkan:

i. judul dirancang untuk memudahkan referensi saja, dan tidak boleh digunakan untuk menafsirkan ketentuan apa pun dari GTC ini;

ii. kata-kata yang menyatakan satu gender berlaku untuk semua gender;

iii. kata-kata yang menyatakan tunggal berlaku untuk jamak dan kata-kata yang menyatakan jamak berlaku untuk tunggal;

iv. istilah "Pasal" mengacu pada Pasal dari GTC ini;

v. seluruh kata hari akan dianggap sebagai hari kalender; dan

vi. referensi terhadap kata "termasuk" atau variasi dari hal tersebut harus ditafsirkan tanpa batasan.

c. Dokumen-dokumen yang membentuk Perjanjian harus dianggap saling menjelaskan satu sama lain. Jika ada konflik, ambiguitas, atau perbedaan, prioritas dokumen harus sesuai dengan urutan berikut:

i. Addendum Perjanjian (jika ada);

ii. STC, Appendix (Appendix untuk Perjanjian OA);

iii. GTC;

iv. berita acara klarifikasi dan negosiasi;

v. spesifikasi;

vi. gambar (jika ada);

vii. jadwal (jika ada); dan

viii. dokumen lain (jika ada) yang tercantum dalam Perjanjian ini.

4 Tujuan dan Waktu Perjanjian

a. Tujuan Perjanjian adalah untuk penyediaan Pekerjaan sesuai yang tercantum dalam syarat dan ketentuan yang ada dalam Perjanjian.

b. Perjanjian akan berlaku sampai tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tertera dalam STC atau sampai tanggal efektif pemutusan Perjanjian (jika ada) sesuai dengan Pasal 25 [Pemutusan Perjanjian atas Sebab] atau Pasal 26 [Pemutusan Perjanjian Tanpa Sebab] GTC ini.

c. Jika Pasal 11 [Masa Perbaikan Cacat Mutu] tidak dikesampingkan di STC, maka akhir Perjanjian adalah akhir Masa Perbaikan Cacat Mutu atau sampai tanggal efektif pemutusan Perjanjian (jika ada) sesuai dengan Pasal 25 [Pemutusan Perjanjian atas Sebab] atau Pasal 26 [Pemutusan Perjanjian Tanpa Sebab] GTC ini.

5 Durasi Pekerjaan dan Denda Keterlambatan

a. Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan adalah sebagaimana Periode Pelaksanaan Pekerjaan yang tertera di STC.

- b. Unless otherwise provided in the STC, if the Vendor fails to complete the Works within the Works Period as specified in STC or milestone of the Works (if any), Vendor shall pay liquidated damages to PT PP in amount of one per mil (1‰) of the Accepted Amount of the Agreement for each day of delay, up to a maximum five percent (5%) of the Accepted Amount of Agreement, without prejudice to PT PP's right to bring any other claim and/or seek any other compensation provided by applicable law and regulations.
- 6 Accepted Amount of Agreement**
- a. The Accepted Amount of Agreement of Non-OA Agreement shall be stated in the STC and OA Agreement shall be stated in PO made in accordance with the Appendix.
- b. The unit rates of Works are fixed for the Period of the Works and not subject to escalation, and are inclusive of all compensation for accomplishing the Works and performing all Vendor's obligations under the Agreement.
- 7 Payment and Invoicing Procedure**
- a. Payment is subject to a complete and proper provision of the Works as defined in the STC.
- b. PT PP shall make a payment using one of the following methods, as stipulated in the STC:
- regular: via bank transfer; or
 - SKBDN or L/C which issued by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. or other Banks appointed by PT PP.
- c. PT PP shall make payment to Vendor with the following duration:
- regular: ninety (90) days from the invoices verified and validated by PT PP including its supporting documents
 - SKBDN or L/C: the duration shall be specified in STC
- d. For payment, documents shall be attached as:
- one (1) set of invoices complete with Vendor's signature, duty stamp, and Vendor's stamp which show an amount equal to invoice amount including VAT amount (if any);
 - e-tax invoice;
 - E-NOFA/Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak;
 - copy of the last period of Periodic Tax Return (SPT Masa) PPN that has been due;
 - copy of a tax Exemption Certificate (SKB) issued by the Directorate General of Taxes (DJP) (if any); and
 - copy of signed STC/Appendix PO by the Parties.
- If required by Applicable Laws PT PP's as a PPN (VAT) collector, the Vendor shall submit to PT PP, the Tax Invoice collected by PT PP including the abovementioned payment documents not later than the 5th day of the following month.
- e. For payment under the SPJB Agreement, the documents as mentioned in paragraph (d) above shall be added with the following documents:
- copy of Goods Receipt (GR); signed by authorized personnel of PT PP's project; and
 - original delivery note; complete with signature and stamp from authorized personnel of PT PP's project for delivery with franco incoterm Minutes of Goods Expenditure (Loco) for delivery with locoincoterms.
- The Minutes of Goods Expenditure (Loco) shall at least mention list of goods with the quantity/volume that handed over from supplier to transporter.
- f. For payment under the SPS Agreement, the documents as mentioned in paragraph (d) above shall be added with the following documents:
- copy of Site Progress Certificate; which states the percentage of Works completion, signed by both Parties or their authorized representatives; and
 - copy of Payment Certificate, which states the calculation of the current invoice amount, signed by both Parties or their
- b. Kecuali ditentukan lain dalam STC, jika Vendor gagal menyelesaikan Pekerjaan sesuai Periode Pelaksanaan Pekerjaan dalam STC atau sesuai milestone Pekerjaan (jika ada), Vendor wajib membayar denda keterlambatan Pekerjaan kepada PT PP sebesar satu per mil (1‰) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui atas setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimum keterlambatan sebesar lima persen (5%) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui, tanpa mengurangi hak PT PP untuk membawa tuntutan lain dan/atau mencari kompensasi lain yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 6 Nilai Perjanjian yang Disetujui**
- a. Nilai Perjanjian yang Disetujui Perjanjian Non-OA disebutkan di dalam STC dan Perjanjian OA disebutkan di dalam PO yang dibuat berdasarkan Appendix.
- b. Harga satuan Pekerjaan tetap selama Periode Pelaksanaan Pekerjaan, tidak berlaku eskalasi dan termasuk semua kompensasi untuk menyelesaikan pekerjaan dan pelaksanaan semua kewajiban Vendor berdasarkan Perjanjian.
- 7 Pembayaran dan Prosedur Penagihan**
- a. Pembayaran tergantung dari penyelesaian dan penyediaan ketentuan Pekerjaan yang baik dan benar sebagaimana didefinisikan di STC.
- b. PT PP wajib melakukan pembayaran menggunakan salah satu metode berikut, sebagaimana tertera di STC:
- regular: melalui transfer bank; atau
 - SKBDN atau L/C yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau Bank lain yang ditunjuk oleh PT PP.
- c. PT PP akan melakukan pembayaran kepada Vendor dalam waktu sebagai berikut:
- regular: sembilan puluh (90) hari dari invoice yang terverifikasi dan tervalidasi oleh PT PP termasuk dokumen pendukungnya.
 - SKBDN atau L/C: waktunya ditentukan di dalam STC.
- d. Untuk pembayaran, dokumen yang harus dilampirkan adalah:
- satu (1) set invoice lengkap dengan tanda tangan Vendor, meterai, dan stempel Vendor yang menunjukkan nilai sama dengan nilai invoice termasuk PPN (jika ada);
 - e-faktur pajak;
 - E-NOFA/Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak;
 - salinan SPT Masa PPN untuk masa terakhir yang telah jatuh tempo;
 - salinan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak dari DJP (jika ada); dan
 - salinan STC/Appendix PO yang sudah ditandatangani Para Pihak.
- Apabila diwajibkan oleh Hukum yang berlaku PT PP sebagai pemungut PPN, maka Vendor harus menyerahkan kepada PT PP, Faktur Pajak yang dipungut oleh PT PP termasuk dokumen pembayaran di atas tidak lebih dari tanggal lima (5) bulan berikutnya.
- e. Untuk pembayaran pada Perjanjian SPJB, dokumen yang disebutkan di paragraf (d) di atas harus ditambahkan dengan dokumen berikut:
- salinan Goods Receipt (GR); ditandatangani oleh personel proyek PT PP yang berwenang;
 - surat jalan asal; lengkap dengan tanda tangan dan stempel dari personel proyek PT PP yang berwenang untuk pengiriman barang dengan incoterm franco atau Berita Acara Pengeluaran Barang (Loco) untuk pengiriman barang dengan incoterm loco.
- Berita Acara Pengeluaran Barang (Loco) setidaknya menyebutkan daftar barang beserta kuantitas/volumenya yang diserahkan vendor penyedia barang kepada vendor penyedia jasa transportasi.
- f. Untuk pembayaran pada Perjanjian SPS, dokumen yang disebutkan di paragraf (d) di atas agar ditambahkan dengan dokumen berikut:
- salinan Berita Acara Lapangan (BAL); yang menyatakan persentase penyelesaian Pekerjaan, ditandatangani kedua Pihak atau wakilannya yang berwenang; dan
 - salinan Berita Acara Pembayaran, yang menuliskan perhitungan nilai invoice, ditandatangani kedua Pihak atau wakilannya

- authorized representatives.
- iii. Copy of Work Order (for Non-Outline Agreement)
- g. For payment under the SPKP Agreement, the documents as mentioned in paragraph (d) above shall be added with the following documents:
- i. Goods Delivery Certificate, which states that the Goods have been delivered by the Vendor to the project site; signed by both Parties or their authorized representatives; and
- ii. copy of delivery note; complete with signature and stamp from authorized personnel of PT PP's project.
- h. For advance payment (if specified in the STC), the documents as mentioned in paragraph (d) above shall be added with the following document:
- i. copy of Advance Payment Bond.
- i. For the five percent (5%) payment of retention, according to Article 13 [Provisional Acceptance] paragraph (c), the documents as mentioned in paragraph (d) above shall be added with the following document:
- i. copy of signed BAST II signed by both Parties or their authorized representatives.
- j. For SKBDN or L/C payment, for the purpose of presentation to the Bank, please add the abovementioned documents with the documents as listed below:
- i. one (1) set of invoices, complete with Vendor's signature, duty stamp, and Vendor's stamp which show an amount equal to invoice amount deducted by PPN amount (if any) and PPh amount (if any);
- ii. BAP which show an amount equal to invoice amount deducted by PPN amount (if any) and PPh amount (if any);
- iii. BAPS or BASTB which show an amount equal to invoice amount deducted by PPN amount (if any) and PPh amount (if any), as stated in the swift of SKBDN or L/C; and
- iv. other documents as stated in the swift of SKBDN or L/C.
- k. PT PP shall only pay invoices that meet the required terms and conditions.
- l. Taxes**
PT PP shall be responsible for paying the taxes to which is subject under Applicable Law.
- For the Vendor transactions that PT PP withholds the PPH, PT PP shall provide to Vendor a withholding income tax slip.
- m. PT PP shall be entitled to suspend the payment of the work to the Vendor if the Vendor fails to fulfil its contractual obligation. The amount that is suspended will be paid after the Vendor fulfils its obligations, and the Vendor shall not be entitled to claim any compensation due to the payment suspension.
- 8 Personnel**
- a. The personnel assigned by, or on behalf of, Vendor must be qualified, competent, and sufficiently experienced to perform the Works. All such Personnel must have the qualifications, certifications, experience, and training required under all applicable health, environmental, and safety practices, and any other requirements of the Applicable Law.
- b. Vendor shall provide, or cause to be provided, all necessary training, education, instruction, supervision, and certification for Vendor's Personnel to carry out the Works in the Agreement.
- c. Vendor shall maintain a disciplined, lawful, and orderly behavior among Vendor's personnel during the performance of the Works. If instructed by PT PP, Vendor shall replace or remove its Personnel at its sole expense, any Personnel who PT PP determines, in its sole judgment, is unsatisfactory because of non-compliance with the requirements of this Agreement.
- yang berwenang;
- iii. Salinan Work Order (untuk Perjanjian Non-OA)
- g. Untuk pembayaran pada Perjanjian SPKP, dokumen yang disebutkan di paragraf (d) di atas agar ditambahkan dengan dokumen berikut:
- i. Berita Acara Penerimaan Barang, yang menyatakan bahwa Barang telah dikirimkan oleh Vendor ke lokasi proyek, ditandatangani kedua Pihak atau perwakilannya yang berwenang; dan
- ii. salinan surat jalan; lengkap dengan tanda tangan dan stempel dari personel proyek PT PP yang berwenang.
- h. Untuk pembayaran uang muka (jika ditentukan di STC), dokumen yang disebutkan di paragraf (d) di atas agar ditambahkan dengan dokumen berikut:
- i. salinan Jaminan Uang Muka.
- i. Untuk pembayaran lima persen (5%) retensi, sesuai dengan Pasal 13 [Penerimaan Sementara] paragraf (c), dokumen yang disebutkan di paragraf (d) di atas agar ditambahkan dengan dokumen berikut:
- i. salinan BAST II yang telah ditandatangani oleh kedua Pihak atau perwakilannya yang berwenang.
- j. Untuk pembayaran dengan SKBDN atau L/C, untuk keperluan presentasi ke Bank, agar dokumen-dokumen di atas ditambahkan dengan dokumen berikut:
- i. satu (1) set invoice lengkap dengan tanda tangan Vendor, meterai, dan stempel Vendor yang menunjukkan nilai sama dengan nilai invoice dikurangi dengan PPN (jika ada) dan PPh (jika ada);
- ii. BAP yang menunjukkan nilai sama dengan nilai invoice dikurangi dengan PPN (jika ada) dan PPh (jika ada);
- iii. BAPS atau BASTB yang menunjukkan nilai sama dengan nilai invoice dikurangi dengan PPN (jika ada) dan PPh (jika ada), sesuai dengan yang tercantum dalam swift SKBDN atau L/C; dan
- iv. dokumen lain sesuai yang tercantum dalam swift SKBDN atau L/C.
- k. PT PP hanya akan membayar invoice yang memenuhi syarat dan ketentuan.
- l. Pajak**
PT PP bertanggung jawab untuk membayar pajak yang harus dilakukan menurut Hukum yang Berlaku.
- Untuk transaksi Vendor yang dipotong PPh oleh PT PP, maka PT PP harus memberikan Vendor bukti pemotongan PPh.
- m. PT PP berhak menangguhkan pembayaran pekerjaan kepada Vendor jika Vendor tidak memenuhi kewajiban kontraknya. Jumlah yang ditunda tersebut akan dibayarkan setelah Vendor memenuhi kewajibannya tersebut dan Vendor tidak berhak menuntut kompensasi apapun akibat penundaan pembayaran tersebut.
- 8 Personnel**
- a. Personel yang ditunjuk oleh, atau atas nama, Vendor harus berkualitas, berkompeten, dan berpengalaman cukup untuk melaksanakan Pekerjaan. Seluruh Personel tersebut harus memiliki kualifikasi, sertifikasi, pengalaman, dan pelatihan yang diperlukan dalam seluruh praktik kesehatan, lingkungan, dan keselamatan yang berlaku, dan persyaratan lain menurut Hukum yang Berlaku.
- b. Vendor harus menyediakan, atau membuat tersedianya, seluruh pelatihan, pendidikan, instruksi, supervisi, dan sertifikasi untuk Personel Vendor yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
- c. Vendor harus menjaga kedisiplinan, kepatuhan hukum, dan perilaku yang tertib di antara personel Vendor selama pelaksanaan Pekerjaan. Apabila diinstruksikan oleh PT PP, Vendor harus mengganti atau melepaskan Personelnya atas biayanya sendiri, setiap Personel yang ditentukan PT PP, dalam penilaiannya sendiri, tidak memuaskan karena ketidakpatuhan terhadap persyaratan Perjanjian ini.

9 Equipment and Tools

- a. All equipment and tools provided by Vendor and used in the performance of the Works, including all apparatus, machinery, vehicles, vessels, must be in good working order and repair, and be suitable for and capable of performing the Works as and when required under this Agreement.
- b. Vendor shall do all the following:
- operate all equipment provided by Vendor in conformity with all Applicable Law and manufacturer's requirements;
 - maintain such equipment in a proper and safe operating condition; and
 - promptly make any repair needed for the proper and safe operation of such equipment at Vendor's sole cost and expense.
- c. If during the performance of the Works Vendor suffers a loss or irreparable breakdown of equipment used in providing the Works for any reason, Vendor shall promptly replace that equipment at Vendor's sole cost and expense.

10 Vendor's General Obligation

- a. The Vendor shall execute and complete the Works in accordance with the Agreement and with PT PP's instructions, and shall remedy any defect in the Works.
- b. The Vendor guarantees compliance, without exception, with all the contractual obligations established under the Agreement, especially with respect to the price and time period for providing Works, and that the Works have been correctly provided according to the specifications in the Agreement and in accordance with the Applicable Law.
- c. The Vendor guarantees that the Works will meet the required quality conditions, be free of visible and/or hidden defects, and be fit for their intended use.
- d. If the Vendor has proven to perform Works which do not meet the specifications listed in the Agreement, the Vendor must remedy or replace the Works which meet the specifications listed in the Agreement, not later than seven (7) days from the date that the Vendor receives the PT PP's notice and all the costs incurred shall be the responsibility of the Vendor.
- e. Failure by the Vendor to remedy a default in the Works within seven (7) days after receiving PT PP's notice may entitle PT PP to make a claim under the Bonds under Article 15 [Bonds] of these GTC.
- f. The Vendor must comply with any instructions given by PT PP relating to Vendor's obligations under the Agreement. If the Vendor does not carry out instructions from PT PP within seven (7) days of its issuance, the Vendor will be imposed a fine in the amount of Rp. 3,500,000 per day of delay until the Vendor complies with the said instruction.

11 Defects Liability Period

- a. Unless otherwise stated in the STC, the Defect Liability Period will be twelve (12) months from the issuance of BAST I.
- b. Regardless of the duration of the Defect Liability Period, the Vendor shall be responsible for hidden defects in the Works pursuant to Applicable Law.
- c. PT PP shall be entitled to extend the Defects Liability Period if the Works, part of a major item of equipment cannot be used for the intended purposes due to a defect or damage which is not attributable to PT PP. The extension of the Defects Liability Period shall not exceed two (2) years.

12 Quality and Time Assurance

- a. The Vendor guarantees the performance of the Works in accordance with the quality and schedule requirements provided in the Agreement.
- b. PT PP's Personnel shall at all reasonable times:
- have full access to all parts of the site and to all places from which the Works being executed; and
 - during production, manufacture, and construction (at the site and

9

Peralatan dan Alat-Alat

- a. Seluruh peralatan dan alat-alat yang disediakan oleh Vendor dan digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan, termasuk peralatan, mesin, kendaraan dan kapal, harus dalam keadaan baik, dan sesuai untuk dan mampu melakukan Pekerjaan sebagaimana dan ketika diperlukan berdasarkan Perjanjian ini.
- b. Vendor harus melakukan semua hal berikut:
- menjalankan seluruh peralatan yang disediakan oleh Vendor sesuai dengan seluruh Hukum Yang Berlaku dan persyaratan pabrik;
 - mempertahankan peralatan tersebut dalam kondisi operasi yang benar dan aman; dan
 - segera melakukan perbaikan yang dibutuhkan untuk menjalankan peralatan tersebut dengan benar dan aman dengan biaya dan pengeluaran Vendor sendiri.
- c. Apabila dalam masa pelaksanaan Pekerjaan Vendor mengalami kehilangan atau kerusakan peralatan yang tidak dapat diperbaiki yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan untuk alasan apa pun, Vendor harus segera mengganti peralatan tersebut dengan biaya dan pengeluaran Vendor sendiri.

10

Kewajiban Umum Vendor

- a. Vendor akan melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian dan dengan instruksi PT PP, dan akan memperbaiki setiap cacat dalam Pekerjaan.
- b. Vendor menjamin kepatuhan, tanpa pengecualian, dengan seluruh kewajiban kontraktual yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian, terutama berkenaan dengan harga dan jangka waktu penyediaan Pekerjaan, dan bahwa Pekerjaan telah diberikan dengan benar sesuai dengan spesifikasi dalam Perjanjian dan sesuai dengan Hukum yang Berlaku.
- c. Vendor menjamin bahwa Pekerjaan akan memenuhi kondisi kualitas yang dibutuhkan, bebas dari cacat yang terlihat dan/atau tersembunyi, dan dapat digunakan.
- d. Apabila Vendor terbukti melakukan Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Perjanjian, Vendor wajib memperbaiki atau mengganti Pekerjaan sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian, selambat-lambatnya dalam jangka waktu tujuh (7) hari sejak tanggal Vendor menerima pemberitahuan dari PT PP dan seluruh biaya yang timbul akibat dari hal tersebut menjadi tanggung jawab Vendor.
- e. Kegagalan oleh Vendor untuk memperbaiki ketidaksesuaian Pekerjaan dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima pemberitahuan dari PT PP dapat memberi hak kepada PT PP untuk mengajukan klaim berdasarkan Jaminan sebagaimana Pasal 15 [Jaminan] dalam GTC ini.
- f. Vendor harus mematuhi segala instruksi yang diberikan oleh PT PP yang berhubungan dengan kewajiban Vendor sesuai dengan Perjanjian. Jika Vendor tidak melaksanakan instruksi dari PT PP tersebut dalam waktu tujuh (7) hari sejak dikeluarkannya, maka Vendor akan dikenakan denda senilai Rp 3.500.000 per hari keterlambatan sampai Vendor mematuhi instruksi tersebut.

11

Masa Perbaikan Cacat Mutu

- a. Kecuali dinyatakan lain dalam STC, Masa Perbaikan Cacat Mutu akan menjadi dua belas (12) bulan sejak terbitnya BAST I.
- b. Terlepas dari durasi Masa Perbaikan Cacat Mutu, Vendor harus bertanggung jawab atas cacat yang tersembunyi atas Pekerjaan sesuai dengan Hukum yang Berlaku.
- c. PT PP berhak memperpanjang Masa Perbaikan Cacat Mutu jika Pekerjaan, bagian Pekerjaan atau bagian utama peralatan tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan penggunaannya karena cacat atau kerusakan yang bukan disebabkan oleh PT PP. Perpanjangan Masa Perbaikan Cacat Mutu tersebut tidak melebihi dua (2) tahun.

12

Jaminan Kualitas dan Waktu

- a. Vendor menjamin kinerja Pekerjaan sesuai dengan persyaratan kualitas dan jadwal yang tercantum dalam Perjanjian.
- b. Personel PT PP setiap saat harus:
- memiliki akses penuh keseluruhan bagian lapangan dan keseluruhan tempat di mana Pekerjaan dilaksanakan; dan
 - selama masa produksi, pembuatan, dan konstruksi (di lapangan

elsewhere), been titled to examine, inspect, measure, and test the materials and the processes, and to check the progress of manufacturing thematerials.

- c. The Vendor shall give notice to PT PP's personnel whenever any Work is ready to commence. The PT PP's personnel shall then either

carry out the examination, inspection, measurement, or testing without unreasonable delay, or promptly give notice to the Vendor that the PT PP's personnel does not required to do so. If the Vendor fails to give the notice, he shall, if and when required by the PTPP's personnel, uncover the Work and there after reinstate and make good, all at the Vendor's cost.

- d. The Vendor shall give PT PP's personnel full opportunity to carry out these activities, including providing access, facilities, permissions, and safety equipment. No such activity shall relieve the Vendor from any obligation or responsibility.

13 Provisional Acceptance

- a. The Vendor may apply by notice to the PT PP for a BAST I not earlier than fourteen (14) days before the Works of the Non-Outline Agreement or all issued Purchase Orders based on the Outline Agreement at one (1) specific project of PT PP will, in the Vendor's opinion, be complete and ready for taking over. Vendor shall submit the Works result cleanly and ready to use, without any remains, debris, and trash during the implementation of the Works in the site location as referred to in the Agreement.

- b. PT PP within twenty eight (28) days after receiving a request from the Vendor shall:

- issues BAST I to the Vendor, stating the date on which the Works were completed in accordance with the Non-Outline Agreement or in accordance with all Purchase Orders issued based on one Outline Agreement at one (1) specific project of PTPP; or
- reject the application by giving a written notice to the Vendor, with reasons. This written notice shall include a List of Remedy that specify the works required to be done and the defects required to be submitted by the Vendor to enable BAST I to be issued.

Vendor shall then remedy/complete List of Remedy under PT PP instructions. Having completed/ remedied the List of Remedy under PT PP instruction, PT PP shall be entitled to assess towards the Works result which have been done by the Vendor. If the result of the remedy assessment above mentioned has been complied, PT PP shall issues the BAST I.

- c. After the BAST I has been issued, the Vendor shall be entitled to receive a payment in the amount of ninety five percent (95%) of the Accepted Amount of the Agreement. The remaining five percent (5%) from the amount or the total amount the retentions deduction that shall be paid after the conditions stated in Article 14 [Final Acceptance] herein has been fulfilled.

- d. BAST I shall be issued after the Vendor fulfils the following conditions

- the Works has been done under the Agreement and there lated documents has been approved by PTPP;
- if necessary, Vendor has handed over the manual book of operation and maintenance;
- if necessary, the Vendor has conducted a training to PT PP; and
- Vendor has submitted as built drawing to PTPP; and
- Any conditions specified in STC (if any).

- e. Defect Liability Period as stipulated under Article 11 [Defects Liability Period] will begin upon issuance of BAST I. Regardless of when financial settlement between the Parties occurs, Vendor shall remain to guarantee PT PP from the defect liability towards its Works result.

dan tempat lain), berhak untuk memeriksa, menginspeksi, mengukur, dan menguji bahan dan tata cara pengerjaan, dan memeriksa kemajuan pembuatan bahan.

- c. Vendor harus memberitahukan kepada personel PT PP ketika Pekerjaan sudah siap untuk dilakukan. Selanjutnya personel PT PP

harus melakukan pemeriksaan, inspeksi, pengukuran, atau pengujian tanpa penundaan yang tidak beralasan, atau segera memberi tahu kepada Vendor bahwa personel PT PP tidak merasa perlu melakukannya. Apabila Vendor gagal menyampaikan pemberitahuan, maka dia harus, jika dan apabila diminta oleh personel PT PP, untuk membongkar Pekerjaan dan selanjutnya mengembalikan dan memperbaikinya, semuanya atas biaya Vendor.

- d. Vendor harus memberi kesempatan secara penuh kepada personel PT PP untuk melakukan aktivitas tersebut, termasuk pemberian akses, fasilitas, izin, dan perlengkapan keselamatan. Tidak satupun dari kegiatan tersebut yang membebaskan Vendor dari kewajiban atau tanggungjawabnya.

13 Penerimaan Sementara

- a. Vendor dapat meminta BAST I dengan pemberitahuan kepada PT PP paling cepat empat belas (14) hari sebelum Pekerjaan atas Perjanjian Non-OA atau atas seluruh Purchase Order yang diterbitkan atas Perjanjian OA dalam satu (1) proyek PT PP, yang menurut pandangan Vendor, akan selesai dan siap untuk diserahkan. Vendor menyerahkan hasil Pekerjaan dengan bersih dan siap pakai, tanpa adanya sisa, puing, maupun sampah pelaksanaan Pekerjaan di lokasi pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian.

- b. PT PP dalam dua puluh delapan (28) hari setelah menerima permohonan oleh Vendor akan:

- menerbitkan BAST I kepada Vendor, yang menyatakan tanggal di mana Pekerjaan diselesaikan berdasarkan Perjanjian Non-OA atau berdasarkan seluruh Purchase Order yang diterbitkan atas satu (1) Perjanjian OA dalam satu (1) proyek PT PP, atau
- menolak permohonan dengan memberikan alasan dalam pemberitahuan tertulis kepada Vendor. Pemberitahuan tertulis tersebut harus menyebutkan Daftar Perbaikan Pekerjaan yang menyebutkan pekerjaan yang harus dilakukan dan cacat mutu yang harus diperbaiki agar BAST I dapat diterbitkan.

Vendor harus memperbaiki/menyelesaikan Daftar Perbaikan Pekerjaan atas perintah PT PP. Setelah Vendor telah menyelesaikan/memperbaiki Daftar Perbaikan Pekerjaan sebagaimana diperintahkan oleh PT PP, maka PT PP berhak untuk melakukan penilaian terhadap hasil kerja yang telah diselesaikan oleh Vendor. PT PP akan menerbitkan BAST I jika menurut penilaian PT PP hasil dari perbaikan sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi.

- c. Setelah BAST I diterbitkan, Vendor berhak mendapatkan pembayaran sebesar sembilan puluh lima persen (95%) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui. Sisa lima persen (5%) dari nilai atau total nilai tersebut adalah potongan retensi yang akan dibayar setelah kondisi dalam Pasal 14 [Penerimaan Akhir] di sini telah terpenuhi.

- d. BAST I akan diterbitkan setelah Vendor memenuhinya kondisi berikut:

- Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian dan dokumen terkait telah disetujui oleh PTPP
- jika diperlukan, Vendor telah melakukan serah terima buku manual operasi dan pemeliharaan;
- jika diperlukan, Vendor telah memberikan pelatihan kepada PT PP;
- Vendor telah menyerahkan as built drawing kepada PT PP, dan
- Ketentuan lainnya yang tercantum dalam STC (jika ada).

- e. Masa Perbaikan Cacat Mutu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 [Masa Perbaikan Cacat Mutu] akan dimulai sejak penerbitan BAST I. Terlepas dari kapan penyelesaian keuangan yang terjadi antara Para Pihak, Vendor akan tetap menjamin PT PP dari cacat mutu terhadap hasil Pekerjaannya.

14 Final Acceptance

- a. After the Defects Liability Period, the Vendor submits a written request to PT PP to submit the Works result. Vendor shall submit the Works result cleanly and ready to use, without any remains, debris, and trash during the Defects Liability Period in the site location as referred to in the Agreement.
- b. PT PP within seven (7) days after receiving a request from the Vendor shall:
 - i. issue BAST II to the Vendor, stating the date on which the Defect Liability Period were completed in accordance with the Agreement; or
 - ii. reject the application by giving a written notice to the Vendor, with reasons.
- c. The remaining payment in the amount of five percent (5%) of the Accepted Amount of the Agreement shall be paid in accordance to Article 7 [Payment and Invoicing Procedure] paragraph (a), (b), (c) point (i), (d), (f), and (k) of these GTC.
- d. Final Acceptance has been received if BAST II has been signed by the Parties or their authorized representatives.

15 Bonds

- a. The bonds (if any) shall be on first demand, unconditional, and irrevocable. PT PP shall not be obliged to provide the bonds issuer with any proof of default of Vendor in order to execute such bonds. The bond shall be paid by the issuer of the bond within 14 (fourteen) working days of the PT PP's request to claim the bond
- b. The bonds (if any) shall be issued in the form of a bank guarantee by government-owned commercial banks or in the form of surety bond by commercial insurance companies registered with Financial Service Authority (FSA) of the Republic of Indonesia, which shall be accepted and approved by PTPP.
- c. Advance Payment Bond
 - i. For the advance payment, Vendor shall furnish an Advance Payment Bond. The bond shall be equal to the amount of the advance payment as stipulated in the STC.
 - ii. The Bond shall remain in force until the end of the Works performance period as stipulated in the STC.
 - iii. Vendor shall submit to the Site Administration Manager of the Project of PT PP, an Advance Payment Bond no later than the advance payment invoice is submitted to PTPP.
 - iv. Vendor shall ensure that the Advance Payment Bond is valid and enforceable until the advance payment has been repaid.
- d. Performance Bond
 - i. Vendor shall submit to PT PP a Performance Bond in an amount of 5% of the Accepted Amount of the Agreement no later than three (3) days after the date of the Agreement.
 - ii. The Performance Bond must remain in force 30 days after Vendor receives the BAST I from PT PP.
 - iii. Performance Bond is required to guarantee the proper performance of the Works and covers the performance of all the obligations assumed by the Vendor and the payment of all liquidated damages and liabilities arising under the Agreement.
 - iv. If the Accepted Amount of the Agreement increases amounting to more 5%, Vendor shall increase the Performance Bond value by an equal percentage, not later than fifteen (15) days from the date of the Addendum of the Agreement.
 - v. Vendor shall ensure that the Performance Bond remains valid enforceable until the issue of BAST I
 - vi. If Vendor has not become entitled to receive BAST I by the due days before the expiry date of the Performance Bond, Vendor extend the validity of the Performance Bond until the Works complete
 - vii. PT PP shall be entitled to claim Performance Bond in the event of
 - 1) failure by Vendor to extend the validity of the Performance Bond

14 Penerimaan Akhir

- a. Setelah berakhirnya Masa Perbaikan Cacat Mutu, Vendor mengajukan permintaan secara tertulis kepada PT PP untuk menyerahkan hasil Pekerjaan. Vendor menyerahkan hasil Pekerjaan dengan bersih dan siap pakai, tanpa adanya sisa, puing, maupun sampah selama Masa Perbaikan Cacat Mutu sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian.
- b. PT PP dalam tujuh (7) hari setelah menerima permohonan oleh Vendor akan:
 - i. menerbitkan BAST II kepada Vendor, dengan menyatakan tanggal penyelesaian Masa Perbaikan Cacat Mutu sesuai Perjanjian; atau
 - ii. menolak permohonan dengan memberitahukan alasan dalam pemberitahuan tertulis.
- c. Sisa pembayaran sebesar lima persen (5%) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui akan dibayarkan sesuai ketentuan Pasal 7 [Pembayaran dan Prosedur Penagihan] paragraf (a), (b), (c) poin (i), (d), (f), dan (k) di GTC ini.
- d. Penerimaan Akhir telah diterima jika BAST II telah ditandatangani Para Pihak atau perwakilannya yang berwenang.

15 Jaminan

- a. Jaminan (jika ada) harus bersifat dapat dicairkan pada permintaan pertama (first demand), tanpa syarat (unconditional), dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable). PT PP tidak berkewajiban untuk memberikan bukti kegagalan Vendor kepada penerbit jaminan dalam rangka pencairan jaminan tersebut. Jaminan tersebut harus dicairkan oleh penerbit Jaminan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja dari permintaan pencairan jaminan dari PT PP.
- b. Jaminan (jika ada) harus diterbitkan dalam bentuk bank garansi oleh bank umum milik pemerintah atau dalam bentuk asuransi kerugian (surety bond) oleh perusahaan asuransi umum yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dapat diterima dan disetujui oleh PT PP.
- c. Jaminan Uang Muka
 - i. Untuk uang muka, Vendor harus memberikan Jaminan Uang Muka. Jaminan tersebut harus sama dengan jumlah uang muka sebagaimana tertera dalam STC.
 - ii. Jaminan Uang Muka akan tetap berlaku sampai tanggal akhir pelaksanaan pekerjaan sesuai yang tertera di dalam STC.
 - iii. Vendor harus menyerahkan Jaminan Uang Muka kepada Manager Administrasi Proyek PT PP paling lambat pada saat tagihan uang muka disampaikan ke PTPP.
 - iv. Vendor harus memastikan Jaminan Uang Muka tersebut sah dan berlaku hingga uang muka selesai dikembalikan.
- d. Jaminan Pelaksanaan
 - i. Vendor harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PT PP senilai 5% dari Nilai Perjanjian yang Disetujui paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal Perjanjian.
 - ii. Jaminan Pelaksanaan harus tetap berlaku 30 hari setelah Vendor menerima BAST I dari PT PP.
 - iii. Jaminan Pelaksanaan diperlukan untuk menjamin kinerja pelaksanaan Pekerjaan dan mencakup seluruh pelaksanaan kewajiban yang ditanggung oleh Vendor dan menjamin pembayaran seluruh ganti rugi dan kewajiban yang timbul dalam Perjanjian.
 - iv. Jika terdapat penambahan Nilai Perjanjian yang Disetujui lebih dari 5%, Vendor harus menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dengan jumlah yang setara, paling lambat lima belas (15) hari dari tanggal Addendum Perjanjian.
 - v. Vendor harus memastikan bahwa Jaminan Pelaksanaan tetap sah dan berlaku sampai diterbitkannya BAST I
 - vi. Jika Vendor belum menjadi berhak menerima BAST I pada tanggal 28 hari sebelum berakhirnya Jaminan Pelaksanaan, Vendor harus memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan hingga Pekerjaan selesai dilaksanakan.
 - vii. PT PP berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan apabila:
 - 1) Kegagalan Vendor untuk memperpanjang masa berlaku

described in paragraph 15.d.v;

- 2) failure by Vendor to remedy a default within 30 days after not by PT PP; or
- 3) circumstance which entitle PT PP to terminated the Agree under Article 25.

e. Failure to Deliver or Maintain the Bonds

A failure to deliver the required Bonds in form or time under this Agreement, shall be a breach of the contractual obligations and shall entitle PT PP to suspend payment procedure and even to terminate the Agreement and apply the maximum penalty to the Vendor.

16 Safety, Occupational Health, and Environmental Management

- a. The Vendor must meet and undertakes to fulfill all legal provisions and all the safety, occupational health, occupational risk prevention, and environmental management requirements established by PT PP and the owner. The Vendor also undertakes to require its vendor to comply with the foregoing and assume all related costs thereof.
- b. PT PP shall apply appropriate sanction if the Vendor's Personnel and its vendor does not comply with safety, occupational health, occupational risk prevention, and environmental management requirements established by PTPP.

17 Green Contractor Commitment

Within the framework of its commitment as a "Green Contractor" for a sustainable development in the fight against conditions that could create a climate change, PT PP maintains eco-friendly inventory relating to its activities. Hence, the Vendor shall apply the same commitment and effort when performing its obligation under the Agreement.

18 Permits, Authorizations, and Licenses

The Vendor shall be responsible for requesting and obtaining all permits, authorizations, and licenses needed to comply with the laws and provisions governing execution of the Agreement and the Applicable Law.

19 Documentation and Information to be Provided by the Vendor

The Vendor shall submit its own cost and expense all documentation required by the Agreement, required by the Law, or requested by PT PP. PT PP believes that documentation is necessary to ensure proper vision of the Works and/or performance of its obligations.

20 Subcontracting/Transfer of the Works

- a. The Vendor may not subcontract/transfer performance of the Works to any party appointed by the Vendor ("vendor appointed by Vendor") without first obtaining written consent from PT PP.
- b. Any agreement entered into by Vendor and the vendor appointed by Vendor shall not create any contractual relationship between PT PP and the vendor appointed by the Vendor. Any consent given by PT PP under Article 20.a shall not relieve the Vendor from any liability or obligation under the Agreement and Vendor shall be responsible for the acts, defaults and neglects of any vendor appointed by Vendor.
- c. If PT PP gives a written consent to Vendor to subcontract the Works as specified in Article 20.a, the Vendor shall ensure that the vendor appointed by Vendor complies with this Agreement including but not limited to labor, and safety requirements established by PT PP, and any conditions required by PT PP.
- d. Notwithstanding the foregoing, PT PP may at any time inspect and monitor the Works performed by the vendor appointed by Vendor and compliance with its obligations, and the vendor appointed by Vendor shall be required to cooperate in any way necessary (provide documentation, reports, unrestricted access to its facilities, etc.).

21 Assignment of the Agreement

The Vendor may not assign, transfer any interest in, or encumber, in whole or in part, the rights arising from this Agreement, including any

Jaminan pelaksanaan sebagaimana diuraikan pada ayat 15.d.v;

- 2) Kegagalan Vendor untuk memperbaiki kelalaian dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan oleh PP; atau
- 3) Keadaan yang memberikan PT PP untuk memutuskan Perjanjian secara sepihak berdasarkan Pasal 25

e. Kegagalan untuk Memberikan atau Menjaga Jaminan

Kegagalan untuk memberikan Jaminan yang ditentukan dalam bentuk atau waktu yang tercantum dalam Perjanjian akan menjadi pelanggaran kewajiban kontraktual dan akan memberikan kewenangan bagi PT PP untuk menangguhkan prosedur pembayaran dan bahkan untuk mengakhiri Perjanjian dan memberikan denda kepada Vendor.

16 Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Vendor harus memenuhi dan menjamin untuk memenuhi seluruh ketentuan hukum dan seluruh persyaratan keselamatan, kesehatan kerja, pencegahan risiko pekerjaan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh PT PP dan Pemilik Proyek. Vendor juga menyanggupi untuk meminta para vendornya untuk mematuhi hal tersebut dan menanggung seluruh biaya yang terkait tersebut.
- b. PT PP akan memberikan sanksi jika Personel Vendor dan para vendornya tidak mematuhi persyaratan keselamatan, kesehatan kerja, pencegahan risiko pekerjaan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh PT PP.

17 Komitmen Green Contractor

Dalam rangka komitmennya sebagai "Green Contractor" untuk pembangunan yang berkesinambungan dalam memerangi kondisi yang dapat menimbulkan perubahan iklim, PT PP menggunakan material yang ramah lingkungan berkaitan dengan kegiatannya. Oleh karena itu, Vendor harus melaksanakan komitmen dan usaha yang sama ketika melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.

18 Izin, Otorisasi, dan Lisensi

Vendor harus bertanggung jawab untuk meminta dan mendapatkan semua izin, otorisasi, dan lisensi yang diperlukan untuk memenuhi hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan Perjanjian dan Hukum yang Berlaku.

19 Dokumentasi dan Informasi yang Akan Diberikan oleh Vendor

Vendor harus menyerahkan seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam Perjanjian, hukum, atau yang diminta oleh PT PP dengan biaya dan pengeluaran sendiri. PT PP percaya bahwa dokumentasi diperlukan untuk menjamin penyediaan Pekerjaan dan/atau pelaksanaan kewajibannya secara baik dan benar.

20 Subkontrak/Pengalihan Pekerjaan

- a. Vendor tidak dapat mensubkontrakkan/mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan ke pihak lain yang ditunjuk oleh Vendor ("vendor yang ditunjuk Vendor") tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT PP.
- b. Perjanjian apapun yang dibuat oleh Vendor dengan vendor yang ditunjuk oleh Vendor tidak menciptakan hubungan kontraktual antara PT PP dengan vendor yang ditunjuk Vendor tersebut. Setiap persetujuan yang diberikan oleh PT PP sehubungan dengan ketentuan Pasal 20.a tidak membebaskan Vendor dari kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian, dan Vendor harus bertanggung jawab terhadap semua tindakan, kesalahan dan kelalaian apapun dari vendor yang ditunjuk oleh Vendor.
- c. Apabila PT PP memberikan persetujuan secara tertulis Vendor untuk mensubkontrakkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.a, maka Vendor harus memastikan bahwa vendor yang ditunjuk Vendor harus memenuhi ketentuan Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas pada tenaga kerja, keselamatan yang ditetapkan oleh PT PP serta kondisinya yang dinyatakan oleh PT PP.
- d. Sekalipun demikian, PT PP dapat setiap saat memeriksa dan memantau pekerjaan yang dilakukan oleh vendor yang ditunjuk Vendor dan pemenuhan dengan kewajibannya, dan vendor yang ditunjuk Vendor wajib bekerja sama dengan cara apapun yang diperlukan (menyediakan dokumentasi, laporan, akses tak terbatas ke fasilitasnya, dan sebagainya).

21 Pengalihan Perjanjian

Vendor tidak dapat mengalihkan, mentransfer setiap kepentingan di sini, atau membebani, secara keseluruhan atau sebagian, hak-hak

payment's right, without PT PP's prior express written consent. A breach of this condition shall entitle PT PP to terminate the Agreement.

22 Insurance

- a. Nothing contained herein stating the actual amount of insurance maintained by the Vendor, shall limit or reduce Vendor's liability and indemnity obligations in this Agreement.
- b. The Vendor undertakes to purchase and maintain all insurance policies required to satisfy the applicable Legal Requirements for so long as this Agreement is in effect.
- c. The insurance as referred in paragraph (b) above must be obtained in the form of National Workers Social Security of the Republic of Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan), which cover Vendor's liability for all claims arising out of bodily injury, death, or occupational disease to its Personnel. The Vendor must process this insurance prior to the commencement of the Works.
- d. This insurance policy is necessary to cover the activities and obligations assumed in the Agreement. However, if a claim arising from the subject-matter of this Agreement is managed under the PT PP's insurance program, the Vendor undertakes to pay the amount of the applicable deductible.

23 Liability

- a. Except as provided by the Applicable Law, PT PP shall not be liable for special damages, indirect or consequential damages, or losses such as but not limited to loss of profits, revenues, income, use, production, cost of capital, or business interruption costs. In any event, PT PP's maximum liability to the Vendor shall not exceed the Accepted Amount of the Agreement. Except as required by the Applicable Law, PT PP shall not be liable to any third party.
- b. The Vendor shall hold PT PP harmless and indemnify PT PP for any loss caused by the actions or omission of the Vendor or its vendor.
- c. PT PP reserves the right to participate in or assume the defense of its interests in any suit or legal action.
- d. If the Vendor is comprised of two (2) or more persons, each and every one of them is jointly and severally obligated to perform the Agreement and is also jointly and severally liable for the obligations established in the Agreement.
- e. PT PP may at any time instruct the Vendor to suspend the works or part of the work. During such suspension, the Vendor shall protect, store and secure such part of the works against any loss or damage.
- f. The Vendor cannot suspend the works for any reasons, without PT PP's written instruction.
- g. If the work carried out by the Vendor is destroyed in any ways before being handed over to PT PP, the Vendor must be fully responsible for the work and all losses incurred.

24 Force Majeure

- a. No failure or omission by either of the Parties in the execution or observance of the terms and conditions of the Agreement will give rise to any kind of claim by the other Party or will be considered as a breach of the Agreement if such failure or omission results from a Force Majeure Event.
- b. The Force Majeure Event is limited to any of the following events or circumstances:

22

Asuransi

- a. Ketidadaan ketentuan dalam Perjanjian yang mengatur jumlah nilai asuransi yang dibiayai oleh Vendor tidak membatasi atau mengurangi kewajiban Vendor dan juga kewajiban pembayaran ganti rugi dalam Perjanjian ini.
- b. Vendor menyanggupi untuk memperoleh dan memiliki polis asuransi yang diperlukan untuk memenuhi Ketentuan Hukum yang berlaku dalam waktu selama Perjanjian iniberlaku.
- c. Asuransi yang dimaksud pada paragraf (b) di atas harus diperoleh dalam bentuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan), yang mencakup seluruh kewajiban Vendor atas setiap klaim yang muncul dari cedera badan, kematian, atau penyakit akibat kerja kepada para Personelnya. Vendor harus memproses asuransi tersebut sebelum dimulainya pelaksanaan Pekerjaan.
- d. Polis asuransi ini diperlukan untuk melindungi kegiatan dan kewajiban yang diasumsikan dalam Perjanjian ini. Namun, jika klaim yang timbul dari permasalahan terkait dengan Perjanjian ini dilakukan melalui program asuransi PT PP, Vendor menyanggupi untuk membayar jumlah potongan (deductible) yang berlaku.

23

Kewajiban

- a. Kecuali sebagaimana ditentukan oleh Hukum yang Berlaku, PT PP tidak bertanggung jawab atas kerusakan khusus, kerusakan tidak langsung atau langsung, atau kerugian seperti namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, pendapatan, penghasilan, penggunaan, produksi, biaya modal, atau biaya gangguan usaha. Dalam keadaan apa pun, kewajiban maksimal PT PP terhadap Vendor tidak akan melebihi Nilai Perjanjian yang Disetujui. Kecuali disyaratkan oleh Hukum yang Berlaku, PT PP tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga manapun.
- b. Vendor wajib membebaskan PT PP dari hal-hal yang merugikan dan dari penggantian kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Vendor atau vendornya.
- c. PT PP berhak untuk berpartisipasi dalam atau tetap mempertahankan kepentingannya dalam setiap tuntutan dan tindakan hukum.
- d. Apabila Vendor terdiri dari dua (2) orang atau lebih, setiap dan seluruh orang di dalamnya bersama-sama dan masing-masing bertanggung jawab untuk melaksanakan Perjanjian dan juga bersama-sama dan masing-masing bertanggung jawab atas kewajiban yang ada di dalam Perjanjian ini.
- e. PT PP dapat suatu saat memerintahkan Vendor untuk menunda pekerjaan atau bagian pekerjaan. Selama penundaan tersebut, Vendor harus melindungi, menyimpan dan mengamankan bagian pekerjaan tersebut terhadap kehilangan atau kerusakan.
- f. Vendor tidak dapat menunda pelaksanaan pekerjaan untuk alasan apapun tanpa perintah tertulis dari PT PP.
- g. Jika pekerjaan yang telah dilaksanakan Vendor musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan terminalkan kepada PT PP, maka Vendor bertanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan tersebut dan segala kerugian yang timbul oleh karenanya.

24

Keadaan Kahar

- a. Tidak ada kegagalan oleh salah satu Pihak dalam pelaksanaan atau ketepatan terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian akan menimbulkan klaim oleh Pihak lain atau akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian jika kegagalan atau kelalaian tersebut hasil dari Kejadian Keadaan Kahar.
- b. Kejadian Keadaan Kahar terbatas terhadap setiap kejadian atau keadaan sebagai berikut:

- i. earthquakes, hurricanes, fires, storms, tidal waves, floods, or other physical natural disasters;
 - ii. acts of war (whether declared or undeclared), terrorism, riot, civil war, blockade, insurrection, or civil disturbances;
 - iii. acts of a government entity, agency, or other local authority that prevent or make unlawful a Party's performance under this Agreement;
 - iv. strikes or labor disputes at the national level but excluding any strike or dispute which is specific to the performance of the Works under this Agreement; and
 - v. industry disruptions as declared by the Minister of Finance and related technical ministers of the Republic of Indonesia.
- c. The Force Majeure Event does not include any of the following events or circumstances:
- i. the mere shortage of or inability to obtain labor, equipment, materials, or transportation which is not itself caused by the Force Majeure Event;
 - ii. the insolvency or change in economic circumstances of the affected Party; and
 - iii. change in market conditions.
- d. If a Party is or will be prevented from performing its substantial obligations under the Agreement by the Force Majeure Event, then he shall give notice to the other Party of the event or circumstances constituting the Force Majeure Event and shall specify the obligations and the performance of which is will be prevented. The notice shall be given within fourteen (14) days after the Party became aware, or should have become aware, of the relevant event or circumstance constituting Force Majeure Event.
- e. The affected Party shall make all reasonable efforts, including reasonable expenditure of money, to overcome the Force Majeure Event and to mitigate its effects.
- f. If the Vendor fails to make all reasonable efforts, including reasonable expenditure of money, to overcome the Force Majeure Event and to mitigate its effects within a reasonable time after the Force Majeure Event begins, PT PP may, in its sole discretion, take mitigating actions, including hiring third parties to mitigate the effects of the Force Majeure Event. These mitigating actions are the sole financial responsibility of the Vendor.
- g. If any contractual obligation is delayed or interrupted as a result of the Force Majeure Event, the time period established for meeting that obligation shall be extended, unless the notice described in the paragraph (d) above has not been given, for as long as circumstances of Force Majeure that gave rise to the delay or interruption remain in effect.
- h. If the delay or the interruption of the Works due to the Force Majeure Event lasts more than six (6) months, then either Party may immediately and unilaterally cancel the Agreement without giving rise to the right to make any claim for any compensation.
- 25 Termination of the Agreement for Cause**
- a. PT PP may unilaterally cancel the Agreement if the Vendor is responsible for any of the following circumstances:
- i. delay of fourteen (14) days in completing the Works or suspending or abandoning fulfillment of the Agreement without justification for more than five (5) days; or
 - ii. exceeding, in whole or in part, the maximum penalty limit established in the Agreement; or
 - iii. in the event of the insolvency or bankruptcy of the Vendor; or
 - iv. breach of any of the obligations established in the Agreement including but not limited to violations of the provisions of environmental, labor, or occupational risk prevention laws.
- b. In any of those circumstances as stated in paragraph (a) above, PT PP may, upon giving a written notice of termination not less than fourteen (14) days or termination under this Article is effective on the date to the extent specified in the notice (or if no date is specified, on the fourteenth (14th) day following the Vendor's receipt of the notice).
- c. If PT PP terminate the Agreement for a reason other than the Force
- i. gempa bumi, badai, kebakaran, petir, tsunami, banjir, atau bentuk bencana alam lainnya;
- ii. keadaan perang (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, kerusuhan, perang saudara, blokade, huru-hara, atau gangguan sipil;
- iii. tindakan dari badan pemerintah, agen, atau otoritas lokal lainnya yang mencegah pelaksanaan atau membuat kinerja salah satu Pihak tidak sesuai dengan hukum di bawah Perjanjian ini;
- iv. pemogokan atau perselisihan tenaga kerja di tingkat nasional tetapi tidak termasuk pemogokan atau perselisihan yang khusus diarahkan untuk pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- v. gangguan industri sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait Republik Indonesia.
- c. Kejadian Keadaan Kahar tidak termasuk setiap kejadian dan keadaan berikut:
- i. kekurangan atau ketidakmampuan untuk memperoleh tenaga kerja, peralatan, material, atau transportasi yang tidak disebabkan oleh Kejadian Keadaan Kahar itu sendiri;
 - ii. kepailitan atau perubahan dalam keadaan ekonomi dari Pihak yang terkena dampak; dan
 - iii. perubahan dalam kondisi pasar.
- d. Jika suatu Pihak terhambat atau akan terhambat dalam melakukan kewajiban mendasarnya menurut Perjanjian karena Kejadian Keadaan Kahar, selanjutnya dia harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lain mengenai kejadian atau keadaan yang merupakan Kejadian Keadaan Kahar dan harus menentukan kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat atau akan terhambat. Pemberitahuan ini harus disampaikan dalam jangka waktu empat belas (14) hari setelah Pihak tersebut menyadari atau seharusnya menyadari, kejadian atau keadaan terkait yang merupakan Kejadian Keadaan Kahar.
- e. Pihak yang terkena dampak harus melakukan seluruh upaya yang wajar, termasuk pengeluaran uang untuk mengatasi Kejadian Keadaan Kahar dan untuk memitigasi dampaknya.
- f. Jika Vendor gagal melakukan seluruh upaya yang wajar, termasuk pengeluaran uang yang wajar, untuk mengatasi Kejadian Keadaan Kahar dan untuk memitigasi dampaknya dalam waktu yang wajar setelah Kejadian Keadaan Kahar dimulai, PT PP dapat, atas kebijakannya sendiri, mengambil tindakan mitigasi, termasuk mempekerjakan pihak ketiga untuk mengurangi dampak dari Kejadian Keadaan Kahar. Tindakan mitigasi ini adalah tanggung jawab keuangan tunggal Vendor.
- g. Jika ada kewajiban kontraktual yang tertunda atau terganggu sebagai akibat dari Kejadian Keadaan Kahar, jangka waktu yang ditetapkan untuk memenuhi kewajiban akan diperpanjang selama Kejadian Keadaan Kahar yang memunculkan keterlambatan atau gangguan tetap berlaku, kecuali pemberitahuan yang dijelaskan dalam paragraf (d) di atas belum diberikan.
- h. Jika keterlambatan dan gangguan Pekerjaan karena Kejadian Keadaan Kahar berlangsung lebih dari enam (6) bulan, maka salah satu Pihak dapat segera secara sepihak membatalkan Perjanjian tanpa menimbulkan hak untuk membuat kompensasi apapun.
- 25 Pemutusan Perjanjian atas Sebab**
- a. PT PP dapat secara sepihak membatalkan Perjanjian apabila Vendor bertanggung jawab atas setiap keadaan berikut:
- i. empat belas (14) hari penundaan dalam menyelesaikan Pekerjaan atau menangguk atau meninggalkan pemenuhan kewajiban Perjanjian tanpa adanya justifikasi lebih dari lima (5) hari; atau
 - ii. melebihi, secara keseluruhan atau sebagian, batas maksimal denda yang ditetapkan dalam Perjanjian; atau
 - iii. dalam hal kepailitan atau kebangkrutan Vendor; atau
 - iv. pelanggaran atas kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada, pelanggaran ketentuan lingkungan, tenaga kerja, atau hukum pencegahan risiko pekerjaan.
- b. Dalam kejadian dan keadaan tersebut sebagaimana diatur di paragraf (a) di atas, PT PP dapat memutuskan Perjanjian setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari empat belas (14) hari atau Pemutusan dalam Pasal ini berlaku pada tanggal sejauh yang ditentukan dalam pemberitahuan (atau jika tidak ada tanggal yang ditentukan, pada hari keempat belas (14) setelah Vendor menerima pemberitahuan).
- c. Bila PT PP memutus Perjanjian untuk alasan selain Kejadian

Majeure Event as stated in Article 24 [Force Majeure] or Termination of the Agreement Without Cause as stated in Article 26 [Termination of the Agreement Without Cause], then the useful portion of the Works may acquire ownership to PT PP. This won't eliminate PT PP's right to levy applicable penalties in accordance with the provisions of the Agreement.

PT PP may hire third parties to perform the pending Works, make any claim against the Vendor to which it may be entitled (including the requirement of a quality insurance regarding the useful portion of the Works), withhold pending payments, and/or execute bonds, as well as exercise any appropriate legal action to defend its interest.

If the price given by the third parties to complete the pending Works are higher than the initial price stated in the Agreement, then those price differences shall be fully borne by the Vendor.

- d. In the event the Vendor is declared insolvent by the authorized jurisdiction, whether at the first instance or at the appeal level, as stipulated under the paragraph (a) point (iii) above, these conditions shall apply:
- notwithstanding to the above paragraph, the insolvent party (Vendor) shall be entitled to the portion of Works that has been accepted by PTPP;
 - PT PP shall be entitled to withdraw the Performance Bond as stipulated in the Agreement;
 - Vendor shall warrant that all equipment, goods, and materials which is used in the site is being a warranty to PT PP; and
 - equipment, goods, and materials as mentioned above on point (iii) shall not be listed as insolvent assets, and give PT PP right to make it as the warranty in order to fulfill its obligations to PT PP.
- e. The Parties hereby waived several specific stipulations in Article 1266 of the Indonesian Civil Code, specifically for the stipulation regarding to the judicial cancellation that are required to terminate this Agreement.

26 Termination of the Agreement Without Cause

- a. PT PP may terminate all or part of this Agreement at any time by giving the Vendor not less than fourteen (14) days' notice of termination or Termination under this Article is effective on the date to the extent specified in the notice (or if no date is specified, on the fourteenth (14th) day following the Vendor's receipt of the notice). Upon receipt of such notice, the Vendor shall discontinue its performance of the Works to the extent specified in the notice and take all commercially reasonable measures to mitigate the costs of the termination.
- b. If PT PP terminates all or part of this Agreement under this Article, PT PP shall pay the Vendor for that portion of the Works that has been done which PT PP determines, in its sole judgment, were satisfactorily performed prior to the Termination. In addition, PT PP shall pay the Vendor an amount calculated to compensate for reasonable, documented, and direct expenses it has incurred for the purpose of performing its obligations under this Agreement (excluding any profit component), less any amount that shall be paid by the Vendor to PTPP or other party..

27 Applicable Law

Unless otherwise provided in the Agreement, these GTC shall be governed by and construed by the laws of the Republic of Indonesia.

28 Legal Requirements

- a. The Vendor shall use Personnel from its workforce in the performance of the Agreement, and shall assume with respect to PT PP, the obligations set forth in the Applicable Law, holding PT PP completely harmless.
- b. The Vendor hereby warrants and represents that he has all required licenses, permits, and other professional documentations issued by the Government of the Republic Indonesia (such as legal documents) which allows him to conduct his business activities, including to perform the Works under the Agreement.

Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 24 [Keadaan Kahar] atau Pemutusan Perjanjian Tanpa Sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 26 [Pemutusan Perjanjian Tanpa Sebab], maka bagian Pekerjaan yang dapat digunakan dapat berpindah kepada PT PP. Hal ini tidak menghilangkan hak PT PP untuk mengenakan denda yang berlaku sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.

PT PP dapat mempekerjakan pihak ketiga untuk menyelesaikan bagian dari Pekerjaan yang tertunda dan mengajukan klaim terhadap Vendor terhadap hal-hal yang berhak diajukan klaim (termasuk persyaratan jaminan kualitas mengenai bagian Pekerjaan yang dapat digunakan), menahan sisa pembayaran, dan/atau mencairkan Jaminan, serta melaksanakan tindakan hukum yang tepat untuk mempertahankan kepentingannya.

Jika harga yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan bagian dari Pekerjaan yang tertunda lebih tinggi dibanding harga awal yang dinyatakan dalam Perjanjian, maka selisih harga tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Vendor.

- d. Dalam hal Vendor dinyatakan dalam keadaan pailit oleh badan peradilan yang berwenang, baik di pengadilan tingkat pertama maupun di tingkat kasasi, sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) poin (iii) di atas, maka akan berlaku kondisi berikut:
- tanpa mengesampingkan paragraf di atas, pihak yang pailit (Vendor) berhak atas Pekerjaan yang telah diterima oleh PT PP;
 - PT PP berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian;
 - Vendor menjamin bahwa seluruh alat, barang, dan material yang digunakan di lapangan menjadi jaminan kepada PT PP; dan
 - alat, barang, dan material sebagaimana dimaksud poin (iii) di atas tidak dapat dijadikan daftar aset pailit, dan memberi hak kepada PT PP untuk menjadikannya sebagai jaminan untuk memenuhi kewajibannya kepada PTPP.

- e. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, khususnya untuk kaitan dengan ketentuan keterlibatan pengadilan yang dibutuhkan untuk memutus Perjanjian ini.

26 Pemutusan Perjanjian Tanpa Sebab

- a. PT PP dapat memutus seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini sewaktu-waktu dengan memberikan Vendor pemberitahuan tidak kurang dari empat belas (14) hari atau Pemutusan dalam Pasal ini berlaku pada tanggal sejauh yang ditentukan dalam pemberitahuan (atau jika tidak ada tanggal yang ditentukan, pada hari keempat belas (14) setelah Vendor menerima pemberitahuan). Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Vendor akan menghentikan Pekerjaan sejauh yang ditentukan dalam pemberitahuan dan memegang seluruh tindakan komersial yang wajar untuk memitigasi biaya pemutusan.
- b. Apabila PT PP memutus seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini berdasarkan Pasal ini, PT PP akan membayar Vendor atas bagian dari Pekerjaan yang telah dilakukan yang PT PP tentukan telah dilakukan dengan memuaskan, atas penilaiannya sendiri, sebelum dilakukan Pemutusan. Selain itu, PT PP akan membayar Vendor sejumlah kompensasi yang dihitung berdasarkan biaya yang wajar, terdokumentasi, dan yang sebenarnya telah dikeluarkan untuk tujuan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (tidak termasuk komponen keuntungan), dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayarkan Vendor kepada PT PP atau pihak lain.

27 Hukum yang Berlaku

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian, GTC ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

28 Persyaratan Hukum

- a. Vendor harus menggunakan personel dari tenaga kerjanya sendiri dalam pelaksanaan Perjanjian, dan harus bertanggung jawab berkenaan dengan PT PP, terhadap Hukum yang Berlaku, dan benar-benar tidak akan membahayakan PT PP.
- b. Vendor menyatakan bahwa dia memiliki seluruh lisensi, izin, dan dokumentasi profesional lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (seperti dokumen-dokumen hukum) yang memungkinkan dia untuk melakukan aktivitasnya termasuk untuk menjalankan aktivitasnya berdasarkan Perjanjian.

- accordance to the Works need;
- v. additional work that has not been included in the Agreement which is required to complete all the Works;
- vi. amendment in the value of the Accepted Amount of the Agreement due to modifications of the Works caused by point (i) to (v) above; or
- vii. Any changes determined by PT PP

c. Only if PT PP's personnel deems necessary, both parties shall have a technical and/or price negotiation prior to signing the Addendum of the Agreement while still referring to the provisions stated in the initial Agreement. The results of the negotiation are set forth in an official report as a basis for preparing the Addendum of the Agreement.

d. If the Vendor considers himself to be entitled to any extension of the Time for Completion and/or any additional payment, under any Article of the Agreement or in connection with the Agreement, the Vendor shall give written notice to PT PP, describing the event or circumstance giving rise to the claim. The notice shall be given as soon as practicable, and not later than 14 days after the Vendor became aware or should have become aware, of the event or circumstance. PT PP shall analyse, then decide to approve or reject the claim.

If the Vendor fails to give written notice of a claim within such period of 14 days, the Time for Completion shall not be extended, the Contractor shall not be entitled to additional payment, and PT PP shall be discharged from all liability in connection with the claim

33 Correspondence

- a. All correspondences may take in the form of mail and/or electronic mail addressed to the Party's addresses listed in the STC.
- b. Any written notice, request, approval, or permit that being stipulated in this Agreement is deemed to be already notified if it already addressed to the mail or electronic mail; sent to the addresses listed in the STC.
- c. If there is a change of address listed in the STC, the party whom made such change shall notify the address change in writing to the other Party within a period of seven (7) days after the address change.
- d. Any consequence arising due to the change of address which is not notified to the other Party, become the risk and responsibility by the Party whom made such change.

34 Miscellaneous

- a. All information provided by PT PP shall be deemed to be confidential information. These confidentiality obligations shall be valid even this Agreement has been terminated/ accomplished.
- b. The Vendor shall respect all intellectual and industrial property rights owned by PT PP. The Vendor holds PT PP harmless from any liability due to violations of the intellectual and industrial property rights incurred thereby and to indemnify it for any damage that may be sought from it.
- c. Any provision of these GTC that is set aside, or the performance of which is invalidated or defect, shall cease to be valid under the terms on which it was set aside or voided, without invalidating the other provisions hereof.
- d. Vendor hereby acknowledges and confirms that PT PP is very strict in implementing any sanction under the Agreement including but not limited to an entry into the PT PP's Blacklist of Procurement. The Vendor also acknowledges and confirms the implementation of Good Corporate Governance (GCG) actions in PT PP, therefore the Vendor shall support and comply with such GCG.
- e. These GTC have been drawn up in both English and Indonesian languages; both texts are valid. In the event of any discrepancy of interpretation between the two texts, the Indonesian Language text shall prevail.
- f. Any formal notice required under the Agreement shall be made in writing to the address provided by the Parties.
- g. The language of the Agreement may be made in English and/or Indonesian language(s).

- iv. perubahan Spesifikasi teknis dan/atau Gambar sesuai dengan kebutuhan Pekerjaan;
- v. pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Perjanjian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan;
- vi. perubahan Nilai Perjanjian yang Disetujui akibat adanya perubahan Pekerjaan yang disebabkan oleh poin (i) sampai (v) di atas; atau
- vii. Perubahan lainnya yang ditentukan oleh PT PP

c. Jika dianggap perlu oleh personel PT PP, kedua Pihak akan melakukan negosiasi teknis dan/atau harga sebelum menandatangani Addendum Perjanjian dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian awal. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam suatu berita acara sebagai dasar penyusunan Addendum Perjanjian.

d. Jika Vendor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian dan atau pembayaran tambahan menurut pasal Perjanjian atau berkaitan dengan Perjanjian, maka Vendor harus memberitahu secara tertulis kepada PT PP, menyebutkan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim. Pemberitahuan harus disampaikan sesegera mungkin, dan tidak lebih dari jangka waktu 14 hari setelah Vendor menyadari atau seharusnya menyadari, akan kejadian atau keadaan tersebut. PT PP kemudian akan menganalisa kemudian memutuskan menerima atau menolak klaim tersebut.

Jika Vendor gagal menyampaikan pemberitahuan tertulis suatu klaim dalam jangka waktu 14 hari tersebut, maka Waktu Penyelesaian tidak akan diperpanjang, Vendor tidak berhak atas pembayaran tambahan, dan PT PP akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim tersebut.

34

Korespondensi

- a. Semua korespondensi dapat berbentuk surat tercatat dan/atau surat elektronik dengan alamat tujuan Para Pihak yang tercantum dalam STC.
- b. Semua pemberitahuan, permintaan, persetujuan, atau izin tertulis yang diatur dalam Perjanjian ini dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik; ditujukan ke alamat yang tercantum dalam STC.
- c. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam STC, maka Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu tujuh (7) hari setelah perubahan alamat tersebut.
- d. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

34

Lain-Lain

- a. Semua Informasi yang diberikan oleh PT PP akan dianggap sebagai informasi rahasia. Kewajiban kerahasiaan ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah diputus/selesai.
- b. Vendor harus menghormati semua hak kekayaan intelektual dan industri yang dimiliki oleh PT PP. Vendor tidak membebani PT PP dari kewajiban apa pun karena pelanggaran hak kekayaan intelektual dan industri yang terjadi dan mengganti setiap kerugian tersebut atas kerugian yang mungkin timbul dari hal tersebut.
- c. Setiap ketentuan dari GTC ini yang dikesampingkan, atau pelaksanaannya yang tidak valid atau cacat, akan tidak berlaku di bawah ketentuan yang dikesampingkan atau dibatalkan, tanpa mengabaikan dari ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.
- d. Vendor dengan ini mengetahui dan memahami bahwa PT PP sangat tegas dalam menerapkan setiap sanksi yang dalam Perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada pemusutan ke dalam Daftar Hitam Pengadaan PT PP. Vendor juga mengetahui dan meyakini implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance, GCG) di PT PP, oleh karena itu Vendor akan mendukung dan mematuhi GCG tersebut.
- e. GTC ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua teks tersebut adalah valid. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara kedua teks tersebut, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
- f. Setiap pemberitahuan resmi yang diperlukan di dalam Perjanjian harus dibuat secara tertulis ke alamat yang diberikan oleh Para Pihak.
- g. Bahasa dari Perjanjian dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
General Terms and Conditions (GTC)
Syarat dan Ketentuan Umum



h. PT PP shall be entitled to impose Black List Sanction to Vendor, if:

- i. Vendor commits Corruption, Collusion and/or Nepotism (KKN) in connection with the Agreement;
 - ii. Vendor does not complete the Works or PT PP terminates the Agreement unilaterally due to Vendor's default;
 - iii. Vendor fails to remedy any defect within the Defect Liability Period;
 - iv. There is fatality at Project due to Vendor's default; or
 - v. Vendor violates the laws.
- i. The Agreement ends after the rights and obligations of the Parties to the Agreement have been fulfilled. The fulfillment of such rights and obligations is related to the payment that shall be made due to the implementation of the Agreement.
- j. All the provisions in these GTC still remain binding to the Parties unless otherwise stipulated in the STC.

h. PT PP berhak mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Vendor, apabila:

- i. Vendor melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) sehubungan dengan Perjanjian;
- ii. Vendor tidak menyelesaikan Pekerjaan atau dilakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT PP yang disebabkan oleh kesalahan Vendor;
- iii. Vendor gagal melakukan kewajiban perbaikan cacat mutu dalam Masa Perbaikan Cacat Mutu;
- iv. Terjadi kecelakaan di Proyek yang berakibat kematian karena kesalahan Vendor; atau
- v. Vendor melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

- i. Perjanjian berakhir setelah terpenuhinya hak dan kewajiban para Pihak dalam Perjanjian. Terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak tersebut adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan Perjanjian
- j. Seluruh ketentuan dalam GTC ini akan tetap berlaku, sepanjang tidak diatur lebih lanjut pada STC.

Jakarta,

Approved by/Disetujui Oleh
PT **SEMANGAT WAJA TAMA**


(HANA GUS D.W.)
Direktur Utama

PAKTA INTEGRITAS

Bahwa kami, PT Semangat Waja Tama yang berkedudukan di Bekasi Gedung M GOLD Tower Lantai 20 Unit G Jalan KH Noer Ali Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 763 Tanggal 10 November 2019, dibuat di hadapan Widya Suryandari SH., M.KN, Notaris di Kabupaten Bogor, dan anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami perubahan, untuk terakhir kalinya diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0692.AH.02.01 tanggal 4 Februari 2010, yang pemberituannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.01 tanggal 17 Agustus 2020 dalam hal ini diwakili oleh Hana Gus Dwi Wijaya selaku Direktur Utama, berdasarkan SK No. AHU-0692.AH.02.01 tanggal 4 Februari 2010 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan Barang dan Jasa No Kontrak 2547/SPS/SCM/PP/EPC/72500001/XI/2025 Proyek Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek – Plumbang pada PT PP (Persero) Tbk, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Berkomitmen untuk mentaati Company Policy PT PP (Persero) Tbk dalam menjalankan aktivitas operasi yang tidak berdampak negatif kepada penerapan prinsip keberlanjutan (Sustainability) dan atau pilar Environment, Social, & Governance (ESG);
2. Akan mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PP (Persero) Tbk, dan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Peraturan Perundang-Undangan Indonesia terkait Pengadaan Barang/Jasa;
3. Tidak akan melakukan persekongkolan/pengaturan/kerjasama diantara para Calon Penyedia Barang/Jasa lain dan/atau Pejabat/karyawan PT PP (Persero) Tbk dan/atau Panitia Pengadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
4. Bahwa, PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dengan landasan bahwa PT Semangat Waja Tama menjamin tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) sehubungan dengan Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek – Plumbang;
5. Apabila PT Semangat Waja Tama melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, PT Semangat Waja Tama bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23 Desember 2025



Hana Gus Dwi Wijaya
Direktur Utama

Pada hari ini	Jumat, 31 Oktober 2025
Bertempat di	Wisma Subiyanto
Telah diadakan negosiasi terhadap	
Nomor Penawaran	0001/SWT/SPH-PP/X/2025
Tgl. Penawaran	27 Oct 2025
Tgl. Undangan	29 Oct 2025
Nama Vendor	PT SEMANGAT WAJA TAMA
Alamat Vendor	GEDUNG M GOLD TOWER LANTAI 20 UNIT G JL KH NOER ALI
Approval Vendor	✓ 31 Oct 2025 20:59
Yang dihadiri Oleh	
Pihak PT PP (Persero) Tbk	Wasdi, Rizki, A. Mauludin, Akbar R., Ibnu N.
Pihak Vendor	Hana, Reza
Materi yang Dijelaskan	
Telah diadakan negosiasi terhadap	Sesuai RFQ dan klarifikasi teknis terlampir
Tgl. Pengiriman/Pelaksanaan	01 Nov 2025 - 31 Oct 2026
Masa Pemeliharaan	01 Nov 2026 - 01 Nov 2027
Nilai Kontrak - PPN	29.502.864.000
Terbilang	Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah
Uang Muka	-
Terbilang	-
Kondisi Hasil Nego	Unit Price
Cara Pembayaran	SKBDN (Usance 180 hari setelah akseptasi Bank)
Lingkup Vendor	• Sesuai dengan klarifikasi, berita acara negosiasi dan (rincian SOW terlampir). • Mob-Demob, Engineering, Pengadaan material bantu, Fabrication material bantu, Testing sebelum pengiriman, Pengiriman material, Unloading material di site, Penyimpanan material, Pengembalian sisa material utama, Installation / Erection, Precommissioning, Support untuk testing & Com. MDR/FAC, Report & Documentation. • Pengamanan material dan alat. • Sosialisasi dan koordinasi sosial tingkat desa / lurah kebawah. • Site office. • Listrik dan air kerja . • Trafic management (work area only). • Safety net & polynet (if required). • Safety life line (If required). • Safety tools.
Lingkup PT PP (Persero) Tbk	• Sesuai dengan klarifikasi, berita acara negosiasi dan (rincian SOW terlampir). • Supervisi lapangan. • Supporting dalam hubungan masyarakat dari PIC Subkontraktor.

- Lampiran
- BA Nego
 - MOM (Klarifikasi)
 - Dokumentasi nego & Daftar Hadir
 - Scope of Work (Lingkup Pekerjaan)
 - Schedule (Pelaksanaan pekerjaan, Manpower Loading, Equipment Loading)
 - Perbandingan / Rincian Harga (Harga Nego)
 - SPH
 - Daftar Periksa Surat Perjanjian
 - DOR QC
 - DOR HSE
 - SA TKDN
 - TBE
 - PEP

Berdasarkan Hasil Negosiasi ini, Pihak Vendor telah memahami dan menerima kesepakatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di atas.

Pihak PT SEMANGAT WAJA TAMA



(.....)

Jakarta, 31 Oktober 2025

Pihak PT PP (Persero) Tbk

(Randy Mario Sihombing)

(RECHA ENGGAR YONO)

(ACHMAD MAULUDIN)

DVSCM
PT PP (Persero) Tbk
PROYEK/PROFIT CENTER
NO

Lamp. / Wf No. _____
: Pusat / Plant 01 / Plant 02 / Plant 03 / Plant 05 *
: Gedung 1 / Gedung 2 / Infrastruktur 1 / Infrastruktur 2 / EPC *
: Proyek Pipenisasi BBM Cikampek Plumpang
:

BERITA ACARA NEGOSIASI DENGAN SUB KONTRAKTOR

Pada hari ini : Rabu
Tanggal : 29 Oktober 2025
Bertempat di : Wisma Sublyanto

Telah diadakan negosiasi terhadap penawaran no : 0001/SWT/SPH/PP/X/2025
Nama Perusahaan : PT. Semangat Weja Tama
Tanggal : 27 Oktober 2025

Yang dihadiri oleh
Pihak PT PP (Persero) Tbk

: Proyek
1. Wasdi
2. Rizki

: SCC
1. Achmad Mauludin
2. Akbar Rusdi

: Divisi
1. Ibnu Nugroho

Pihak Calon Subkontraktor

: 1. Hana
2. Reza

1. Pekerjaan : Pekerjaan Open Cut dan Auger Boring Paket 1
2. Spesifikasi : Sesuai RFQ (Spesifikasi, Drawing, Data Sheet, MTO) dan Klarifikasi Teknis
3. Waktu pekerjaan : Paket 1:
Jangka Waktu Pekerjaan Total 10 Bulan, 9 Bulan konstruksi, 2 Minggu Persiapan, 1 Bulan Precomm
November 2025 - Oktober 2026
4. Masa Pemeliharaan / Garansi : 12 bulan setelah BAST-1
5. Harga : Rp29.502.864.000,00
- Rincian harga negosiasi final terlampir
- Harga excluded ppn 11%
- Sudah termasuk pph dan bunga diskonto untuk pembayaran SKBDN
- Tidak ada eskalasi harga selama masa kontrak
- Sudah mempertimbangkan kondisi cuaca dan lingkungan kerja
- Tidak ada klaim biaya untuk idle alat dan manpower
- Tidak ada klaim biaya untuk penambahan alat dan manpower untuk mencapai target
Kondisi Penawaran: Fixed Unit Price
6. Cara pembayaran : SKBDN usance 180 hari

100% monthly Proress Payment (d disesuaikan dengan progress measurement yang
disepakati oleh semua pihak), dipotong retensi 5% disetap tagihannya.
5% retensi selama 12 bulan setelah BAST-1 dibayarkan dengan regular T/T 90 hari.
Include Jaminan pelaksanaan 10% dari Bank Garansi
7. Lingkup subkontraktor : Sesuai dengan klarifikasi, berita acara negosiasi dan rincian SOW terlampir

Mob/Demob, Engineering Sesuai SoW, Pengadaan material bantu, Fabrication material bantu, Testing
sebelum pengiriman, Pengiriman material, Unloading material di site, Penyimpanan material,
Pengembalian sisa material utama, Installation / Erection, Precommissioning, Support untuk testing &
Com. MDR/FAC, Report & Documentation.
Pengamanan kerja, material dan alat
Sosialisasi dan koordinasi sosial tingkat desa / lurah ke bawah
Site office
Listrik dan Air kerja
Traffic management (work area only)
safety net & polynet (if required)
safety life line (if required)
safety tools
8. Lingkup PTTP : Supervisi lapangan
Supporting dalam Hubungan Masyarakat dari PIC Subkontraktor
9. Lampiran yang merupakan bagian dari Berita Acara ini :
MOM / Klarifikasi, Daftar Hadir, Schedule (pelaksanaan, Manpower Loading & Tools & Equipment
Loading), SOW, Rincian harga nego, DOR HSE, DOR QC, Daftar Periksa Surat Perjanjian, SA TKDN

Jakarta, 29 Oktober 2025

Pihak Subkontraktor
PT. Semangat Weja Tama

Pihak PT PP (Persero) Tbk

Hana Gus Dwi
Direktur Utama

* nb : lingkari salah satu

Signed by:

A. MAULUDIN

Achmad Mauludin
Mgr-Proc Op

Signed by:

Recha Enggar

Recha Enggar Yoko
Mgr-Proc

Randy Marlo S
PM

DVSCM

PT PP (Persero) Tbk

PROYEK/PROFIT CENTER
NO

(Pusat) / Plant 01 / Plant 02 / Plant 03 / Plant 05 *

: Gedung 1 / Gedung 2 / Infrastruktur 1 / Infrastruktur 2 / (EPC) *

: Proyek Pipanisasi BBM Cikampek Plumpang

Lamp.....WI No.....

BERITA ACARA PENJELASAN LINGKUP PEKERJAAN KEPADA SUB KONTRAKTOR

Pada Hari ini : Rabu
Tanggal : 29 Oktober 2025
Bertempat di : Wisma Subiyanto

Penawaran : 0001/SWT/SPH/PP/X/2025
Nama Perusahaan : PT. Semangat Waja Tama
Tanggal : 27 Oktober 2025
Alamat :

Yang dihadiri oleh
Pihak PTPP

- : Proyek
1. Wasdi
2. Rizki

SCC
1. Achmad Mauludin
2. Akbar Rusdi

Divisi
1. Ibnu Nugroho

Pihak Calon Sub Kontraktor

- : 1. Hana
2. Reza

Materi yang dijelaskan :
Lingkup Pekerjaan

- : Pekerjaan Open Cut dan Auger Boring Paket 1

Referensi

- : - Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS / KAK) / Spesifikasi Teknis
- Gambar kerja
- BoQ
- Data Sheet
- Work Method Statements
- Sesuai RFQ dan Klarifikasi Teknis

Ketentuan K3 untuk pekerjaan

- : - Menyiapkan peralatan Safety (safety belt, sepatu kerja, helm, dsb)
- Menyiapkan tempat sampah di lokasi pekerjaan
- Membuang sampah tersebut ke luar lokasi proyek
- Mengikuti peraturan K3 yang berlaku di lingkungan Proyek Cikampek - Plumpang
- Mengikuti peraturan K3 yang berlaku di Site PT PP
- Menyiapkan pengelolaan limbah B3
- Menyiapkan paramedic dan emergency car sesuai standar yang berlaku di Proyek Cikampek - Plumpang

Ketentuan aspek Lingkungan

- : - Menjaga lingkungan proyek dari Limbah buangan air, polusi udara, kondisi sosial, dsb, selama proses pelaksanaan pekerjaan
- Menyediakan peralatan dan tenaga kerja dalam rangka mengikuti dan menerapkan ketentuan aspek lingkungan di lokasi proyek Cikampek - Plumpang
- Mengikuti peraturan Lingkungan yang berlaku di Site PT PP

Tambahan Informasi

- : - Produk / hasil pekerjaan yang dihasilkan mengacu pada standar mutu Project Cikampek - Plumpang
- Menempatkan personil di lapangan sesuai keahlian dan kompetensi-nya
- Menggunakan peralatan kerja yang laik operasi
- Menyediakan personil K3 & Quality Control
- Setiap pekerja / karyawan wajib melaksanakan MCU
- PT Semangat Waja Tama bersedia mengikuti seluruh ketentuan dan requirement yang berlaku di site project sesuai dengan arahan dan regulasi yang ditetapkan oleh pihak terkait
- PT Semangat Waja Tama menyatakan akan mematuhi seluruh persyaratan teknis yang berlaku di site project, dan memahami bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai perjanjian

Berdasarkan Hasil Penjelasan Lingkup Pekerjaan Ini, Pihak calon Sub Kontraktor telah mengerti untuk dapat menghasilkan Produk Pekerjaan di Lapangan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan di atas.

PT. Semangat Waja Tama


Jakarta, 29 Oktober 2025

Pihak PT PP (Persero) Tbk


Hana Gus Dwi
Direktur Utama


A. MAULUDIN
ACHMAD MAULUDIN
Mgr-Proc Ops


Recha Enggar
Recha Enggar Yonzu
Mgr PC


Randy Mario S
PM

* nb : lingkari salah satu

NOTULENSI KLARIFIKASI
PEKERJAAN OPEN CUT & AUGER BORING PAKET 1 DAN PAKET 3
PROYEK PIPANISASI BBM CUKAMPEK PLUMPANG

NO	ITEM	JUMLAH	SAT	KETERANGAN
1	BAHAN			
	Pekerjaan Open Cut dan Auger Boring Paket 1	1	ls	Harus memenuhi spesifikasi dan persyaratan yang sudah disetujui PTPP dan End User
	Pekerjaan Open Cut dan Auger Boring Paket 3	1	ls	
2	ORANG			
	Jumlah Manpower termasuk detail posisi			Harus memenuhi spesifikasi dan persyaratan yang sudah disetujui PTPP dan End User
	* PT. Semangat Waja Tama menyampaikan, jika mendapatkan lebih dari 1 paket, total manpower akan berbeda dan dedicated untuk setiap paket			Total Manpower : Terlampir
				Paket 1 : Total manpower 50 orang dan akan bertambah hingga 90 Orang
				Paket 3: Total manpower 44 orang dan akan bertambah hingga 70 Orang
				Asumsi ketika mendapatkan per paket
	Project Manager			Jika terjadi keterlambatan progress pekerjaan, vendor wajib menambahkan manpower dan alat tanpa ada claim/tambahan biaya
	Operation Manager			*PT. Semangat Waja Tama akan menyampaikan manpower loading tools serta equipment loading untuk setiap paket
	Site Engineer			*PT. Semangat Waja Tama akan menyampaikan bukti kepemilikan alat.
	Quality Control Staff			*PT. Semangat Waja Tama akan menyampaikan bahwa akan bersedia untuk bekerja secara overtime maupun menambah manpower dan alat untuk mencapai target pekerjaan, tanpa ada claim maupun tambahan biaya
	HSE Staff			*PT. Semangat Waja Tama menyampaikan dibutuhkan interval 1-2 Minggu untuk mendatangkan manpower tambahan.
	Pelaksana Lapangan			Untuk alat intervalnya 1 minggu dari surat instruksi yang diterima
	Surveyor			
	Mekanik			
	Flagman			
	Operator Alat Berat			
	Sopir			
	NB: Dapat disesuaikan dengan kebutuhan, diberikan dalam lampiran khusus			
3	CARA			
	- Subkon mobilisasi alat sesuai rencana yang telah disetujui			Disesuaikan dengan prosedur / requirement kerja yang berlaku dan telah disepakati
	- Melakukan pekerjaan sesuai BQ dan Scope of Work			Confirm
	- Mobilisasi alat dan accessories			Confirm
	- Pelaporan untuk Progress, report, Quality dan HSE			Confirm
	- Melakukan pekerjaan sesuai Metode yang telah disetujui oleh PT PP dan Owner			Confirm
	- Listrik dan Air Kerja masuk dalam lingkup Subkontraktor			Confirm
4	ALAT			
	(List alat yg disediakan Subkon dalam pekerjaan)			Mobilisasi Alat
	Paket 1 :			Sesuai dengan requirement teknis yang disetujui oleh Pihak PTPP tidak terbatas pada :
	1. Exca PC 135 7 Unit Sewa	7	unit	- SIO & SILO masih berlaku
	2. Auger Boring Sewa	1	set	- Rigger tersertifikasi
	3. TMC 12T Sewa 1 Unit	1	unit	- Sertifikasi PJK3
	5. Mesin Las 10 Unit Sewa	10	unit	etc (sesuai dengan DoR dan ITB document QHSE)
	6. Optional Trailer & Mobile Crane	1	unit	PT. Semangat Waja Tama akan mengirimkan rincian schedule manpower dan alat (terlampir)
	7. Bending Machine	1	Set	
				*Umur alat maksimal tidak lebih dari 10 tahun
	Paket 3 :			* PT. Semangat Waja Tama, menyatakan akan mengikuti requirement dari QHSE PT PP yang back to back dengan End User
	1. Exca PC 135 6 Unit Sewa	6	unit	*PT. Semangat Waja Tama akan mengikuti requirement sesuai yang disetujui oleh end user dan PT PP
	2. Auger Boring Sewa	1	set	*Scope penyediaan WPS dan POR menjadi tanggung jawab subkontraktor, sesuai dengan SOW
	3. TMC 12T Sewa 1 Unit	1	unit	
	5. Mesin Las 8 Unit Sewa	8	unit	
	6. Optional Trailer & Mobile Crane	1	unit	
	7. Bending Machine	1	Set	
5	LINGKUNGAN			
	- Memperhatikan aspek lingkungan sesuai ketentuan PTPP			Termasuk keamanan untuk alat atau material sebelum serah terima menjadi tanggung jawab vendor
				Termasuk dengan keamanan lokasi kerja yang berhubungan dengan sosial
				Termasuk dengan sosialisasi dan koordinasi yang bertubungan dengan sosial tingkat daerah/kecamatan
				Tanggung jawab, material berdasarkan Berita Acara Handover / Serah Terima Material
				- Material sudah menjadi tanggung jawab Vendor setelah di serah terima dari laydown PP ke Vendor
6	BIAYA			
	Paket 1	29.502.864.000		
	Paket 3	29.700.373.000		
	- Harga nilai kontrak (NIK-PPN) :			- Rincian harga negosiasi/ final terlampir
	- SKBDN Ussance 180 hari			- Harga excluded ppn 11%
				- Sudah termasuk PPH dan Bunga diskonto untuk pembayaran SKBDN
				- Tidak ada eskalasi harga selama masa kontrak
				- Sudah memperimbangkan kondisi cuaca dan lingkungan kerja
				- Tidak ada klaim biaya untuk idle alat dan manpower
				Kondisi Penawaran: Fixed Unit Price
				- Harga sudah termasuk (Consumable material, alat bantu, bahan bantu, tenaga kerja, transportasi / mobilisasi, peralatan keselamatan, Instalasi, pre-commissioning, Support/Assist dalam Testing&Commissioning, supervisi/engineering support, overhead & profit)
	Syarat Pencatatan Tagihan SKBDN :			
	1. Kontrak			
	2. Invoice			
	3. Faktur Pajak			
	4. SPT masa PPN - Maks 2 masa sebelumnya			
	5. E-Nota			
	6. Report SES			
	7. Opnam Fisik / Berita Acara Lapangan (BAL)			
	8. SKB PPh (Jika ada)			
	9. NPWP			
	10. BAP-Kwitansi			
	11. Copy Swift SKBDN			
	12. Jaminan Pelaksanaan			
				For information to Subkontraktor

7	MUTU			
	Sesuai DoR QC, DoR HSE dan Ketentuan PTPP			Confirm
	Masa Pemeliharaan 12 Bulan setelah BAST-1			Confirm
	ITP disediakan oleh vendor			Confirm
8	WAKTU			
	Sesuai Sheet Schedule Pelaksanaan			Paket 1 :
	Rincian Schedule pelaksanaan terlampir			Jangka Waktu Pekerjaan Total 10 Bulan, 9 Bulan konstruksi, 2 Minggu Persiapan, 1 Bulan Precomm
	Rincian Schedule Manpower Loading terlampir			November 2025 - Oktober 2026
	Rincian Schedule tools dan equipment loading terlampir			
				Paket 3 :
				Jangka Waktu Pekerjaan Total 10 Bulan, 9 Bulan konstruksi, 2 Minggu Persiapan, 1 Bulan Precomm
				November 2025 - Oktober 2026
9	K3L			
	- Mengikuti standar K3L Project			Confirm
	- Tidak ada isu quality pada project sebelumnya			Confirm
9	HIERARKI DOKUMEN			
	Dokumen-dokumen yang membentuk Perjanjian harus dianggap saling menjelaskan satu sama lain. Jika ada konflik, ambiguitas, atau perbedaan, prioritas dokumen harus sesuai dengan urutan berikut:			
	i. Addendum Perjanjian (jika ada);			
	ii. Special Term and Conditions (Kontrak);			
	iii. Berita acara klarifikasi dan negosiasi;			
	iv. General Term and Conditions;			
	v. Spesifikasi;			
	vi. Gambar (jika ada);			
	vii. BOQ;			
	viii. jadwal (jika ada); dan			
	ix. dokumen lain, SPH, dll (jika ada) yang tercantum dalam Perjanjian ini.			Confirm
10	LAIN-LAIN			
	PT Semangat Waja Tama bersedia mengikuti seluruh ketentuan dan requirement yang berlaku di site project sesuai dengan arahan dan regulasi yang ditetapkan oleh pihak terkait.*			Confirm
	PT Semangat Waja Tama menyatakan akan mematuhi seluruh persyaratan teknis yang berlaku di site project, dan memahami bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai perjanjian.			Confirm
	Pihak PT Semangat Waja Tama berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan yang berlaku tanpa penyimpangan serta tunduk pada ketentuan yang berlaku di site project.			Confirm
	* Term and Condition yang disampaikan pada Surat Penawaran Harga oleh PT. Semangat Waja Tama, sudah tidak berlaku. Mengikuti Term and Condition pada BA Negosiasi.			Confirm

PT. Semangat Waja Tama



Hana Gus Dwi
Direktur Utama

Jakarta, 29 Oktober 2025
Pihak PT PP (Persero) Tbk

✍️ Signed by:

A. MAULUDIN

AR

Achmad Mauludin
Mgr-Proc Ops

✍️ Signed by:

Recha Enggar

Recha Enggar

Recha Enggar Yono
Mgr PC

✍️ Signed by:

P-1

P-1

P-1
Project Manager

SCOPE PEKERJAAN MAIN-CONTRACTOR DAN SUB-CONTRACTOR (OPEN CUT & AUGER BORING)		PIHAK PERTAMA (Main Cont)	PIHAK KEDUA (Sub Cont)
1	Melakukan persiapan untuk pekerjaan Open Cut termasuk, namun tidak terbatas pada:		
1,1	Pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi personel, bahan-bahan, peralatan, dan alat-alat sesuai manpower dan equipment schedule yang disetujui PIHAK PERTAMA.		✓
1,2	Mobilisasi alat (equipment) dilengkapi dengan SILO, SiO dan sertifikasi lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Pemilik Proyek & PIHAK PERTAMA.		✓
1,3	Menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan akomodasi lainnya untuk tenaga kerja PIHAK KEDUA.		✓
1,4	Pekerjaan persiapan yaitu kantor sementara dan bedeng pekerja untuk pelaksanaan Pekerjaan;		✓
1,5	Tenaga kerja PIHAK KEDUA memiliki sertifikat dan kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Pemilik Proyek & PIHAK PERTAMA		✓
1,6	Menyediakan lahan kerja konstruksi untuk pelaksanaan pekerjaan.		✓
1,7	Melakukan koordinasi dan sosialisasi untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan pemilik lahan, warga terdampak, instansi-instansi terkait serta pihak-pihak lain yang perlu. Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan hal tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.		✓
1,8	Melakukan survei untuk konstruksi dan dokumentasi kondisi awal dan kondisi akhir area kerja.		✓
1,9	Menyediakan workshop untuk melakukan kegiatan fabrikasi untuk pelaksanaan pekerjaan (Cold Bend, CWC (jika ada), penyimpanan material sisa dan lain-lain).		✓
1,10	PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan WPS dan melaksanakan PQT untuk pekerjaan PIHAK KEDUA. Pelaksanaan PQT dan penyediaan WPS dilakukan sesuai dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.		✓
1,11	PIHAK KEDUA menggunakan kawat las sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA.		✓
2	Melakukan proses engineering dan Dokumentasi awal proyek, seperti berikut namun tidak terbatas pada :		
2,1	Survei utilitas dan fasilitas yang ada (existing) di atas tanah dan di bawah tanah		✓
2,2	Melakukan survei konstruksi		✓
2,3	Gambar konstruksi (termasuk design Open Cut dan auger boring, mechanical layout, rute transportasi mesin, bore plan, as built dll)		✓
2,4	Inspection Test and Plan		✓
2,5	Project Execution Plan		✓
2,6	Metode Kerja		✓
2,7	Project Master Schedule dan S-Curve		✓
2,8	Prosedur-Prosedur		✓
2,9	Perhitungan - Perhitungan (Open Cut and Auger boring Calculation, sheet pile, anchoring calculation, dan lain-lain)		✓
2,10	Daftar Dokumen Vendor		✓
2,11	Prosedur Perhitungan Progres		✓
2,12	Mengikuti tahapan perhitungan TKDN Proyek untuk pekerjaan PIHAK KEDUA.		✓
2,13	HSSE Plan, HIRADC dan Emergency Response Plan		✓
3	Melakukan survei termasuk, namun tidak terbatas pada:		
3,1	Topografi dan stacking out dengan support dari PIHAK PERTAMA		✓
3,2	Test pit untuk kebutuhan pekerjaan (seluruh metode kerja)		✓
3,3	Shop Drawing / Gambar kerja		✓
3,4	Prosedur kerja konstruksi		✓
3,5	As built report dan drawing		✓
3,6	Survei kondisi awal dan akhir lokasi kerja (dokumentasi dan pencatatan)		✓
3,7	Survei penempatan rel dan mesin (alignment survey)		✓
4	Menyediakan alat berat, alat bantu konstruksi dan material habis pakai (consumables) termasuk, namun tidak terbatas pada:		
4,1	Alat berat seperti excavator (Excavator (bersertifikat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada Proyek), jika menggunakan excavator sebagai alat angkut wajib memiliki pad eye yang telah diuji oleh PITT.), side boom, crane, hyab crane, dump truck, Trailer, Flatbed Track, dan lain-lain		✓
4,2	Crane sertifikasi MIGAS untuk mobilisasi dan demobilisasi		✓
4,3	Menyediakan spreader bar untuk pelaksanaan lifting material dan equipment PIHAK KEDUA.		✓
4,4	Alat berat, alat angkut angkut dan alat auger boring akan dilakukan pre-mobilisasi inspeksi bersama Pemilik Proyek, PIHAK PERTAMA dan pihak ketiga (jika diperlukan).		✓
4,5	Mesin las lengkap dengan aksesoris		✓
4,6	Pompa sedot air lengkap dengan aksesoris		✓
4,7	Bahan bakar peralatan		✓
4,8	Genset		✓
4,9	Steel Sheet Pile		✓
4,10	Steel Plate		✓
4,11	FJC Tools (Wire brush, LPG, dan lain-lain)		✓
4,12	Holiday Detector		✓
4,13	Personnal Gas Detector		✓
4,14	Air blower		✓
4,15	Menyediakan emergency equipment untuk confined space galian (tripot, fullbody harness, lifeline, stretcher, P3K, dll)		✓
4,16	Menyediakan fasilitas akomodasi (tenda portable, air minum, mobil patrol, dll) dan fasilitas keamanan untuk pengamanan material dan alat milik PIHAK KEDUA.		✓
4,17	Transportasi untuk manpower, tidak diperkenankan menggunakan mobil pick up untuk angkutan penumpang.		✓
4,18	Kendaraan Operasional		✓
4,19	Common tools dan special tools Hand tools dan lifting tools (shackle, webbing, dan lain-lain)		✓
4,20	Sandbag / Jumbo bag		✓
4,21	PVC pipe untuk temporary water way (for river crossing)		✓
4,22	Welding consumables		✓
4,23	Air bersih untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk namun tidak terbatas penyediaan air untuk pelaksanaan hydrotest.		✓
4,24	Instalasi Wrapping & Painting for Pipe Vent		✓
4,25	Warning Sign		✓
4,26	KP Marker (per 1 km)		✓

	4,27	Pipeline Centerline Marker (per 100m)		✓
	4,28	Temporary end cap for bevel end (steel plate).		✓
	4,29	Bahan cacat apapun setelah handling over, penggantian akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.		✓
5		Pekerjaan Open Cut Crossing termasuk, namun tidak terbatas pada:		
	5,1	Test Pit pada Area Entry dan Exit		✓
	5,2	ROW Clearing and Grading (Preparation of Area)		✓
	5,3	Persiapan lokasi kerja dan penanganan disposal soil (termasuk area pembuangan tanah)		✓
	5,4	Penggalian pada posisi crossing (road/river)		✓
	5,5	Menyiapkan dan memasang pipa untuk aliran air sementara selama pekerjaan berlangsung pada area kerja Sungai, parit, saluran irigasi dan sejenisnya.		✓
	5,6	Menyediakan jembatan sementara (temporary bridge) yang sesuai sebagai akses mobilitasi warga apabila pekerjaan PIHAK KEDUA mengganggu akses keluar masuk warga terdampak.		✓
	5,7	Pemasangan pelindung Shoring (Install Shoring Protection) sepanjang galian Open Cut sesuai dengan perhitungan dan persetujuan PIHAK PERTAMA.		✓
	5,8	Fabrikasi string pipa zinker (mengacu ke approved drawing)		✓
	5,9	Melakukan pekerjaan stringing pipa HDD dan Auger Boring. (termasuk pre-pulling hydrotest)		✓
	5,10	Melakukan pekerjaan pemasangan pipa casing HDPE untuk Fiber optic sepanjang lintasan crossing (HDD, Auger Boring, River Crossing, Push-pull, dsb)		✓
	5,11	Pekerjaan fit-up & welding pipa produk		✓
	5,12	Pekerjaan NDT pipa produk (termasuk ultrasonic test dan golden joint)		✓
	5,13	Pekerjaan FJC & Holiday pipa produk		✓
	5,14	Instalasi temporary end cap (steel plate) untuk pipa produk		✓
	5,15	Lowering pipe product		✓
	5,16	Backfilling & compacting (road crossing)		✓
	5,17	PIHAK KEDUA bertanggung jawab serta melakukan pekerjaan re-instatement pada area kerja terdampak oleh pekerjaan PIHAK KEDUA dengan penyelesaian pekerjaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah pekerjaan konstruksi pada area tersebut selesai. Penyelesaian pekerjaan re-instatement dibuktikan dengan persetujuan dari pemilik lahan dan PIHAK PERTAMA. Semua biaya dan risiko pekerjaan reinstatement menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.		✓
	5,18	Aerial Marker, Warning Sign, Marker Sign		✓
	5,19	Insulating Joint (material dari PIHAK PERTAMA)		✓
	5,20	Pemasangan temporary dan permanent cathodic protection pada pipa di sepanjang jalur pipeline		✓
	5,21	Termasuk pekerjaan crossing Sungai, push pull dan fabrikasi – pemasangan concrete weight coating pipe.		✓
	5,22	Menyediakan mobile dark room untuk pelaksanaan pengujian pipeline.		✓
6		Pekerjaan penggalian dan penimbunan tanah kembali yang menjadi lingkup kerja PIHAK KEDUA		✓
7		Pekerjaan Auger Boring termasuk, namun tidak terbatas pada:		
	7,1	Pengiriman pipa casing (20"), accessories (spacer, end seal, venting, elbow, wrapping polikan & pipa produksi (16")) ke lokasi		✓
	7,2	Penggalian entry & exit pit		✓
	7,3	Menyediakan peralatan Auger Boring dan aksesorisnya yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan Proyek minimal 3 set alat.		✓
	7,4	Instalasi Shoring Protection for Entry/Exit Pit		✓
	7,5	Melakukan setting Foundation for Main rail Machine		✓
	7,6	Instalasi Concrete Block (jika diperlukan)		✓
	7,7	Persiapan lantai kerja dan rel		✓
	7,8	Loading unloading & setting mesin di dalam entry pit		✓
	7,9	Persiapan lokasi dan pelaksanaan disposal soil (termasuk area buang tanah)		✓
	7,10	Install Auger Boring Machine		✓
	7,11	Prepare & fit-up welding pipa casing		✓
	7,12	Boring/Jacking Work step (Pitoting, Reaming, Inserting Casing (if any), Insert Product Pipe, Install Spacer, Install End Seal, Install - Vent & Drain (if any), Wrapping & Painting for Vent & Drain. (Wrapping dan painting material dari PIHAK PERTAMA)		✓
	7,13	Cutting & Rebeveling (jika diperlukan)		✓
	7,14	Pekerjaan fit-up & welding pipa produk		✓
	7,15	Pekerjaan NDT pipa produk (termasuk ultrasonic test dan golden joint)		✓
	7,16	Pekerjaan FJC & Holiday pipa produk		✓
	7,17	Instalasi temporary end cap (steel plate) untuk pipa produk		✓
	7,18	Backfilling & compacting (after tie-in)		✓
	7,19	Aerial Marker, Warning Sign, Marker Sign		✓
	7,20	Temporary dan Permanent Cathodic Protection (material dari PIHAK PERTAMA)		✓
8		Pekerjaan pre-commissioning pipa (menyediakan alat, material dan pelaksanaan) termasuk namun tidak terbatas kepada:		
	8,1	Cleaning and Gauging		✓
	8,2	Hydrotest		✓
	8,3	Dewatering		✓
	8,4	Swabbing		✓
	8,5	Drying		✓
9		Pekerjaan Administrasi termasuk, namun tidak terbatas pada:		
	9,1	Koordinasi dengan warga, badan, instansi dan sebagainya, perijinan untuk konstruksi serta pelaksanaan Traffic Management (rambu sesuai regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, separator/barikade, flagman, penerangan, dll)		✓
	9,2	Menyediakan persyaratan HSE untuk tenaga kerja PIHAK KEDUA (seperti: Medical Check Up, Antigen, SKCK)		✓
	9,3	Menyediakan asuransi BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja		✓
	9,4	Melengkapi sertifikasi kompetensi pekerja sesuai requirement Pemilik Proyek		✓
	9,5	Melakukan sosialisasi pekerjaan kepada Masyarakat yang terdampak.		✓
	9,6	Menyediakan asuransi peralatan dan pekerja PIHAK KEDUA		✓
	9,7	Welder Qualification Test (WQT) dan sertifikat		✓
	9,8	Working Permit (SIKA, JSA, APD)		✓

9,9	Laporan kegiatan dan dokumentasi (laporan final Open Cut Crossing dan auger Boring)		✓
9,10	QC Reporting and Test result report (mengacu ITP yang disetujui)		✓
9,11	Metode Kerja Pelaksanaan,		✓
9,12	Pemindahan kantor sendiri, area fabrikasi dan pemulihan area yang digunakan pada saat penyelesaian proyek		✓
9,13	Mengikuti semua peraturan dan prosedur dari Pemilik Proyek, PIHAK PERTAMA dan otoritas setempat terkait HSSE (Health, Safety, Security, and Environment)		✓
9,14	Memastikan semua metode dan urutan kerja dibahas dan kompatibel dengan pihak lain yang bekerja di area yang sama		✓
9,15	Memantau setiap peralatan yang diangkat dan memastikan prosedur pengangkatan diikuti untuk menjaga garansi dan mencegah cacat yang disebabkan oleh pengangkatan dan harus menyediakan Rigger bersertifikat		✓
9,16	Kerusakan terhadap fasilitas yang ada (existing) yang disebabkan oleh pekerjaan konstruksi		✓
9,17	Melakukan dan menyediakan izin kerja konstruksi yang diperlukan kepada PIHAK PERTAMA dan OWNER		
9,18	Bersedia melakukan sewa lahan (apabila diperlukan) untuk Konstruksi HDD ataupun kebutuhan Maintenance		
10	MATERIAL		
10,1	PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan material balance untuk material dan bahan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA. Laporan material balance diserahkan ke PIHAK PERTAMA setiap akhir bulan.		✓
10,2	PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyimpan dan menjaga kondisi material-material sisa dari sisa pekerjaan konstruksi. Sebelum serah terima pertama pekerjaan, PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan seluruh sisa material kepada PIHAK PERTAMA.		✓
10,3	PIHAK PERTAMA melakukan penyediaan Pipe Produksi hanya hingga LAYDOWN/ STOCKYARD yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA	✓	
10,4	PIHAK KEDUA melakukan penjemputan Pipe Produksi menggunakan kendaraan sendiri dari STOCKYARD ke lokasi area kerja serta melakukan pembongkaran Pipe Produksi di lokasi area kerja menggunakan peralatan PIHAK KEDUA		✓
10,5	PIHAK PERTAMA melakukan Loading Pipe Produksi ke kendaraan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, dan Crane di LAYDOWN/ STOCKYARD merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA	✓	
11	Penyampaian Informasi tertulis jika akan memobilisasi dan demobilisasi peralatan dan alat-alat; mobilisasi dan demobilisasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA		✓
12	PIHAK KEDUA wajib menyediakan Intelligent pig untuk menentukan lokasi pipeline yang penyok/rent serta menanggung semua biaya dan mengganti kerusakan pipeline tersebut.		✓
13	PIHAK KEDUA harus memenuhi produktivitas pekerjaan Auger Boring dan Open Cut adalah		
13,1	minimal Produktivitas Open Cut per tim adalah 3 joint-welding/hari/tim sebelum Lowering, atau 36 meter Lowering-Backfilling per hari		✓
13,2	waktu maksimal pengerjaan Auger Boring per lokasi adalah 10 hari dengan 1 tim, sudah termasuk persiapan, diluar mobilisasi		✓
14	Pengetesan mutu Pekerjaan yang mencakup semua prosedur tes, pelaksanaan tes, dan laporan hasil pengetesan sesuai dengan ketentuan Mukum yang Berlaku dan ketentuan yang disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA dan Pemilik Proyek.		✓
15	Hasil pekerjaan yang akan diberikan memiliki rencana umur Konstruksi selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.		✓
16	Penyampaian Informasi tertulis jika akan memobilisasi dan demobilisasi peralatan dan alat-alat; mobilisasi dan demobilisasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA;		✓
17	Penyediaan tim pemeliharaan sebanyak dua (2) orang untuk pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA di Masa Perbaikan Cacat Mutu;		✓
18	Recovery Plan apabila terjadi keterlambatan pekerjaan dari rencana (Baseline) yang sudah di setujui PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA		
18,1	Pelaksanaan Pekerjaan dalam dua (2) shift (jika diperlukan) untuk pemenuhan schedule yang didukung dengan terbukanya lahan/area dan adanya Pekerjaan yang tersedia; dan dipertimbangkan juga terkait Fatigue Management & turn over tim pekerja, supervisor dan HSSE di shift berikutnya.		✓
	Setiap segmen area kerja wajib tersedia supervisor, HSSE Officer, Paramedik.		
18,2	Pelaksanaan Pekerjaan dengan penambahan resources atau tim beserta alat untuk pemenuhan schedule yang didukung dengan terbukanya lahan/area dan adanya Pekerjaan yang tersedia;		✓
19	PIHAK KEDUA menyediakan area laydown untuk pelaksanaan pekerjaan Open Cut, Auger Boring serta untuk material pipeline sesuai dengan volume pekerjaan PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan menghiraukan material pipeline ke area laydown PIHAK KEDUA Free on Truck, PIHAK KEDUA berkewajiban menurunkan material pipeline dan melakukan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang di persyaratkan oleh PIHAK PERTAMA. Kerusakan dan kehilangan material pipeline setelah diserahkan kepada PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.		✓
20	Penyelesaian pekerjaan re-instatement PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 bulan setelah selesai menyelesaikan pekerjaan di lokasi pekerjaan.		✓
21	PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan koordinasi untuk identifikasi dan penyelesaian pekerjaan re-instatement, PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan pihak lain yang memiliki pekerjaan pada area kerja yang sama untuk penentuan penyelesaian re-instatement.		✓
22	PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan secara menyeluruh sesuai dengan alur dan rencana pekerjaan, tidak diperkenankan untuk meninggalkan segmen-segmen atau spot-spot pipeline.		✓
23	PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan Open Cut dan auger boring apabila terjadi perubahan rute dari Pemilik Kerja.		✓
24	PIHAK PERTAMA dapat mengurangi volume pekerjaan jika PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi produktivitas dan terdapat indikasi keterlambatan pekerjaan		✓
25	PIHAK PERTAMA dapat merubah volume pekerjaan PIHAK KEDUA berdasarkan evaluasi kinerja dan waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan, penambahan volume bisa diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan mekanisme Change Order yang disepakati saat kontrak		✓
26	Apabila PIHAK KEDUA dinilai tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat memutus kontrak secara sepihak dan dapat mengalihkan sisa pekerjaan tersebut ke vendor yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dengan semua beban dan ganti rugi menjadi tanggung jawab dari PIHAK KEDUA		✓

27	PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap housekeeping dan bekerjasama dengan pihak ketiga pengelolaan limbah B3 yang berijin dari KemenLH dilengkapi dengan manifest limbahnya jika PIHAK KEDUA menimbulkan limbah B3		√

Menyetujui

Bekasi, 30 Oktober 2025




SEMANGAT WAJA TAMBA
sila jadi orang

Hana Gus Dwi Wijaya

Direktu PT Sernangat Waja Tama

DOKUMENTASI NEGOSIASI
PEKERJAAN OPEN CUT & AUGER BORING PAKET 1 & PAKET 3
PROYEK PIPANISASI BBM CIKAMPEK PLUMPANG

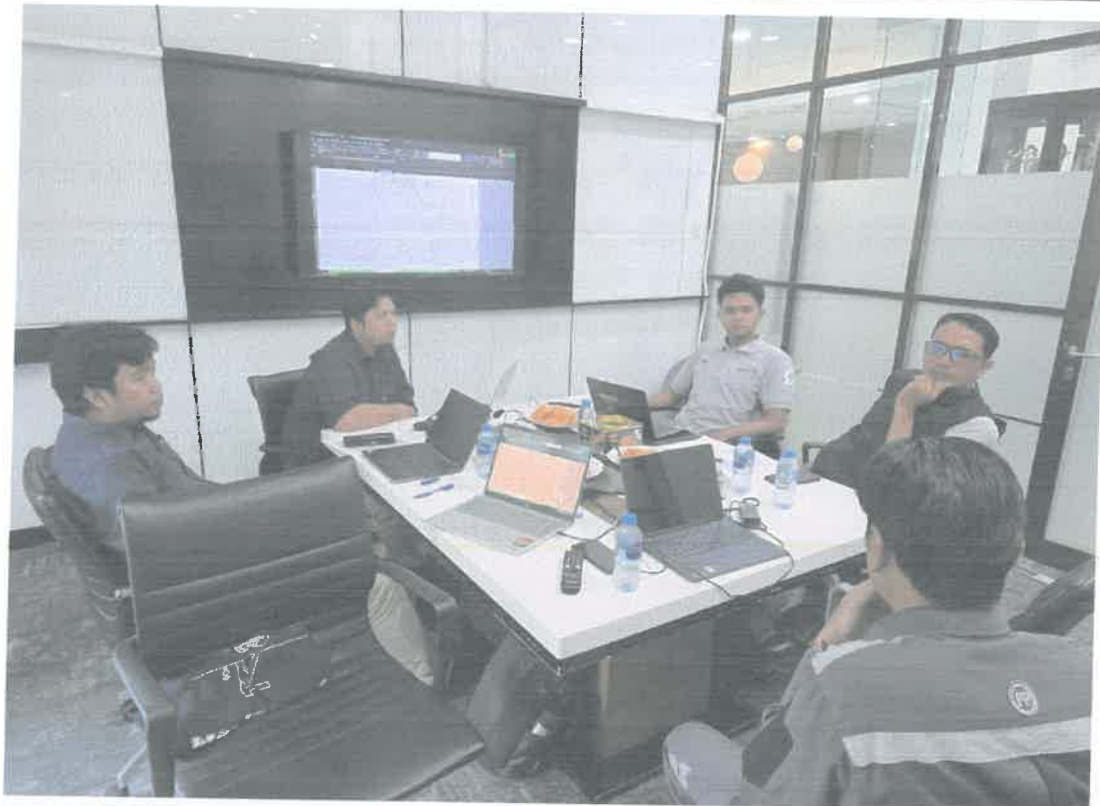



Daftar Kehadiran

Agenda : Klaimisasi dan Negosiasi Pengerjaan open cut Pilet 1 dan 3

Hari/Tanggal : Rabu, 23 oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Wisma Subiyanto, Lounge 5.

[illegible]

Schedule Pekerjaan Open Cut dan Auger Boring

NO	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	PROD/ HR (m3)	Timeline									
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
I	Sosialisasi													
1	Welder Test													
2	Inspeksi Alat Berat													
3	Fabrikasi Peralatan Penunjang													
5	Pengadaan APD & Peralatan Kerja													
6	Survey Lokasi (Mess, Stock Pile)													
7	MCU Pekerja													
8	Safety Induction													
II	KONTRUKSI													
9	Survey, Scanning, and Test Pit													
	KP 8+600 s/d KP 18+740													
11	Hauling													
12	Stringing													
13	Welding	Meter	9.350	28,33										
14	Trenching Lowering Backfill	Meter	9.350	20,78										
15	Augher Boring													
16	Reinstatement													
	KP 0+000 s/d KP 8+600													
18	Hauling													
19	Stringing HDD													
20	Welding HDD	Meter	9.565	21,26										
III	Pre Commissioning													
	Pre Commissioning													

Pihak Subkontraktor
PT Semangat Waja Tama



PT SEMANGAT WAJA TAMATA
Hana Gus Dwi Wijaya
Direktur Utama

Equipment Loading Plan													
NO	ITEM PEKERJAAN	Timeline										TOTAL	
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	Man Month	Man Hour
I	Indirect Man Power												
1	Project Manager	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
2	Foreman	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	40	9.600
3	Project Control	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
4	Material Control	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
5	Safetyman	2	1	5	5	5	5	5	5	5	5	37	8.880
6	Quality Control	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	25	6.000
7	Drafter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
8	Surveyor	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	4.320
9	Admin Project	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
10	Driver	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
11	Mechanic	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
12	Humas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
13	Coating Inspector	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
14	Welding Inspector	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
15	Field Engineer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
16	Paramedic	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
II	Direct Man Power												
1	Welder	4	8	10	10	10	10	10	10	10	2	80	19.200
2	Fitter	2	4	5	5	5	5	5	5	5	1	40	9.600
3	Grinder	4	8	10	10	10	10	10	10	10	2	80	19.200
4	Helper	6	12	15	15	15	15	15	15	15	4	121	29.040
5	Rigger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
6	Operator Excavator	2	5	7	7	7	7	7	7	7	2	56	13.440
7	Keamanan	4	8	10	10	10	10	10	10	10	4	67	16.080
8	Flagman	2	4	5	5	5	5	5	5	5	1	40	9.600
9	Operator TMC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1.920
10	Tukang Gali	8	12	16	20	24	24	12	12	12		120	28.800
54		83	107	111	115	115	103	97	85	33		721	203.760

Pihak Subkontraktor
PT Semangat Waja Tama



SEMANGAT WAJA TAMA

Hana Gus Dwi Wiaya
Direktur Utama

Equipment Loading Plan

NO	ITEM PEKERJAAN	Timeline										TOTAL	
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	E.Month	E.Hour
I	Alat berat												
1	Excavator PC 100/ 135	2	5	7	7	7	7	7	7	7	1	55	13.200
2	TMC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
3	Augher Boring Set				1	1	1	1				4	960
II	Equipment											-	-
4	Pickup	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
5	Elf	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	25	6.000
6	Light Vehicle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
7	Miller	4	8	10	10	10	10	10	10	10	2	80	19.200
8	Theodolite TS	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	16	3.840
9	NDT RT Kit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
10	Genset	2	2	4	4	4	4	4	4	4	1	31	7.440
11	Holiday Test Detector	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
12	Water Pump	4	4	10	10	10	10	10	10	10	1	75	18.000
13	Tripod Chainblock	8	8	20	20	20	20	20	20	20	1	149	35.760
14	External Clamp	3	3	7	7	7	7	7	7	7	1	53	12.720
15	Pipe Locator	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160
16	Mesin Bending		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
													130.080

Pihak Subkontraktor
PT Semangat Waja Tama



Hana Gus Dwi Wijaya
Direktur Utama

PERBANDINGAN RINCIAN HARGA
JENIS PEKERJAAN PEKERJAAN OPEN CUT DAN AUGER BORING PAKET 1
PROYEK PIPANISASI BBM CIKAMPEK PLUMPANG

No.	URAIAN	SAT.	PT. Semangat Waja Tama			
			VOLUME	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	HARGA NEGO
				Rp.	Rp.	Rp.
PAKET 1 KP 0+000 to 18+740						
A	OPEN CUT & HDD Stringing		18.690,00			
1	Open Cut Non Tol (Land Clearing, Stringing, Welding, NDT, FJC, Holiday test, Trenching, Lowering & Backfilling)	Mtr	8.288,00	1.900.000,0	15.747.200.000,0	1.878.000,0
2	Pemasangan Pipeline Above Ground at LBCV	Mtr	85,00	2.850.000,0	242.250.000,0	2.850.000,0
3	Open Cut River Crossing (Zinker Under Ground)		300,00	2.850.000,0	855.000.000,0	2.850.000,0
4	Push-Pull w/ CWC	Mtr	90,00	2.150.000,0	193.500.000,0	2.150.000,0
5	HDD Stringing, Welding, NDT, FJC, Hydrostatic Test (pre pullback)	Mtr	9.565,00	850.000,0	8.130.250.000,0	850.000,0
6	Tie in Open Cut to HDD	Mtr	193,00	2.800.000,0	540.400.000,0	2.800.000,0
7	Tie in HDD to HDD	Mtr	384,00	2.800.000,0	1.075.200.000,0	2.800.000,0
8	Open Cut Road Crossing	Mtr	10,00	2.800.000,0	28.000.000,0	2.800.000,0
B	BORING Stringing, Welding, NDT, FJC					
1	Manual Boring	Mtr	74,00	2.500.000,0	185.000.000,0	2.500.000,0
2	Auger Boring with Casing	Mtr	85,00	4.500.000,0	382.500.000,0	4.500.000,0
C	PIPELINE PRE- COMM					
1	Pre-Comm (Cleaning, Gauging, Water Filling, Hydrostatic Test, Dewatering, Swabbing, Drying)	Mtr	18.690,00	110.000,0	2.055.900.000,0	110.000,0
2	KP marker, marker post, warning sign, aerial marker	Ls	1,00	250.000.000,0	250.000.000,0	250.000.000,0
D	PROJECT MANAGEMENT & OTHERS					
1	Project Management	Ls	1,00	Include		Include
2	Mobilization dan Demobilization	Ls	1,00	Include		Include
3	Project Facilities & Utilities	Ls	1,00	Include		Include
4	Work Permit, Social, HSE Cost	Ls	1,00	Include		Include
5	Any other Certificate (if Needed)	Ls	1,00	Include		Include
TOTAL (Rp)					29.505.200.000,01	29.502.864.000,00


Catatan lingkup pekerjaan :

- 1 Include test lain yang dibutuhkan sesuai kebutuhan lapangan
- 2 Tidak ada eskalasi harga saat masa pelaksanaan
- 3 Harga Sesuai dengan volume kebutuhan pekerjaan (BoQ)
- 4 Termasuk masa pemeliharaan
- 6 Tanpa Uang Muka
- 7 SKBDN Usance 180 Hari
- 8 Termasuk Miscellaneous Material (Bulk Material)
- 9 Termasuk alat kerja yang dibutuhkan
- 10 Termasuk Mob-Demob, Precommissioning, dan Report and Documentation

PT. Semangat Waja Tama

Jakarta, 29 Oktober 2025
 Pihak PT PP (Persero), Tbk


 Hanza Gus Dwi
 Direktur Utama

Signed by:  **A. MAULUDIN**
 Mgr-Proc Ops
 **Recha Enggar**
 Mgr PC EPC
 **Randy Mario S**
 PM



SEMANGAT WAJA TAMA
unlimited growth

PT SEMANGAT WAJA TAMA

Contractor For Oil & Gas Construction

Head Office :
M Gold Tower Lantai 20, Jl. KH. Noer Ali, Kalmalang, Bekasi Selatan
Jawa Barat – 17148, Indonesia. Telp. +6221-25087297 – 98

Workshop :
Jl. Metal 1, Sontajaya, Kcc. Cikarang Tira., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

sales@ptsemangat.co.id
www.ptsemangat.co.id



Kepada Yth. : **Bapak Rizki**
Procurement PT PP
No Surat : 0001/SWT/SPH/PP/X/2025
Hal : Surat Penawaran Harga Paket 1 Pipanisasi Cikampek - Plumpang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya informasi kebutuhan pekerjaan *Penyediaan Pipanisasi Cikampek – Plumpang* oleh PT PP, maka bersama dengan surat ini kami menyatakan minat dan kesanggupan mengerjakan proyek tersebut dengan harga

Rp29.685.200.000,00

Terbilang

“Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah”

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Bekasi, 27 Oktober 2025
Hormat Kami
PT Semangat Waja Tama



SEMANGAT WAJA TAMA
unlimited growth

Hana Gus Dwi Wijaya
Direktur Utama



SEMANGAT WAJA TAMA
unlimited joys

PT SEMANGAT WAJA TAMA

Contractor For Oil & Gas Construction

Head Office :
M Gold Tower Lantai 20, Jl. KH. Noer Ali, Kalimalang, Bekasi Selatan
Jawa Barat - 17148, Indonesia. Telp. +6221-2807297 - 98

Workshop :
Jl. Melati I, Sertajaya, Kec. Cikarang Tim., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

sales@ptsemangat.co.id
www.ptsemangat.co.id



Lampiran Bill Of Quantity Pekerjaan Paket 1





RFQ No.

T24023-000-PRM-RFQ-001

Rev.

D

Job No.

: 725001

Issued Date

: 3 Desember 2024

Page of

CONSTRUCTION & INVESTMENT

Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang

BOQ OPEN CUT & AUGER BORING - PAKET 1

No	Volume	Deskripsi	Unit Price (IDR)	Total Price (IDR)
PAKET 1 KP 0+000 to 18+740				
18.690,00 OPEN CUT & HDD Stringing				
1	8.288,00 Mtr	Open Cut Non Tol (Land Clearing, Stringing, Welding, NDT, FJC, Holiday test, Trenching, Lowering & Backfilling)	1.900.000	15.747.200.000
2	85,00 Mtr	Pemasangan Pipeline Above Ground at LBCV	2.850.000	242.250.000
	300,00	Open Cut River Crossing (Zinker Under Ground)	2.850.000	855.000.000
3	90,00 Mtr	Push-Pull w/ CWC	2.150.000	193.500.000
4	9.565,00 Mtr	HDD Stringing, Welding, NDT, FJC, Hydrostatic Test (pre pullback)	850.000	8.130.250.000
	193,00 Mtr	Tie in Open Cut to HDD	2.800.000	540.400.000
	384,00 Mtr	Tie in HDD to HDD	2.800.000	1.075.200.000
5	10,00 Mtr	Open Cut Road Crossing	2.800.000	28.000.000
BORING Stringing, Welding, NDT, FJC				
7	74,00 Mtr	Manual Boring	2.500.000	185.000.000
8	85,00 Mtr	Auger Boring with Casing	4.500.000	382.500.000
PIPELINE PRE- COMM				
9	18.690,00 Mtr	Pre-Comm (Cleaning, Gauging, Water Filling, Hydrostatic Test, Dewatering, Swabbing, Drying)	110.000	2.055.900.000
	1,00 Ls	KP marker, marker post, warning sign, aerial marker	250.000.000	250.000.000
OTHERS				
	1,00 Ls	Project Management	Include	
	1,00 Ls	Mobilization dan Demobilization	Include	
	1,00 Ls	Project Facilities & Utilities	Include	
	1,00 Ls	Work Permit, Social, HSE Cost	Include	
	1,00 Ls	Any other Certificate (if Needed)	Include	
JUMLAH				29.685.200.000

T&C

:


1

Reinstatement area BPJN termasuk bongkar pasang saluran Uditch dan pasangan batu kali

		DIVISION OF RESPONSIBILITY HSE REQUIREMENTS		DOR-C-001		
Discipline : OPEN CUT AUGER BOR & HDD Item Description : GENERAL WORK Project : PIPANISASI CIKAMPEK - PLUMPANG Client : PT. PERTAMINA GAS		Item Requirement Bisa disesuaikan kebutuhan proyek atau Persyaratan Client, DoR ini akan menjadi bagian dari kontrak PP dengan Subkontraktor				
No	Requirement	Responsibility Provide By		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	PP	Vendor	
1 Dokumen Perencanaan						
a.	Rencana HSE (HSE Plan) sesuai lingkup kerja		√	R	P	Menyesuaikan Template by PP
b.	Penilaian resiko (IBPR/HIRADC) sesuai lingkup kerja		√	R	P	Menyesuaikan Template by Owner
c.	Daftar peralatan, kendaraan, alat angkat/angkut, power tools, hand tools yang akan digunakan sesuai lingkup pekerjaan.		√	R	P	
d.	Metode Kerja (WMS) sesuai lingkup kerja		√	R	P	Template by PP
e.	JSA sesuai lingkup kerja		√	R	P	Template by Owner
f.	Prosedur & Instruksi Kerja (WI) sesuai lingkup kerja		√	R	P	Apabila ada dan sama, follow SOP PP (Format Owner). SOP follow PP
g.	Rencana Tanggap Darurat (ERP)		√	R	P	Template by PP
h.	Training need analysis		√	R	P	Format TNA by PP, subcont approval PP
i.	Manpower planning, Struktur Organisasi tim Proyek					
j.	Traffic management plan		√	R	P	
k.	Journey management plan		√	R	P	
2 Surat Komitmen Pemenuhan K3						
a.	Vendor harus membuat Statement Letter pemenuhan standar K3 yang diandatangani pimpinan puncak (draft surat terlampir dalam ITB HSE) : 1. Surat Pernyataan Alat 2. Surat Pernyataan Lifting Gear 3. Surat Pernyataan Kompetensi Personil 4. HSE Commitment 5. Surat Pernyataan MCU dan Bebas Narkoba 6. Surat Pernyataan BPJS		√	R	P	Khusus Untuk vendor Z dan non Z
b.	Surat komitmen pemenuhan persyaratan ITB HSE		√	R	P	
c.	Vendor berkomitmen & patuh untuk melaksanakan program K3L PTPP & Client		√	R	P	Khusus Untuk vendor non Z
3 Sertifikat Kelayakan Dan Kompetensi						
a.	Memiliki CSMS PERTAMINA dan/atau PT PP (Persero) Tbk kategori High Risk dan masih valid selama waktu pekerjaan		√	R	P	
b.	HSE Koordinator Proyek minimal memenuhi persyaratan berikut : a. Pekerjaan dengan tenaga kerja < 20 orang, adalah : - Dapat ditunjuk dari salah satu tenaga kerja - Pengalaman bekerja di industri migas minimal 3 tahun b. Pekerjaan dengan tenaga kerja 20 - 49 orang, adalah : - Pendidikan minimal SLTA - Sertifikat K3 Migas - Pengalaman min 3 tahun di HSE (industri migas) c. Pekerjaan dengan tenaga kerja > 50 orang, adalah : - Pendidikan minimal SLTA - Sertifikat K3 Migas - Pengalaman min 5 tahun di HSE (industri migas) - Dan berlaku kelipatannya (penambahan 1 orang HSE Coordinator / Officer untuk setiap penambahan 50 orang tenaga kerja)		√	R	P	Personel HSE wajib di interview by PP Sumber Daya Seluruh pekerja memenuhi Kualifikasi & Sertifikat, Kompetensi Tenaga Kerja ini termasuk & tidak terbatas pada: Project Manager, Project Supervisor, HSE Coordinator, Tenaga Ahli, Pekerja Teknis. Daftar pekerja beserta kualifikasi dan kompetensinya di lampirkan dalam HSE Plan Kualifikasi HSE Coordinator minimal memenuhi persyaratan berikut a. Pekerjaan dengan tenaga kerja < 20 orang, adalah : - Dapat ditunjuk dari salah satu tenaga kerja - Pengalaman bekerja di industri migas minimal 3 tahun b. Pekerjaan dengan tenaga kerja 20 - 49 orang, adalah : - Pendidikan minimal SLTA - Sertifikat K3 Migas - Pengalaman min 3 tahun di HSE (industri migas) c. Pekerjaan dengan tenaga kerja > 50 orang, adalah : - Pendidikan minimal SLTA - Sertifikat K3 Migas - Pengalaman min 5 tahun di HSE (industri migas) - Dan berlaku kelipatannya (penambahan 1 orang HSE Coordinator / Officer untuk setiap penambahan 50 orang tenaga kerja)
c.	Menyediakan personil Paramedic bersertifikat hiperkes dan BTCLS dengan rasio 1:100		√	R	P	
d.	Supporting Sertifikat tenaga ahli dan personil kompeten yang dikeluarkan oleh BNSP/Kemenaker sesuai lingkup kerja termasuk namun tidak terbatas pada : - First aider dari BNSP ratio 1 : 20 - Teknisi Perancah - Supervisor Perancah - Operator alat angkat (MIGAS) - Operator alat berat (MIGAS/BNSP/DISNAKER) - Rigger (MIGAS) - Teknisi listrik (K3 Listrik) - Analyzed Gas Tester (khusus untuk area brownfield/eksisting pertagas) - Teknisi Ruang Terbatas - TKBT & TKPK Tingkat 2 - Operator boring (Boring and Driving) dari LPJK - Welder (Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (DJBETK) atau BADAN PEMERINTAH yang berkompeten) Pemenuhan sertifikat kompetensi lainnya sesuai lingkup pekerjaan dan perundangan yang berlaku.		√	R	P	

No	Requirement	Responsibility Provide By		Inspection Level		Remarks																																																																																																				
		PP	Vendor	PP	Vendor																																																																																																					
e.	Vendor harus menyerahkan dokumen rekaman pemeriksaan kesehatan (pre-employment atau periodically MCU) semua pekerja yang terlibat dalam project yang mencakup pemeriksaan dalam MCU Package <table><tr><th>Paket Umum General Package</th><th>Keterangan Remarks</th></tr><tr><td>1. Anamnesis</td><td></td></tr><tr><td>2. Pemeriksaan Fisik Physical Examination</td><td>Tekanan darah, nadi, suhu, frekuensi pernafasan, indeks massa tubuh, tes visual Blood pressure, pulse rate, temperature, respiratory rate, body mass index, visual acuity test.</td></tr><tr><td>3. Pemeriksaan Penunjang Supporting Examinations</td><td>Rekam jantung dengan EKG, Rontgen dada, gula darah puasa (GDP), Laboratorium darah (Hemoglobin, Leukosit/Trombosit), dan Urin rutin Electrocardiogram (EKG), chest X-ray, fasting blood sugar (FBS), Blood Laboratory (Hemoglobin, Leukocyte Platelet), and routine Urinalysis.</td></tr></table> <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pekerjaan</th><th>Jenis Pemeriksaan MCU</th><th>Keterangan</th></tr><tr><th></th><th></th><th>Pemeriksaan Dasar</th><th>Pemeriksaan Tambahan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Awak mobil tangki</td><td>Wajib</td><td> - Tes pendengaran. - Tes kekuatan otot dan refleks. - Tes NAPZA Pemeriksaan NAPZA dan alcohol dilakukan secara acak (random) dan bila dicurigai.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Bekerja di ruang terbatas (confined space)</td><td>Wajib</td><td> - Tes pendengaran - Tes Spirometri - Pada lensa ahli, jika hasil rekam jantung (EKG) abnormal maka dilakukan Treadmill test. - Fit test dilakukan juga bagi pengguna masker dan SCBA </td></tr><tr><td>3.</td><td>Cleaning Service</td><td>Wajib</td><td> - Tes Kebugaran (NAPFA Modifikasi) - Tes Spirometri - Tes buta warna </td></tr><tr><td>4.</td><td>Food Handler</td><td>Wajib</td><td> - Anti HAV - Stool Culture (setiap 6 bulan) Pemeriksaan NAPZA dan alcohol dilakukan secara acak (random) dan bila dicurigai.</td></tr><tr><td>5.</td><td>Kru Kapal</td><td>Wajib</td><td>Penyakit dan kru kapal menggunakan sertifikat kesehatan yang valid dari International Maritime Organization (IMO).</td></tr><tr><td>6.</td><td>Operator Alat Berat</td><td>Wajib</td><td> - Tes pendengaran. - Tes kekuatan otot dan refleks. - Tes NAPZA Pemeriksaan NAPZA dan alcohol dilakukan secara acak (random) dan bila dicurigai.</td></tr><tr><td>7.</td><td>Operator Plant</td><td>Wajib</td><td> - Test buta warna Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan potensi bahaya pekerjaan yang akan dilakukan.</td></tr><tr><td>8.</td><td>Pekerja Kantor (Office Worker)</td><td>Wajib</td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td>Pekerja Laboratorium / Sampling (chemical handling)</td><td>Wajib</td><td> - Monitoring biologi sesuai bahan kimia yang digunakan, aerosol dari debu. Penggunaan masker/respirator disesuaikan dengan bahan kimianya. Jika menggunakan masker maka lakukan fit test.</td></tr><tr><td>10.</td><td>Pekerjaan di ketinggian</td><td>Wajib</td><td> - Tes pendengaran - Romberg test Perhatikan riwayat vertigo, epilepsy dan hasil wawancara atau anamnesis.</td></tr><tr><td>11.</td><td>Pekerja Sipil, Mechanical, Electrical</td><td>Wajib</td><td> - Tes buta warna khusus untuk pekerjaan electrical </td></tr><tr><td>12.</td><td>Pekerjaan yang terpapar kebisingan</td><td>Wajib</td><td> - Tes Audiometri Perhatikan Noise Reduction Rate (NRR) pelindung telinga.</td></tr><tr><td>13.</td><td>Pekerjaan yang terpapar radiasi perunggu</td><td>Wajib</td><td> - Pemantauan fungsi organ target, sesuai dosis hasil </td></tr><tr><td>14.</td><td>Pengemudi mobil berpenumpang</td><td>Wajib</td><td> - Tes pendengaran. - Tes kekuatan otot dan refleks. - Tes NAPZA Pemeriksaan NAPZA dan alcohol dilakukan secara acak (random) dan bila dicurigai.</td></tr><tr><td>15.</td><td>Penyakit Teknik Bawah Air</td><td>Wajib</td><td>Penyakit dan kru kapal menggunakan sertifikat kesehatan yang valid dari International Maritime Organization (IMO).</td></tr><tr><td>16.</td><td>Pest Control</td><td>Wajib</td><td> - Tes Cholinesterase (setiap 6 bulan) </td></tr><tr><td>17.</td><td>Tenaga Fireman & Tim Rescue</td><td>Wajib</td><td> - Tes Kebugaran (NAPFA Modifikasi) - Tes Spirometri - Tes buta warna </td></tr><tr><td>18.</td><td>Tenaga Kesehatan</td><td>Wajib</td><td> - HbA1c </td></tr><tr><td>19.</td><td>Tenaga Sekutuan</td><td>Wajib</td><td> - Tes Kebugaran (NAPFA Modifikasi) - Tes Spirometri - Tes buta warna </td></tr><tr><td>20.</td><td>Tim Rescue</td><td>Wajib</td><td> - Tes Kebugaran (NAPFA Modifikasi) - Tes Spirometri - Tes buta warna </td></tr><tr><td>21.</td><td>Welder</td><td>Wajib</td><td> - Tes Spirometri </td></tr></table>	Paket Umum General Package	Keterangan Remarks	1. Anamnesis		2. Pemeriksaan Fisik Physical Examination	Tekanan darah, nadi, suhu, frekuensi pernafasan, indeks massa tubuh, tes visual Blood pressure, pulse rate, temperature, respiratory rate, body mass index, visual acuity test.	3. Pemeriksaan Penunjang Supporting Examinations	Rekam jantung dengan EKG, Rontgen dada, gula darah puasa (GDP), Laboratorium darah (Hemoglobin, Leukosit/Trombosit), dan Urin rutin Electrocardiogram (EKG), chest X-ray, fasting blood sugar (FBS), Blood Laboratory (Hemoglobin, Leukocyte Platelet), and routine Urinalysis.	No.	Jenis Pekerjaan	Jenis Pemeriksaan MCU	Keterangan			Pemeriksaan Dasar	Pemeriksaan Tambahan	1.	Awak mobil tangki	Wajib	- Tes pendengaran. - Tes kekuatan otot dan refleks. - Tes NAPZA Pemeriksaan NAPZA dan alcohol dilakukan secara acak (random) dan bila dicurigai.	2.	Bekerja di ruang terbatas (confined space)	Wajib	- Tes pendengaran - Tes Spirometri - Pada lensa ahli, jika hasil rekam jantung (EKG) abnormal maka dilakukan Treadmill test. - Fit test dilakukan juga bagi pengguna masker dan SCBA	3.	Cleaning Service	Wajib	- Tes Kebugaran (NAPFA Modifikasi) - Tes Spirometri - Tes buta warna	4.	Food Handler	Wajib	- Anti HAV - Stool Culture (setiap 6 bulan) Pemeriksaan NAPZA dan alcohol dilakukan secara acak (random) dan bila dicurigai.	5.	Kru Kapal	Wajib	Penyakit dan kru kapal menggunakan sertifikat kesehatan yang valid dari International Maritime Organization (IMO).	6.	Operator Alat Berat	Wajib	- Tes pendengaran. - Tes kekuatan otot dan refleks. - Tes NAPZA Pemeriksaan NAPZA dan alcohol dilakukan secara acak (random) dan bila dicurigai.	7.	Operator Plant	Wajib	Test buta warna Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan potensi bahaya pekerjaan yang akan dilakukan.	8.	Pekerja Kantor (Office Worker)	Wajib		9.	Pekerja Laboratorium / Sampling (chemical handling)	Wajib	Monitoring biologi sesuai bahan kimia yang digunakan, aerosol dari debu. Penggunaan masker/respirator disesuaikan dengan bahan kimianya. Jika menggunakan masker maka lakukan fit test.	10.	Pekerjaan di ketinggian	Wajib	- Tes pendengaran - Romberg test Perhatikan riwayat vertigo, epilepsy dan hasil wawancara atau anamnesis.	11.	Pekerja Sipil, Mechanical, Electrical	Wajib	Tes buta warna khusus untuk pekerjaan electrical	12.	Pekerjaan yang terpapar kebisingan	Wajib	Tes Audiometri Perhatikan Noise Reduction Rate (NRR) pelindung telinga.	13.	Pekerjaan yang terpapar radiasi perunggu	Wajib	Pemantauan fungsi organ target, sesuai dosis hasil	14.	Pengemudi mobil berpenumpang	Wajib	- Tes pendengaran. - Tes kekuatan otot dan refleks. - Tes NAPZA Pemeriksaan NAPZA dan alcohol dilakukan secara acak (random) dan bila dicurigai.	15.	Penyakit Teknik Bawah Air	Wajib	Penyakit dan kru kapal menggunakan sertifikat kesehatan yang valid dari International Maritime Organization (IMO).	16.	Pest Control	Wajib	Tes Cholinesterase (setiap 6 bulan)	17.	Tenaga Fireman & Tim Rescue	Wajib	- Tes Kebugaran (NAPFA Modifikasi) - Tes Spirometri - Tes buta warna	18.	Tenaga Kesehatan	Wajib	HbA1c	19.	Tenaga Sekutuan	Wajib	- Tes Kebugaran (NAPFA Modifikasi) - Tes Spirometri - Tes buta warna	20.	Tim Rescue	Wajib	- Tes Kebugaran (NAPFA Modifikasi) - Tes Spirometri - Tes buta warna	21.	Welder	Wajib	Tes Spirometri	√		R	P	
Paket Umum General Package	Keterangan Remarks																																																																																																									
1. Anamnesis																																																																																																										
2. Pemeriksaan Fisik Physical Examination	Tekanan darah, nadi, suhu, frekuensi pernafasan, indeks massa tubuh, tes visual Blood pressure, pulse rate, temperature, respiratory rate, body mass index, visual acuity test.																																																																																																									
3. Pemeriksaan Penunjang Supporting Examinations	Rekam jantung dengan EKG, Rontgen dada, gula darah puasa (GDP), Laboratorium darah (Hemoglobin, Leukosit/Trombosit), dan Urin rutin Electrocardiogram (EKG), chest X-ray, fasting blood sugar (FBS), Blood Laboratory (Hemoglobin, Leukocyte Platelet), and routine Urinalysis.																																																																																																									
No.	Jenis Pekerjaan	Jenis Pemeriksaan MCU	Keterangan																																																																																																							
		Pemeriksaan Dasar	Pemeriksaan Tambahan																																																																																																							
1.	Awak mobil tangki	Wajib	- Tes pendengaran. - Tes kekuatan otot dan refleks. - Tes NAPZA Pemeriksaan NAPZA dan alcohol dilakukan secara acak (random) dan bila dicurigai.																																																																																																							
2.	Bekerja di ruang terbatas (confined space)	Wajib	- Tes pendengaran - Tes Spirometri - Pada lensa ahli, jika hasil rekam jantung (EKG) abnormal maka dilakukan Treadmill test. - Fit test dilakukan juga bagi pengguna masker dan SCBA																																																																																																							
3.	Cleaning Service	Wajib	- Tes Kebugaran (NAPFA Modifikasi) - Tes Spirometri - Tes buta warna																																																																																																							
4.	Food Handler	Wajib	- Anti HAV - Stool Culture (setiap 6 bulan) Pemeriksaan NAPZA dan alcohol dilakukan secara acak (random) dan bila dicurigai.																																																																																																							
5.	Kru Kapal	Wajib	Penyakit dan kru kapal menggunakan sertifikat kesehatan yang valid dari International Maritime Organization (IMO).																																																																																																							
6.	Operator Alat Berat	Wajib	- Tes pendengaran. - Tes kekuatan otot dan refleks. - Tes NAPZA Pemeriksaan NAPZA dan alcohol dilakukan secara acak (random) dan bila dicurigai.																																																																																																							
7.	Operator Plant	Wajib	Test buta warna Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan potensi bahaya pekerjaan yang akan dilakukan.																																																																																																							
8.	Pekerja Kantor (Office Worker)	Wajib																																																																																																								
9.	Pekerja Laboratorium / Sampling (chemical handling)	Wajib	Monitoring biologi sesuai bahan kimia yang digunakan, aerosol dari debu. Penggunaan masker/respirator disesuaikan dengan bahan kimianya. Jika menggunakan masker maka lakukan fit test.																																																																																																							
10.	Pekerjaan di ketinggian	Wajib	- Tes pendengaran - Romberg test Perhatikan riwayat vertigo, epilepsy dan hasil wawancara atau anamnesis.																																																																																																							
11.	Pekerja Sipil, Mechanical, Electrical	Wajib	Tes buta warna khusus untuk pekerjaan electrical																																																																																																							
12.	Pekerjaan yang terpapar kebisingan	Wajib	Tes Audiometri Perhatikan Noise Reduction Rate (NRR) pelindung telinga.																																																																																																							
13.	Pekerjaan yang terpapar radiasi perunggu	Wajib	Pemantauan fungsi organ target, sesuai dosis hasil																																																																																																							
14.	Pengemudi mobil berpenumpang	Wajib	- Tes pendengaran. - Tes kekuatan otot dan refleks. - Tes NAPZA Pemeriksaan NAPZA dan alcohol dilakukan secara acak (random) dan bila dicurigai.																																																																																																							
15.	Penyakit Teknik Bawah Air	Wajib	Penyakit dan kru kapal menggunakan sertifikat kesehatan yang valid dari International Maritime Organization (IMO).																																																																																																							
16.	Pest Control	Wajib	Tes Cholinesterase (setiap 6 bulan)																																																																																																							
17.	Tenaga Fireman & Tim Rescue	Wajib	- Tes Kebugaran (NAPFA Modifikasi) - Tes Spirometri - Tes buta warna																																																																																																							
18.	Tenaga Kesehatan	Wajib	HbA1c																																																																																																							
19.	Tenaga Sekutuan	Wajib	- Tes Kebugaran (NAPFA Modifikasi) - Tes Spirometri - Tes buta warna																																																																																																							
20.	Tim Rescue	Wajib	- Tes Kebugaran (NAPFA Modifikasi) - Tes Spirometri - Tes buta warna																																																																																																							
21.	Welder	Wajib	Tes Spirometri																																																																																																							
f.	Wajib melaksanakan DCU (Daily Check Up) sesuai ketentuan berikut : Tabel 4. Standar Peralatan pada saat pemeriksaan DCU <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Peralatan</th><th>Seri Pemeriksaan</th><th>Standar Peralatan</th></tr><tr><td>a.</td><td>Form DCU</td><td>Langkah-langkah Pemeriksaan DCU</td><td>Langkah-langkah Pemeriksaan DCU</td></tr><tr><td>b.</td><td>Pemeriksaan Fisik</td><td>Tekanan Darah, Nadi, Suhu, Respirasi, Berat Badan, Tinggi Badan, Indeks Massa Tubuh, dan lain-lain</td><td>Pengukuran visual, Pengukuran visual</td></tr></table>	No.	Jenis Peralatan	Seri Pemeriksaan	Standar Peralatan	a.	Form DCU	Langkah-langkah Pemeriksaan DCU	Langkah-langkah Pemeriksaan DCU	b.	Pemeriksaan Fisik	Tekanan Darah, Nadi, Suhu, Respirasi, Berat Badan, Tinggi Badan, Indeks Massa Tubuh, dan lain-lain	Pengukuran visual, Pengukuran visual	√		R	P																																																																																									
No.	Jenis Peralatan	Seri Pemeriksaan	Standar Peralatan																																																																																																							
a.	Form DCU	Langkah-langkah Pemeriksaan DCU	Langkah-langkah Pemeriksaan DCU																																																																																																							
b.	Pemeriksaan Fisik	Tekanan Darah, Nadi, Suhu, Respirasi, Berat Badan, Tinggi Badan, Indeks Massa Tubuh, dan lain-lain	Pengukuran visual, Pengukuran visual																																																																																																							

No	Requirement	Responsibility Provide By		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	PP	Vendor	
	g. Kewajiban mengikuti HSE General Induction, Basic Safety Training & Specific training pekerjaan khusus lainnya untuk ketentuan Lulus HSE Pass dan pemberian ID Badge dan Kartu HSE Pass sebagai pengendalian akses setiap pekerja.	√	√	R	P	
	h. Proses HSE Passport / ID Badge agar di siapkan persyaratan di bawah ini : Vendor harus melengkapi database karyawan yang akan dipekerjakan di lokasi project : - Formulir pengajuan kartu HSE Passport yang telah di isi lengkap dengan di tanda tangan oleh pekerja dan atasan pekerja - Hasil Medical check up maksimal 1 tahun terakhir - Pas Foto (soft file) berwarna ukuran 2x3 berlatar belakang merah - Suket dukcapil (bagi yg terkendala KTP) - Soft file KTP/ KITAS & Passport (Expat) - Soft file SIM (driver) - Soft File SIO kompetensi untuk personnel khusus - SKCK / Surat keterangan tenaga kerja dari perusahaan - Usia pekerja Min 18th - Max 56th, jika terdapat personnel di usia diatas 56 tahun hanya di izinkan untuk kualifikasi tenaga ahli/ bukan direct worker harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan management proyek PP dan Pertamina. i. Proses SIML (Surat Ijin Masuk Lokasi) Vendor harus melengkapi database karyawan yang akan masuk dan bekerja di lokasi TBBM (Area Eksisting Operasional) : - MCU (Medical Check Up) - Induksi K3LL - Basic Safety Training - HSE Passport - Foto ID - Hasil NAPZA 9 kriteria dengan masa berlaku 6 bulan - SKCK yang valid Vendor harus melengkapi database karyawan yang bekerja di area diluar TBBM / masuk ke wilayah proyek Pipanisi Peragas : - MCU - Induksi K3LL - Basic Safety Training - HSE Passport - Foto ID - Surat keterangan berperilaku baik dari perusahaan subkontraktor yang dilandatangani oleh pimpinan perusahaan		√	R	P	
4	Dokumen Ketenagakerjaan					
	a. Vendor harus menyerahkan salinan dokumen kontrak dengan pekerja yang akan dipekerjakan di lokasi project dan dokumen kepesertaan BPJS kesehatan serta ketenagakerjaan yang mencakup semua pekerja bidder yang terlibat di project.		√	R	P	
	b. Vendor harus melengkapi database karyawan yang dipekerjakan bidder untuk pekerja yang akan dipekerjakan di lokasi project		√	R	P	
5	Alat Pelindung Diri (APD)					
	Vendor harus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai dan sesuai standart berikut: a. Safety Helmet: Setara EN 397, ANSI Z88.1 - 2009 Type 1, Class G (for general) and E (or electrical work) b. Safety Glasses & Face Protection: Setara EN166 atau ANSI Z87.1/AS1067/NZS 1337 (Jenis smoke untuk siang, Clear untuk malam) c. Safety Glove: Conductive heat resistance, cut-resistance, chemical permeation resistance, heat and flame protection, electrical-resistance (Setara EN 388, EN 420 or AS/NZS 5812 Standard) as per scope of work. Heavy Duty Hand Gloves (rigger) d. Masker: Setara EN 149, OSHA 29 CFR199.134 NIOSH-N95 e. Safety Shoes : Setara ANSI Z41.1 / EN 345-1 Dual Density Polyurethane outsole with steel toe f. Ear Protection: Setara EN 352.2 g. Full Body Harness/Fall Arrestor: Setara ANSI / ASSE Z359.5 (Double lanyard, hook absorber jika ketinggian diatas 6 meter) h. Seragam kerja Cover all Fire Resistant (area hot tap) 100% katun berat kain 7,5oz (pipeline) sesuai standart PT PP (Design terlampir) i. Safety rubber boots with steel toe (pekerja sipil) Setara ANSI Z41.1 / EN 345-1 Dual Density Polyurethane outsole with steel toe j. Rompi khusus rigger berwarna hijau dengan identitas inisial "rigger" pada posisi belakang rompi k. Rompi khusus flagman berwarna oranye dengan identitas inisial "flagman" pada posisi belakang rompi l. Life jacket type 1 untuk pekerjaan dekst air dengan kedalaman lebih dari 1m		√	R	P	

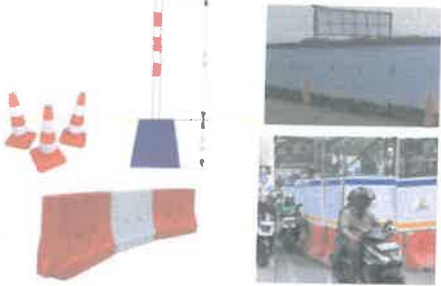No	Requirement	Responsibility Provide By		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	PP	Vendor	
6	Alat Penunjang keselamatan (APK)					
	Supporting Safety Tools & Device disesuaikan dengan resiko pekerjaan : - Gas tester - Environmental multi meter - ELCB, MCB, Grounding - Earth tester - Air Circulation (Blower, Exhaust) - Fire blanket - APAR - Secondary Containment - Vacuum truck - Water truck		√	R	P	
	Menyediakan hard/soft/physical barricades dengan ketentuan warna : a. Kuning-Hitam : untuk personil tertentu yang boleh memasuki area barikade yang ditunjukkan dengan surat ijin kerja dan untuk pembatas material / area kerja b. Merah-Putih : untuk larangan memasuki area dan digunakan untuk peralatan yang sedang dalam perbaikan c. Biru-Putih : untuk pembatas area pengetesan dan commissioning		√	R	P	
	Menyediakan barikade sesuai Traffic Management Plan : - Rubber cone / water barrier - Flagman - Pagar / penutup dari bahan PPDU (Pagar Proyek Daur Ulang)					
						
	Menyediakan Safety Campaign/Promotion (Buletin & Poster) bulanan sesuai dengan program PP EPC	√	√	P	P	
7	Emergency facilities					
	Vendor wajib menyediakan Emergency facilities :		√	R	P	
	- MOU kerja sama dengan rumah sakit/puskesmas terdekat untuk penanganan tanggap darurat		√	R	P	
	- Pengadaan emergency shelter / ruangan tanggap darurat (shelter yang dilengkapi peralatan evakuasi tanggap darurat) di area kerja		√	R	P	
	- Kotak P3K atau Responder Bag sesuai jumlah pekerja mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor : PER 15/MEN/VII/2008		√	R	P	
	- Spill kit untuk penanganan tumpahan		√	R	P	Based on jumlah alat berat dan generator
	- APAR Min 6 Kg, 1 kg untuk di mobil LV		√	R	P	Based on Alat Berat, generator dan titik aktivitas welding
	- Penyediaan Emergency Car - Penyediaan Eye wash di area kerja	√	√	R	P	
	Vendor wajib melaksanakan Accident Investigation terhadap insident yang terjadi dan berkolaborasi dengan PTPP sesuai dengan prosedur yang berlaku	√	√	R	P	
	Vendor bertanggung jawab atas Accident Impact / Victim (Crisis Handling & Recovery)		√	R	P	
8	Pemenuhan HSE Golden Rules / CLSR					
8.1	Alat Angkat					
	a. Alat angkat seperti crane dilengkapi dengan sertifikat MIGAS yang masih berlaku (perijinan dari instansi yang berwenang) dan lulus pemeriksaan PT Pertamina Gas. Umur pembuatan unit alat angkat / alat berat yang digunakan maksimum 10 tahun. Setiap Pesawat angkat wajib terpasang/dilengkapi perangkat keselamatan minimal seperti: crane level indicator, boom/jib stop, foot pedal lock, horns, boom hoisting limiting device, hook overwind preventive device / anti two block device, load chart, weight indicator, Load moment limiter / overload prevention unit, boom overwind preventing device, slingers dan peralatan sejenis.		√	R	P	Follow client requirement
	b. Excavator yang digunakan untuk alat angkat, bagian Hook / Pad eye wajib diuji riksa oleh PJIT MIGAS		√	R	P	
	c. Operator alat angkat harus memiliki SIO dari Ditjen MIGAS dan masih berlaku.		√	R	P	
	d. Sertifikat kelayakan dari alat peralatan, kendaraan, alat berat / alat angkat angkut dan asesoris angkat angkut (Lifting gear seperti : shackle, wire sling, chain block, bucket dll) sertifikat yang diterbitkan oleh pihak ketiga PJK3 yang melakukan uji riksa/uji kelayakan terhadap alat dan peralatan (Uji riksa wajib dilengkapi dengan tes beban dan tes tarik)		√	R	P	
	e. Peralatan angkat (lifting gear) (shackle, sling, spreader beam/bar, masterlink, chainblock, leverblock, dll) harus buatan pabrik/manufaktur dengan memenuhi standar ASME B30		√	R	P	Refer ke persyaratan standart checklist Owner

No	Requirement	Responsibility Provide By		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	PP	Vendor	
	f. Semua aktifitas lifting dengan beban 20 metric ton atau termasuk dalam lifting critical (kapasitas angkat 75% dari kapasitas crane, pengangkatan pipa bertekanan tinggi, pengangkatan di area yang berdekatan dengan listrik tegangan tinggi, dll) maka diwajibkan untuk disediakan Lifting Plan yang dilengkapi kalkulasi yang mendetail dan disetujui oleh pihak PP & Pertamina		√	R	P	
	g. Vendor harus mengadakan anemometer		√	R	P	
	h. Premob inspeksi dan Mobilisasi alat harus tersedia Berita Acara dan di infokan ke Pertamina	√	√	R	P	
8.2	Persyaratan kendaraan dan alat					
	a. Spesifikasi Kendaraan LV Setiap kendaraan ringan yang beroperasi selama di wilayah proyek adalah sebagai berikut: a) Pembuatan maksimal 3 (tiga) tahun terakhir b) Bahan Bakar: Diesel (dieselsuikan dengan lokasi dan kondisi pekerjaan) dan dilengkapi spark arrestor jika akan masuk ke area TBBM Cikampek dan TBBM Plumpang c) Warna kendaraan Terang d) Sabuk pengaman (standar pabrik) dengan standar keamanan sesuai peraturan pemerintah. e) Kotak PSK lengkap dengan isi obat-obatan standar f) Alat pemadam api ringan (APAR) yang masih layak digunakan (tidak kadaluarsa). g) Kendaraan ringan yang akan dioperasikan di jalan tanah harus menggunakan ban (termasuk ban cadangan dan rim) minimal tipe All-Terrain (A/T). h) Kaca film min. 20% - maks. 80% (termasuk untuk sebagian kaca depan atas dengan 25%). i) Dongkrak, kunci roda, segitiga pengaman dan tool kit standar. j) Dilengkapi dengan Sirene & Flash Lamp/lampu putar khusus untuk pengawalan. k) dilengkapi dengan sandaran kepala pada bagian tengah kursi penumpang bagian belakang (Centre head rest 2nd & 3rd row seat) l) Unit pembatas kecepatan m) Angkutan pekerja diwajibkan menggunakan bus / minibus, tidak diperkenankan menggunakan pick up / bak terbuka n) Driver diberikan training DDT		√	R	P	
	b. Transportasi Berat a) Unit dan sasis transportasi berat penggerak utama ditzinkan untuk usia maksimal 10 (sepuluh) tahun. Transportasi berat dilengkapi dengan Buku Uji Kendaraan Berkala (atau KIR) yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Nasional. b) Batas usia transportasi mengacu pada tanggal, bulan dan tahun yang tercantum dalam Sertifikat Pendaftaran Kendaraan (STNK). c) Kendaraan penggerak roda untuk alat berat dan/atau pengiriman alat berat khusus untuk area atau lokasi dengan jalan berbatu, jalan curam, dan jalan menurun. Jumlah kebutuhan kendaraan roda penggeraknya tergantung pada ukuran dan/atau panjang alat berat dan/atau alat berat. d) Kaca spion dengan tampilan pengemudi dan penumpang kendaraan yang lebar dan dapat disesuaikan. e) Tanda sisi dan belakang terlihat, termasuk penggunaan lampu belakang dan lampu rem yang dipasang tinggi dan terlihat. f) Sistem pengereman daya tahan (retarder engine atau yang setara) untuk medan yang curam. g) Alarm mundur dipastikan berbunyi. h) Tapak ban (di sisi penumpang belakang). i) Flap penekan semprotan ("flap lumpur"). j) Cermin cembung untuk memastikan pandangan luas area yang tidak terlihat, termasuk sisi penumpang dan di depan kabin di atas kendaraan. k) Indikator mur roda untuk mengidentifikasi baut ban yang longgar. l) Setiap 6 bulan sekali dilakukan pemeriksaan keselamatan oleh Perusahaan atau perwakilan yang ditunjuk oleh Perusahaan dan dapat dibuktikan dengan stiker PASS INSPECTION. m) Memiliki perisai kolong di bagian sisi kanan dan kiri dan sisi belakang. Alat pamanul cahaya berupa stiker terpasang pada bagian samping dan belakang kendaraan berat yang memiliki bak muatan terbuka (dump body), boks, tangki, atau pompa semen, trailer, semi trailer, dsb. n) Memiliki stiker identifikasi yang terpasang di bagian depan, kedua pintu kabin dan bagian belakang dengan ukuran minimal panjang x lebar = 25 x 20 cm. Identifikasi berupa logo perusahaan dan nomor kendaraan. o) Lampu isyarat (lampu rotary/strobe) warna kuning tanpa sirene untuk kendaraan berat angkutan barang berbahaya atau angkutan alat berat sesuai persyaratan Pemerintah terkait.		√	R	P	
	c. Subkontraktor harus memastikan setiap kendaraan yang digunakan telah dilakukan uji emisi dan telah memenuhi baku mutu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L.		√	R	P	
8.3	Pertakas Tangan (Handtool & Powertool)					
	a. Vendor harus memastikan semua peralatan yang digunakan telah memenuhi standard yang berlaku di Indonesia		√	R	P	
	b. Peralatan tangan dan portabel baik listrik, pneumatic, dan lain - lain wajib diinspeksi secara menyeluruh secara berkala setiap bulan, dan harus dilakukan visual inspeksi setiap kali alat tersebut akan dipakai		√	R	P	
	c. Safe Guard harus dipasang dalam kondisi baik setiap saat.		√	R	P	

No	Requirement	Responsibility Provide By		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	PP	Vendor	
	d. Semua peralatan bertegangan yang digunakan di site harus menggunakan tagangan 220 volts		√	R	P	
	e. Peralatan listrik harus memiliki tiga kawat kabel dengan dasar dan ditempatkan di dalam tanah, diberikan isolator ganda, atau dilatri dengan trafo isolator bertegangan rendah		√	R	P	
	f. Di area yang mudah terbakar, subkontraktor harus menyediakan handtool yang terbuat dari tembaga / perunggu (tidak menghasilkan percikan api)		√	R	P	
	g. Peralatan tangan wajib menggunakan dead man's switch		√	R	P	
	h. Kapasitas kecepatan batu gerinda/grinder disc (RPM) harus lebih besar daripada kapasitas kecepatan (RPM) alat gerinda		√	R	P	
	i. Komponen Elektrikal harus sesuai dengan standart IP 55 (Outdoor type).		√	R	P	
	j. Alat Handtool dan power tool wajib menggunakan produk pabrikan/manufaktur dan terdapat sertifikat kelayakan dari manufaktur		√	R	P	
8.4 Perangkat Elektrikal/ Listrik Temporary						
	a. Semua socket receptacle harus sesuai dengan Industrial type dengan three pin atau double insulation dan sesuai standart outdoor		√	R	P	
	b. Tidak menggunakan alat elektrikal/listrik yang dimodifikasi dan tidak sesuai dengan design dan standart manufakturnya		√	R	P	
	c. Perbaikan dan perawatan terhadap perangkat elektrikal/listrik hanya boleh dilakukan oleh teknisi yang kompeten dan bersertifikat		√	R	P	
	d. Penggunaan tape/isolasi hanya diperbolehkan menggunakan waterproof tape		√	R	P	
	e. Pengadaan peralatan LOTO (gembok, tagging, hasp, dll) untuk kebutuhan aktifitas isolasi energi ketika proses perawatan dan perbaikan		√	R	P	
	f. Semua kabel pada instalasi listrik temporary/temporary facility wajib menggunakan type NYY outdoor warna hitam		√	R	P	
	g. Seluruh perangkat elektrikal/listrik wajib menggunakan standart IP 55 (outdoor standart)		√	R	P	
	h. Panel listrik menggunakan standart IP 55 (Outdoor type) dan dilengkapi dengan proteksi ELCB, MCB dan grounding		√	R	P	
	i. Dilarang menggunakan peralatan listrik dengan spesifikasi standart indoor di area kerja		√	R	P	
8.5 Generator						
	a. Mengadakan absorbent/spill kit		√	R	P	
	b. Generator house sesuai standart PP		√	R	P	
	c. - Semua generator diatas 200 KVA harus memiliki certificate (SLO), dilengkapi dengan manual book operation, laporan maintenance dan secondary containment. - Subcontractor harus menyiapkan: - Completed with Safe guard - Proper grounding system and complied to standart - Roofing. - Ventilasi yang memadai - Exhaust / emission tidak terjebak di dalam shelter / room. - Dilengkapi silencer / sound proof. - Jarak minimum antar mesin adalah 1.5m - Hanya dioperasikan oleh authorised operator (nama, photo operator di display di pagar) - Dilengkapi dengan proper secondary containment - Fire Extinguisher 6kg standby di dekat Generator - Semua Generator kapasitas 500kW atau lebih harus mengadakan emission test secara berkala - Mengedekkan absorbent/spill kit - Komponen elektrikal memiliki standart IP 55 (outdoor type) - Semua Generator harus Passed Owner Inspection sebelum masuk dan digunakan untuk bekerja di site.		√	R	P	Follow client requirement
8.6 Scaffolding dan Tangga						
	a. Hanya Contractor and Sub-contractors Personnel yang bersertifikat dan sudah mengikuti training yang di ijinkan untuk memasang, membongkar dan memodifikasi scaffolding - Scaffold Material adalah jenis tubular, tidak berkarat, bengkok/rusak (diameter 48.3 mm, thickness 3.2 mm - 4 mm) - Scaffolding structure harus menggunakan 1 standart material (tidak diperbolehkan di campur / mixing) - The scaffold group / team terdiri dari - lead by 1 certified Scaffolding Supervisor (DISNAKER/MIGAS/BNSP), - certified scaffolder (DISNAKER/MIGAS/BNSP) - helper (certificate tidak dipersyaratkan). - Scaffolding frame is prohibited. - Supervisor scaffolder team bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kerapian material scaffolding dan memastikan akses kerja yang aman - Scaffolding decks Harus menggunakan material metal plank.		√	R	P	Instalasi scaffolding hanya boleh dilakukan oleh scaffolder yang mempunyai sertifikat kompetensi Scaffolding jenis frame tidak boleh digunakan untuk aktifitas konstruksi

No	Requirement	Responsibility Provide By		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	PP	Vendor	
	b. Vendor harus menyediakan : - Drawing arthagonal (tampak depan, samping, atas, dan informasi) atau menggunakan 3D - Daftar Material - Daftar pekerja yang terlatih dilengkapi sertifikat kompetensi yang masih valid - Fungsi scaffolding - Scaffolding plan - Penyediaan tagging sesuai standart		√	R	P	
	c. Akses tangga yang digunakan untuk bekerja di ketinggian / akses ke scaffolding harus memiliki system anti slips di setiap pijakan anak tangga		√	R	P	
8.7	Bekerja Di Ketinggian					
	a. Vendor harus mengadakan self retracting lanyard atau yoyo provide untuk bekerja di atas atap atau ketika lifeline tidak dapat direalisasikan		√	R	P	
	b. Tagging scaffolding dilakukan oleh inspector PT PP		√	P		
	c. Jenis scaffolding yang digunakan untuk akses pekerja menggunakan scaffolding jenis tubular		√	R	P	ketebalan pipa minimum 3,2 mm
	d. Mengadakan Anchor point dan lifeline yang layak (wire sling dengan diameter min 10 mm dan wire clip untuk mengikatnya) dan dilakukan pengujian dengan simulasi beban jatuh		√	R	P	
	e. Mengadakan Full Body Harness dengan Double Lanyard, Absorber and Rebar/Wide Hook sesuai ANSI Z359		√	R	P	
	f. Gondola, Manlift/Man Lift, Buckhoist, temporary elevator, builder hoist, passenger hoist or construction elevator dan lainnya harus memiliki sertifikat SILLO (Surat Ijin Layak Operasi) dan Uji Riksa dari Disnaker setempat serta dioperasikan oleh orang yang memiliki SIO (Surat Ijin Operator) dari KEMENAKER/MIGAS		√	R	P	penggunaan man basket wajib dilakukan uji riksa pihak ke 3 (PUK3/PJIT)
8.8	Bekerja Di Tempat Terbatas (Confined Space)					N/A
	a. Mengadakan gas detector untuk melakukan pengecekan kandungan gas dalam tempat terbatas (confined space)		√	P	R	
	b. Mengadakan APAR		√	P	R	
	c. Mengadakan Blower di sisi inlet dan outlet agar sirkulasi udara di dalam area tempat terbatas (confined space) memadai		√	P	R	
	d. Mengadakan Alat bantu pernafasan (SCBA)		√	P	R	
	e. Mengadakan hole watcher yang sudah dilatih prosedur keselamatan bekerja di tempat terbatas (confined space)		√	P	R	
	f. Mengadakan akses kontrol untuk masuk ke area tempat terbatas (confined space)		√	P	R	
8.9	Pekerjaan Panas (Pengelasan, Pengerindaan, Pemotongan, dll)					N/A
	a. Mengadakan APAR dan menyediakan Peralatan Fire protection untuk seluruh pekerjaan panas di area site berupa Fire Blanket		√	P	R	
	b. Mengadakan blower untuk sirkulasi udara dan menjaga suhu tempat pengelasan agar temperaturnya tidak panas		√	P	R	
	c. Mengadakan fire watcher yang sudah dilatih prosedur keselamatan pekerjaan		√	P	R	
	d. Memastikan seluruh alat listrik menggunakan standart Outdoor type		√	P	R	
	e. Mengadakan flashback arrestor di dua sisi (sisi regulator dan sisi welding torch)		√	P	R	
8.10	Tabung Gas Bertekanan					N/A
	a. Mengadakan bucket/keranjang untuk menempatkan tabung gas bertekanan dalam keadaan berdiri tegak dan terikat dengan rapat di area kerja		√	R	P	
	b. Mengadakan trolley untuk memindahkan tabung gas bertekanan di area kerja		√	R	P	
	c. Mengadakan cap untuk melindungi leher koneksi tabung gas bertekanan		√	R	P	
	d. Melakukan pengecekan kebocoran gas harian		√	R	P	
	e. Subkontraktor harus menyediakan penahan Flashback di kedua sisi untuk semua sambungan gas yang mudah terbakar & oksigen		√	R	P	
	f. MSDS & Alat pemadam kebakaran harus tersedia		√	R	P	
	g. Silinder oksigen dan asetilena harus disimpan secara terpisah. Jarak minimum 6 meter atau 2 meter dengan dinding tahan api dengan rating 30 menit harus memisahkan silinder tersebut.		√	R	P	
	h. Mengadakan MSDS gas bertekanan		√	P	R	
8.12	Pekerjaan Galian					N/A
	a. Memastikan kondisi dan fasilitas bawah tanah diidentifikasi, diberi tanda yang jelas, dan dikendalikan bahayanya.		√	R	P	
	b. Memastikan metoda penggalian sesuai prosedur penggalian dan dilengkapi dengan alat pengaman kerja sheet pile/penahan longsor jika kedalaman galian >1,5 meter		√	R	P	
	c. Jika galian >1,5 meter dan berpotensi ada gas beracun, agar dilakukan prosedur Confined Space dan dilakukan gas test		√	R	P	
	d. Memasang rambu, barkade / pagar pembatas untuk menghindari personil tidak berkepentingan masuk.		√	R	P	
8.11	Bekerja Di dekat, diatas, di dalam Air					N/A
	a. Vendor wajib menyediakan personnel sentry		√	R	P	
	b. Pekerjaan di dalam air harus dilakukan oleh Penyelam Profesional Komersial		√	R	P	
	c. Work Platform bekerja diatas air harus memiliki pagar dengan tinggi pagar harus 1100 mm dan memenuhi spesifikasi rancangan PT. Vale Indonesia		√	R	P	
	d. Menyediakan Ring buoy dengan Panjang tali min. 27.5m dan Jarak antara ring buoy min. 61m		√	R	P	
	e. Vendor wajib menyediakan Emergency horn		√	R	P	

No	Requirement	Responsibility Provide By		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	PP	Vendor	
	f. Vendor wajib menyediakan Emergency boat	√		R	P	
	g. Vendor harus menyediakan sailor ladder jika dibutuhkan	√		R	P	
	- Vendor wajib menyediakan Jaket penyelamat (life jacket) type 1 / type 3 (untuk dapat di kombinasikan dengan Full body harness) untuk bekerja di dekat atau di atas air	√		R	P	
	- Fall restrain harness untuk bekerja di dekat atau di atas lumpur					
	- Special harness (jika tersedia)					
8.12	Inspeksi Dan Tagging					
	a. Vendor wajib melaksanakan program inspection yang tidak terbatas pada : - Premobilisation - Inspeksi P2H/daily checklist - Monthly inspection - Color code triwulan	√	√	P	P	
	b. Template checklist inspeksi HSE alat dan peralatan	√		P		
	c. Melakukan uji riksa terhadap alat dan peralatan sebelum digunakan di area kerja	√	√	P	P	
	d. Pengesahan dan penolakan status penggunaan alat dan peralatan	√		P		
8.13	Pengelolaan sampah domestik dan konstruksi			R		
	a. Bekerjasama dengan dinas kebersihan setempat untuk mengelola sampah domestik dan konstruksi secara rutin		√	P	R	
	b. Bekerjasama(MOU) dengan pengelola sampah domestik dan konstruksi	√	√	R	P	
	c. Mengadakan tempat sampah 3 jenis sampah (3 warna) untuk memisahkan jenis sampah dengan ketentuan warna merah untuk sampah B3, warna hijau untuk sampah organik dan warna kuning untuk sampah non organik		√	R	P	
	d. 1. KANTONG SAMPAH ukuran jumbo (<90 x 130 cm) harus disiapkan untuk semua jenis pengumpulan sampah untuk memudahkan pemantauan dan memastikan bahwa sampah telah dibuang sesuai dengan klasifikasinya. 2. Memastikan housekeeping office dan area kerja subcon terpelihara setiap hari dan terjadwal rutin 3. Limbah padat domestik dibuang setiap hari dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir 4. Subkontraktor harus mendapatkan surat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup setempat mengenai pengangkutan limbah domestik ke Tempat Pembuangan Akhir. 5. Subkontraktor harus menyerahkan pembayaran retribusi kepada Badan Lingkungan Hidup setempat terkait pembuangan limbah domestik. 6. Subkontraktor harus mematuhi peraturan (nasional dan lokal) tentang pembuangan limbah domestik.		√	R	P	
	e. Tidak menyimpan sampah lebih dari 7 hari		√	P	R	
8.14	Pengelolaan material Kimia & Limbah B3					
	a. Vendor wajib mengadakan MSDS sesuai dengan ketersediaan bahan kimia dan mensosialisasikannya ke tim handling material kimia		√	P	R	
	b. Simbol dan label dari karakteristik material kimia dan sesuai regulasi yang berlaku wajib dipasang di tempat penyimpanan bahan kimia		√	R	P	
	c. Vendor harus mengadakan tempat khusus untuk menyimpan bahan kimia yang sesuai dengan standart PP divisi EPC (tersedia secondary containment untuk menampung tumpahan, spill kit, APAR, MSDS, dll).		√	R	P	
	d. Tidak mencampur jenis bahan kimia dalam satu penampungan/drum, memisahkan setiap jenis bahan kimia dengan penampungan/drum yang berbeda		√	R	P	
	e. Mengadakan palet dan penampungan/drum yang layak dan sesuai standart		√	R	P	
	f. Simbol keterangan isi drum/penampungan harus dipasang sebagai tanda untuk mengetahui isi dari drum/penampungan		√	R	P	
	g. Vendor harus bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai lisensi resmi pengelolaan limbah B3 dan memastikan pengelolaan limbah dilengkapi dengan bukti manifest pengelolaan limbah		√	R	P	
8.15	Fuel storage					
	a. 1. Menyediakan tempat penyimpanan bahan bakar sesuai dengan standar keselamatan dan lingkungan. 2. Penyimpanan bahan hidrokarbon harus aman dari kerusakan akibat alat berat dan kendaraan kecil serta petunjuk yang jelas mengenai keselamatan kerja, kapasitas penyimpanan dan jenis bahan hidrokarbon. 3. Tempat penyimpanan drum berkapasitas 200 liter harus dilengkapi tanggul penampungan. 4. Penyimpanan bahan bakar harus dilengkapi dengan penahan sekunder (penampungan 110% dari kapasitas peti kemas terbesar) 5. Tangki Penyimpanan Bahan Bakar lebih dari 200 L harus memenuhi persyaratan peraturan Indonesia yang berlaku (Permenaker No. 37 Tahun 2016 – Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kapal Tekanan dan Tangki Penyimpanan).		√	R	P	
8.16	Pencegah Tumpahan					
	a. Mengadakan Drip Pan yang wajib digunakan pada peralatan portable yang berpotensi menimbulkan tumpahan (di bawah genset, di bawah kendaraan dan alat berat ketika proses pengisian bahan bakar dan oli, di bawah drum bahan kimia/limbah B3 ketika proses handling		√	R	P	
	b. Bundwall/secondary containment harus di sediakan pada fasilitas di mana terdapat potensi tumpahan bahan kimia/limbah B3		√	R	P	
	c. Mengadakan spill kit untuk mengatasi jika terjadi tumpahan bahan kimia/limbah B3		√	R	P	

No	Requirement	Responsibility Provide By		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	PP	Vendor	
d	Mengadakan OIL ABSORBENT PAD 400 GSM (Natural oils prevent water absorption) untuk mengantisipasi jika terjadi tumpahan		√	R	P	
e.	Mengadakan Drum kosong tipe 1 dan 2 (Type 1: untuk material cair & Type 2: untuk material padat) untuk menampung tumpahan		√	R	P	
8.17	Kontrol Debu (pekerjaan timbunan, mobilisasi tanah)					
a.	Menutup bak truk dengan lembaran tarpal saat mobilisasi material yang melewati jalan umum		√	R	P	
b.	Menyediakan tim housekeeping khusus untuk pembersihan ceceran material di jalan		√	R	P	
c.	Melakukan water spray pada area kerja yang menimbulkan dampak bahaya debu		√	R	P	
8.18	Kontrol Frac Out					
a.	Standby tim frac out dan tim tanggap darurat		√	R	P	
b.	Menyediakan sand bag, vacuum truck dan water truck		√	R	P	
c.	Membuang limbah sesuai ketentuan regulasi lingkungan hidup		√	R	P	
9	Fasilitas dan Akomodasi					
9.1	Toilet					
a.	Vendor wajib mengadakan toilet portable dan biotech untuk staff dan pekerja dengan rasio 1:30 dan 2 gender (laki-laki & Perempuan)		√	R	P	N/A
b.	Toilet dilakukan inspeksi sesuai program dari PP		√	P	P	
c.	melakukan pengujian limbah air berkala setiap akan di buang atau bekerja sama dengan pengelola limbah dari pihak ke 3		√	R	P	
9.2	Air Minum					
a.	Jika menggunakan air minum isi ulang untuk konsumsi maka harus dilakukan pengujian kualitas air minum oleh pihak ke 3 secara berkala		√	P	P	
b.	Mengadakan tempat minum (botol/gelas) untuk 1 orang 1 tempat minum		√	P	P	
c.	Memastikan tempat penampungan air di area kerja sesuai dengan standart yang ditentukan oleh PP		√	P	P	
9.3	Shelter Istirahat					
a.	Mengadakan shelter minimal 2 (smoking dan non smoking shelter dipisah)	√	√	P	P	
b.	Menyediakan papan information board beserta isinya sesuai standart	√	√	P	P	
9.4	Pengamanan Dan Akses Kontrol					
a.	Vendor wajib mengamankan dan bertanggung jawab atas keamanan material dan peralatannya		√	R	P	
b.	Akses kontrol mengikuti prosedur PTTP & Owner	√	√	P		
10	HSE Program					
10.1	HSE Meeting & Communication					
a.	Subkontraktor wajib melaksanakan sosialisasi JHSEA dan Permit kerja sebelum mulai pekerjaan		√	R	P	
b.	Subkontraktor wajib mengikuti HSE Meeting (Toolbox, Meeting Koordinasi Mingguan & Bulanan) bersama PP dan Pertagas		√	R	P	
c.	Setiap pekerja wajib melaporkan Unsafe Action / Unsafe Condition min. 4 laporan / orang / bulan		√	R	P	
10.2	Program Rewards dan Punishment					
a.	Kontraktor akan menjalan prosedur rewards dan punishment yang berlaku di proyek, subkontraktor berkewajiban mengikuti semua regulasi di proyek dan berhak mendapatkan rewards atas kepatuhan regulasi	√		P		
b.	Kontraktor akan memberikan punishment terhadap subkontraktor apabila terbukti melakukan pelanggaran K3L seperti	√		P		
10.3	Pelaporan HSE					
	Vendor wajib mengirimkan Laporan HSE secara berkala kepada PT PP tidak terbatas pada : 1. Daily Report - setiap hari max. Dikirim pagi hari di hari berikutnya 2. Summary Weekly activity - setiap Jumat max. Jam 15.00 3. Weekly Report cut off Sabtu - submit tiap Sabtu max. Jam 23.59 4. Monthly Report cut off akhir bulan - submit max. Tgl 2 di bulan berikutnya 5. Monthly report lingkungan : logbook limbah B3 dan domestik dan mitigasi pencemaran/kerusakan lingkungan		√	R	P	Vendor using format provided by PP
	Uji kualitas lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dilaksanakan oleh pihak ketiga per 6 bulan		√	R	P	Untuk durasi pekerjaan >6 bulan dan dampak resiko pekerjaan tinggi
10.4	HSE Audit, CAR & NCR					
a.	Subkontraktor harus mengikuti audit Bulanan Key Performance Indicator (KPI) yang diadakan oleh HSE PP.	√	√	P	P	
b.	Subkontraktor wajib submit CSMS Pertamina (jika ada), jika tidak ada wajib submit SKT & SKL ke PT. PP	√	√	P	P	
b.	Manajer Konstruksi Subkontraktor dan Koordinator HSE wajib menghadiri audit HSE	√	√	P	P	
c.	Subkontraktor wajib menindaklanjuti setiap HSE CAR dan NCR yang diterbitkan oleh PP dengan target closing rate 100%.	√	√	P	P	

Notes:

- Jika ada perbedaan rencana inspeksi dan test antara DoR dan ITR, dokumen rujukan menggunakan inspeksi dan test yang telah disetujui oleh Kontraktor dan Owner
- Keterangan :
 - S (surveillance) : Kegiatan Monitoring PP terhadap pekerjaan Subkontraktor
 - W (Witness) : Subkontraktor bisa melanjutkan pekerjaan jika PT PP tidak datang sesuai jadwal undangan inspeksi
 - H (Hold) : Subkontraktor tidak bisa melanjutkan pekerjaan sebelum diinspeksi oleh PTTP
 - R (Review) : Proses review dokumen
 - P (Provide) : Wajib menyediakan



HSE



Procurement



Project Manager



Subcontractor



CONSTRUCTION & DEVELOPMENT

DIVISION OF RESPONSIBILITY QUALITY REQUIREMENTS

DOR-P-001

Discipline : Main Pipe Line
 Item : Open Cut & Auger Boring
 Proyek : Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang

Item Requirement Bisa disesuaikan kebutuhan proyek atau Persyaratan Client,
 DoR ini akan menjadi bagian dari kontrak PP dengan Subkontraktor

No	Requirements	Responsibility Provide By		Inspection Level		Remarks
		PP	Vendor	Vendor	PP	
1	Referensi Dokumen					
	a. Spesifikasi Proyek termasuk Standard & Code	√		R	P	
	b. IFC Drawing	√		R	P	
	c. Design Kalkulasi	√		R	P	Sesuai Lingkup Pekerjaan
	d. Rencana Mutu Proyek (Quality Plan)		√	P	R	
	e. Rencana Inspeksi & Test (ITP)		√	P	R	
	f. Metode Kerja Erection dan Instalasi		√	P	R	
	g. Welding Procedure Specification & Procedure Qualification Record (WPS & PQR) (Jika diperlukan)		√	P	R	MIGAS
	h. Prosedur Perbaikan (termasuk WPS & PQR Perbaikan) (Jika diperlukan)		√	P	R	MIGAS/KEMNAKER
	i. Welding Material (Electrodes) Control Procedure		√	P	R	
	j. Pre Heat & Post Weld Heat Treatment & Hardness Procedure (Jika		√	P	R	
	k. Prosedur Uji Tak Merusak/NDT (Thirdparty NDE Company)		√	P	R	Approved NDT Level III
	l. Prosedur Painting & Sandblasting (surface preparation) & Joint Coating		√	P	R	
	m. Uji Bertekanan (Hydrostatic Test & Leak Test)		√	P	R	
2	Verifikasi Material					
	a. Material Test Certificate (Mill Certificate, Certificate of Origin, Certificate of Conformance)		√	P	R	
	b. Contoh Mechanical Testing & Material Properties (Jika diperlukan)		√	P	W	
	c. Identifikasi dan Sampel Material		√	P	W	
	d. Pengecekan dimensi dan visual		√	P	W	
	e. Manufacture Data Record (MDR) (If Applicable)		√	P	R	
3	Kualifikasi personil					
	a. Welder or Welding Operator Qualification (Certification by MIGAS)		√	P	R	WPQT approved MIGAS
	b. NDT personel certificate Level II (Untuk Prosedur Approved Level III)		√	P	R	ASNT or eq
	c. Painting & Coating Inspector Level II		√	P	R	BNSP
	d. QC Inspector (Welding Inspector)		√	P	R	BNSP
	e. QC Dimensional (Jika diperlukan)		√	P	R	
4	Peralatan Inspeksi					
	a. Semua Alat inspeksi / Alat Ukur diakreditasi KAN /		√	P	R	
	b. Menyediakan alat inspeksi dan pengetesan :		√	P	R	
	- Theodolit, Total Station, Auto Level, Measuring Tape, Welding Gauge, Mirror Glass, Torque Wrench, Coating Thickness Gauge, Temp Gauge, Pressure Gauge, Holiday Test dll		√	P	R	
	d. Perlengkapan pekerjaan pengelasan		√	P	R	
	e. Perlengkapan pekerjaan pengecatan		√	P	R	
5	Inspeksi dan Test					
	a. Quality Kick of Meeting	√	√	P	P	
	b. Pengecekan Visual & Dimensional Penerimaan Material		√			
	c. Fit Up and Welding Inspection		√			
	d. Check PWHT Test (Jika diperlukan)		√			
	e. Non Destructive Test / Uji Tak Merusak					
	MT/PT(Magnetic Test/Penetrant Test), UT(Ultrasonic Test), RT(Radiography Test), dll		√	Sesuai ITP Yang di setuju oleh PP dan Owner		
	f. Accesories installation dan Line check		√			
	g. Pressure Test (Hydrotest or Pneumatic Test)		√			
	h. Tightening Bolt		√			
	i. Pengecekan Ketebalan Cat/Painting		√			
6	Final Document					
	a. Laporan Inspeksi dan Hasil Test/Pengujian (jumlah mengikuti owner)		√	P	R	

Notes:

- Jika ada perbedaan rencana inspeksi dan test antara DoR dan ITR, dokumen rujukan menggunakan Inspeksi dan test yang telah disetujui oleh Kontraktor dan Owner
- Keterangan :
 - S (surveillance) : Kegiatan Monitoring PP terhadap pekerjaan Subkontraktor
 - W (Witness) : Subkontraktor bisa melanjutkan pekerjaan jika PT PP tidak datang sesuai jadwal undangan inspeksi
 - H (Hold) : Subkontraktor tidak bisa melanjutkan pekerjaan sebelum diinspeksi oleh PTPP
 - R (Review) : Proses review dokumen
 - P (Provide) : Wajib menyediakan

QA/QC

Procurement

Project Manager

SEMANGAT WALA TANTA
Subcontractor/Vendor

**DAFTAR PERIKSA PERSYARATAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
TENDER/SELEKSI TERBATAS - SUBKONTRAKTOR (NON-OA)**

Petunjuk Pengisian

Vendor diharapkan membaca ringkasan ketentuan kontrak dan menyatakan persetujuan untuk setiap ketentuan berikut.

Keterangan

STC : *Special Terms and Conditions* (Syarat-Syarat Khusus Kontrak)

GTC : *General Terms and Conditions* (Syarat-Syarat Umum Kontrak)

No	Ketentuan	Lokasi	Uraian	Setuju	Tidak Setuju
1	Nilai Kontrak	STC Pasal 1	Nilai kontrak sudah termasuk PPN, PPh, biaya pemenuhan persyaratan kualitas dan K3 (termasuk prosedur tes yang dibutuhkan), biaya dokumentasi, pekerjaan persiapan, dan keuntungan.	✓	
		STC Pasal 1	Vendor menjamin bahwa harga yang diberikan akan berlaku sepanjang waktu pelaksanaan kontrak.	✓	
		GTC Pasal 6 dan Pasal 32	Nilai kontrak dalam STC tidak dapat dikaji, dieskalasi, atau disesuaikan dengan indeks harga, kecuali jika ada amendemen kontrak karena perubahan volume dan/atau lingkup pekerjaan.	✓	
		GTC Pasal 23	Dalam kondisi apa pun, kewajiban maksimal PT PP terhadap vendor maksimal sebesar nilai kontrak.	✓	
2	Kewajiban Umum Vendor	STC Pasal 7, GTC Pasal 10 dan Pasal 12	Vendor akan menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan di kontrak (terutama tentang harga kualitas, dan waktu pelaksanaan).	✓	
			Pekerjaan yang dilaksanakan bebas cacat (terlihat dan/atau tersembunyi) dan dapat digunakan.	✓	
		STC Pasal 4	Vendor segera memperbaiki jika ada ketidaksesuaian dalam pekerjaan.	✓	
3	Jaminan Pelaksanaan	GTC Pasal 15	Jika diperlukan, vendor siap bekerja dalam 2 shift untuk percepatan pemenuhan target selama didukung dengan lahan dan pekerjaan yang tersedia.	✓	
			Vendor menerbitkan jaminan pelaksanaan senilai 10% dari nilai kontrak.	✓	
			Jaminan berupa bank garansi yang bersifat <i>first demand, unconditional, dan irrevocable</i> .	✓	
4	Pengalihan Pekerjaan	GTC Pasal 20	Jika nilai kontrak naik minimal 5%, maka nilai jaminan pelaksanaan harus dinaikkan.	✓	
5	Penundaan Pekerjaan	GTC Pasal 23	Vendor tidak dapat mensubkontrakkan/mengalihkan pekerjaan kepada vendor lain sebelum mendapat izin tertulis dari PT PP.	✓	
			PT PP dapat memerintahkan vendor untuk menunda pelaksanaan pekerjaan.	✓	
6	Personel Vendor	GTC Pasal 8	Vendor tidak dapat menunda pekerjaan tanpa perintah tertulis dari PT PP.	✓	
			Personel yang digunakan dalam pekerjaan harus berkualitas, berkompeten, berpengalaman cukup, dan memiliki kualifikasi/sertifikasi yang disyaratkan ketentuan hukum yang berlaku.	✓	
		GTC Pasal 22	Jika diinstruksikan PT PP, vendor harus mengganti personel yang tidak memuaskan (menurut penilaian PT PP).	✓	
7	Peralatan dan Alat-Alat	GTC Pasal 9	Vendor harus memperoleh dan memiliki BPJS Ketenagakerjaan untuk semua personel yang digunakan dalam pekerjaan.	✓	
			Peralatan dan alat-alat harus sesuai dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan dan dipertahankan dalam kondisi yang benar dan aman.	✓	
		STC Pasal 7, GTC Pasal 10 dan Pasal 12	Jika ditemukan kerusakan, vendor harus segera memperbaiki atau menggantinya dengan biaya vendor sendiri.	✓	
8	Akses Bagi Personel PT PP	GTC Pasal 12	Peralatan dan alat-alat harus bersertifikat dan rutin dikalibrasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.	✓	
9	K3 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	GTC Pasal 16	Personel PT PP setiap saat harus dapat mengunjungi/memeriksa/menginspeksi lokasi pelaksanaan pekerjaan baik di lokasi proyek maupun lokasi lain, dengan pemberian akses, fasilitas, izin, dan perlengkapan keselamatan oleh vendor.	✓	
10	Denda Keterlambatan	GTC Pasal 5	Vendor harus memenuhi seluruh persyaratan K3 dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan ketentuan hukum yang berlaku, PT PP, dan pemilik proyek.	✓	
		GTC Pasal 25	Denda keterlambatan 2% (per mil) per hari dari nilai kontrak, maksimal 10% dari nilai kontrak.	✓	
11	Pembayaran dan Klaim	STC Pasal 5	Jika denda telah melebihi 10%, PT PP dapat memutus kontrak dengan vendor (dengan mengesampingkan KUH Perdata Pasal 1266).	✓	
		GTC Pasal 7	Tidak ada uang muka.	✓	
		GTC Pasal 32	PT PP dapat menangguhkan pembayaran jika vendor laai memenuhi kewajibannya.	✓	
12	Serah Terima Pekerjaan dan Masa Pemeliharaan	GTC Pasal 3	Klaim yang dapat dilakukan vendor hanya berupa klaim perpanjangan waktu.	✓	
		STC Pasal 3	Klaim I hanya dapat diminta vendor jika progres pekerjaan telah mencapai 100% terhadap nilai kontrak.	✓	
		GTC Pasal 13	BAST I dapat diterbitkan jika vendor telah melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. PT PP dapat menerbitkan daftar perbaikan pekerjaan untuk diselesaikan vendor sebelum penerbitan BAST I.	✓	
		GTC Pasal 11	Masa pemeliharaan ditetapkan selama 12 bulan setelah BAST I.	✓	
		GTC Pasal 14	BAST II diterbitkan jika masa pemeliharaan telah selesai dan hasil pekerjaan diserahkan dalam kondisi bersih dan siap pakai.	✓	
		GTC Pasal 11	Vendor tetap bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi walaupun telah lewat masa pemeliharaan, sepanjang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.	✓	
13	Keadaan Kahar	GTC Pasal 24	Tidak ada dalam dari PT PP maupun vendor jika terjadi kejadian keadaan kahar.	✓	

**DAFTAR PERIKSA PERSYARATAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
TENDER/SELEKSI TERBATAS - SUBKONTRAKTOR (NON-OA)**

Petunjuk Pengisian

Vendor diharapkan membaca ringkasan ketentuan kontrak dan menyatakan persetujuan untuk setiap ketentuan berikut.

Keterangan

STC : *Special Terms and Conditions* (Syarat-Syarat Khusus Kontrak)

GTC : *General Terms and Conditions* (Syarat-Syarat Umum Kontrak)

No	Ketentuan	Lokasi	Uraian	Setuju	Tidak Setuju
14	Pemutusan Perjanjian	GTC Pasal 25	PT PP berhak memutus kontrak jika vendor melanggar ketentuan dalam perjanjian (dengan mengesampingkan KUH Perdata Pasal 1266).	√	
			Jika harga yang diberikan vendor lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak selesai lebih tinggi dari nilai kontrak, selisih harga ditanggung vendor.	√	
15	Larangan KKN	GTC Pasal 31	Vendor (beserta anak perusahaan dan afiliasinya) dilarang menawarkan atau menjanjikan imbalan atau hadiah untuk memengaruhi siapa pun yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan.	√	
			Vendor (beserta anak perusahaan dan afiliasinya) dilarang membuat dokumen/keterangan palsu dalam pelaksanaan pekerjaan.	√	

Penafian (Disclaimer)

- Halaman ini hanya merupakan ringkasan poin penting dari STC dan GTC; STC lengkap mengacu ke hasil klarifikasi dan negosiasi dengan PT PP dan GTC lengkap dapat dilihat pada lampiran dokumen tender.
- Jika ingin mengikuti Tender di Smart e-Proc PT.PP, maka vendor wajib menandatangani STC dan GTC sebagaimana disebut dalam poin (a).
- Merupakan poin mandatory
- Jika vendor mengajukan perubahan pada poin mandatory, maka dapat mengurangi Penilaian Vendor pada tahap Evaluasi Seleksi & Negosiasi selanjutnya.

Disetujui Oleh,


Hana Gus Dwi Wijaya
PT Semangat Waja Tama

FORMULIR REKAPITULASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA : PT Semangat Waja Tama
ALAMAT : M GOLD TOWER Lantai 20, Jl. KH. Noer Ail, RT.008/RW.002, Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat 17148
NAMA PEKERJAAN : Jasa Pipanisasi Cikampek - Plumpang
PEMILIK PEKERJAAN : PT Pertamina Gas
NO. DOKUMEN :

URAIAN PEKERJAAN	NILAI GABUNGAN BARANG/JASA (Rp)				TKDN	
	DN	LN	TOTAL		BARANG/ JASA	GABUNGAN
			RIBU (Rp)	% KDN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BARANG						
I Material Langsung (Barang Baku)	6.874.083.766	978.181.234	7.852.265.000	87,54	79,33	
II Peralatan (Barang Jadi)	422.576.750	390.523.250	813.100.000	51,97	4,88	
A. Sub Total Barang	7.296.660.516	1.368.704.484	8.665.365.000	138,51	84,20	
JASA						
III Manajemen Proyek dan Perekayasaan	1.940.000.000	-	1.940.000.000	100,00	9,31	
IV Alat Kerja/Fasilitas Kerja	1.209.240.000	3.330.760.000	4.540.000.000	26,64	5,80	
V Konstruksi dan Fabrikasi	3.662.500.000	-	3.662.500.000	100,00	17,58	
VI Jasa Umum	10.695.000.000	-	10.695.000.000	100,00	51,33	
B. Sub Total Jasa	17.506.740.000	3.330.760.000	20.837.500.000	326,64	84,02	
C. Total Biaya (A+B)	24.803.400.516	4.699.464.484	29.502.865.000	466,15		84,07

Formulasi Perhitungan :

% TKDN (Gabungan Barang dan Jasa)	=	$\frac{\text{Nilai Barang Total (3C)} - \text{Nilai Barang Luar Negeri (3B)}}{\text{Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)}}$
	=	$\frac{\text{Nilai Jasa Total (8C)} - \text{Nilai Jasa Luar Negeri (8B)}}{\text{Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)}}$

Bekasi, 27 Oktober 2025

Dibuat Oleh,
PT. Semangat Waja Tama


Hana Gus Dwi Wijaya
 Direktur

[illegible]

NO. DOKUMEN

[illegible]

Formulir 4.3 : TKDN Gabungan Barang dan Jasa untuk Manajemen Proyek dan Perakayasaan

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA

ALAMAT

NAMA PEKERJAAN

PEMILIK PEKERJAAN

NO. DOKUMEN

: PT Semangat Waja Tama

: M GOLD TOWER Lantai 20, Jl. KH. Nher Ali, RT.008/RW.002, Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat 17148

: Jasa Pibanisasi Cikampek - Plumpang

: PT Pertamina Gas

:

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	PEMASOK/NEGARA ASAL	TKDN (%)	JUALAH	SATUAN	HARGA SATUAN (RIBU RP.)	BIAYA (RP.)			TKDN JASA (%)
								KDN	KLN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
1	Project Manajer	Pengalaman > 5 tnh	Indonesia	100	1	10,00 bin	35.000.000,00	350.000.000,00	-	350.000.000,00	18,04
2	Construction Manajer	Pengalaman > 5 tnh	Indonesia	100	1	10,00 bin	30.000.000,00	300.000.000,00	-	300.000.000,00	15,46
3	HSE	Pengalaman > 5 tnh	Indonesia	100	5	10,00 W	10.000.000,00	500.000.000,00	-	500.000.000,00	25,77
4	Project Control	Pengalaman > 5 tnh	Indonesia	100	1	10,00 bin	10.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	5,15
5	Engineer	Pengalaman > 5 tnh	Indonesia	100	1	10,00 bin	12.000.000,00	120.000.000,00	-	120.000.000,00	6,19
6	Humus	Pengalaman > 5 tnh	Indonesia	100	1	10,00 bin	9.000.000,00	90.000.000,00	-	90.000.000,00	4,64
7	Material Control	Pengalaman > 5 tnh	Indonesia	100	1	10,00 bin	9.000.000,00	90.000.000,00	-	90.000.000,00	4,64
8	QC	Pengalaman > 5 tnh	Indonesia	100	3	10,00 bin	13.000.000,00	390.000.000,00	-	390.000.000,00	20,10
9								-	-	-	-
10								-	-	-	-
MANAJEMEN PROYEK DAN PEREKAYASAAN							SUB TOTAL	1.940.000.000,00	-	1.940.000.000,00	100,00

Formulir 4.4 : TKDN Gabungan Barang dan Jasa untuk Alat Kerja/Fasilitas Kerja

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA : PT Semangat Waja Tama
 ALAMAT : M GOLD TOWER Lantai 20, Jl. KH. Noer Ali, RT.008RW.002, Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat 17148
 NAMA PEKERJAAN : Jasa Pphanisasi Cikampek - Plumpang
 PEMILIK PEKERJAAN : PT Pertamina Gas
 NO. DOKUMEN :

NO	URAIAN	SPESIFIKASI/PEMA SOK	KEPEMILIKAN ALAT KERJA		TKDN (%)	JUMLAH	SATUAN/DURA SI	BIAYA DEPRES/SEWA ALAT (RIBU RP.)	BIAYA (RP.)			TKDN JASA (%)
			DIBUAT	DIMILIKI					KON	KLN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Excavator	XCMG	LN	LN + DN	31	7	10,00 bln	45.000.000,00	975.240.000,00	2.174.760.000,00	3.150.000.000,00	21,48
2	Mesin Las Miller	Miller	LN	LN + DN	-	6	10,00 bln	9.000.000,00	-	540.000.000,00	540.000.000,00	-
3	TMC 12 Ton	Tadano	LN	LN + DN	12	1	10,00 bln	70.000.000,00	84.000.000,00	616.000.000,00	700.000.000,00	1,85
4	External Clamp	-	LN	LN + DN	100	10	1,00 bln	15.000.000,00	150.000.000,00	-	150.000.000,00	3,30
5												
6												
7												
8												
9												
10												
ALAT KERJA / FASILITAS KERJA								SUB TOTAL	1.209.240.000,00	3.350.760.000,00	4.560.000.000,00	26,64

NO	URAIAN	KEWARGANEGERAAN	TKDN (%)	JUMILAH	DURASI	HARGA SATUAN (RIBU RP.)	BIAYA (RP.)			TKDN JASA (%)
							KDN	KLN	TOTAL	
1	2	3	5	6	7	8	9			10
1	Mekanik	Indonesia	100	2	1,00 bln	10.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,55
2	Teknisi Instalasi	Indonesia	100	25	1,00 bln	7.500.000,00	187.500.000,00	-	187.500.000,00	5,12
3	Perbaikan	Indonesia	100	1	10,00 bln	6.000.000,00	60.000.000,00	-	60.000.000,00	1,64
4	Teknisi Perawatan & Perbaikan	Indonesia	100	2	10,00 bln	6.000.000,00	120.000.000,00	-	120.000.000,00	3,28
5	Welder	Indonesia	100	10	10 bln	14.500.000,00	1.450.000.000,00	-	1.450.000.000,00	39,59
6	Filter	Indonesia	100	5	10 bln	13.500.000,00	675.000.000,00	-	675.000.000,00	18,43
7	Foreman	Indonesia	100	5	10 bln	15.000.000,00	750.000.000,00	-	750.000.000,00	20,48
8	Grafer	Indonesia	100	5	10 bln	8.000.000,00	400.000.000,00	-	400.000.000,00	10,92
9							-	-	-	-
10							-	-	-	-
KONSTRUKSI DAN FABRIKASI							SUB TOTAL	3.662.500.000,00	-	100,00

Formulir 4.6 : TKDN Gabungan Barang dan Jasa untuk Jasa Umum

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA

ALAMAT

NAMA PEKERJAAN

PEMILIK PEKERJAAN

NO. DOKUMEN

: PT Semangat Waja Tama

: M GOLD TOWER Lantai 20, Jl. KH. Noer Ali, RT.008/RW.002, Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat 17148

: Jasa Pipanisasi Cikampek - Plumpang

: PT Pertamina Gas

NO	URAIAN	KEWARGANEGARAAN	TKDN (%)	Jumlah	SATUAN/DURASI	HARGA SATUAN (RIBU RP.)	BIAYA (RP.)			TKDN JASA (%)
							KDN	KLN	TOTAL	
1	2	3	5	6	7	8	9			10
1	Transportasi Man Power	Indonesia	100	100	1,00 L/S	1.500.000,00	150.000.000,00	-	150.000.000,00	1,40
2	Transportasi Alat Excavator	Indonesia	100	7	1,00 Ls	15.000.000,00	105.000.000,00	-	105.000.000,00	0,98
3	Non Destructive Test	Indonesia	100	1	1,00 Ls	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	28,05
4	Soring Penahan Galian	Indonesia	100	30	1,00 Ea	18.000.000,00	540.000.000,00	-	540.000.000,00	5,05
5	Block Mat	Indonesia	100	10	1 Ea	20.000.000,00	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1,87
6	Katering	Indonesia	100	90.000	1 Ls	20.000,00	1.800.000.000,00	-	1.800.000.000,00	16,83
7	Commissioning	Indonesia	100	1	1 Ls	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	23,38
8	Jasa transportasi	Indonesia	100	1	10 Bln	400.000.000,00	400.000.000,00	-	400.000.000,00	3,74
9	Jasa Keamanan	Indonesia	100	1	10 Bln	200.000.000,00	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	18,70
10							-	-	-	-
JASA UMUM						SUB TOTAL	10.695.000.000,00	-	10.695.000.000,00	100,00

C = Comply
A = Acceptable deviation

 X = Not acceptable
VTC = Bidder to confirm / inform

No.	REQUIREMENTS	CLARIFICATION REQUEST	PT SEMANGAT WISATA TAMBA			REMARK
			SUBCOM Proposal / Response	Acceptance Status	Score	
1	SUBCONTRACTOR Data					
1	Name	By SUBCONTRACTOR				
2	Quality Management System	ISO 9001:2015				
2	Conformity to Reference Doc.					
	Project Desc. :					
1	Specification	Specification for Pipeline Construction Specification for Pipeline Welding Specification for Pipeline Pre-Commissioning	C			
2	Procedure	Hauling & Stringing Procedure Site Clearing and Grading Procedure Line Up Welding Procedure Field Joint Coating & Wrapping Procedure Trenching, Lowering & Back Filling Procedure Field Bending / Cold Bending Procedure Push Pull at Swampy Area Procedure Open Cut Crossing Procedure Traffic Management Procedure Welding Procedure NDE Procedure Pipeline Cleaning, Gauging, and Hydrotest Procedure Pipeline Surbbling, Drying, and N2 Purging Procedure	C			
3	BOQ					
4	Code & Standard :	BOQ for Open Cut & Auger Boring	C			
4	ASME B31.4	Required				
3	Technical Specification Requirement	Document to be submitted by Surkon				
	Productivity					
1	Open Cut (Land Clearing, Stringing, Welding, NDT, FJC, Holiday test, Trenching, Lowering & Backfilling)	TBA by Const Team	C			
2	HDD String	TBA by Const Team	C			
3	Push Pull	TBA by Const Team	C			
4	Auger Boring	TBA by Const Team	C			
5	Manual Boring	TBA by Const Team	C			
6	Work Duration	TBA by Const Team	C			
	Loading Plan					
1	Equipment Loading Plan	Required (mohon melampirkan surat kepemilikan atau kontrak sewa alat)	C			
2	Man Power Loading Plan	Required (husus untuk key person wajib melampirkan SD)	C			
4	Conformity to Scope of Works					
	Preparation Works					
1	Polaksanaan mobilisasi dan demobilisasi personel, bahan-bahan, peralatan, dan alat-alat sesuai Manpower dan Equipment Loading Plan yang disetujui PP	Required	C			
2	SLO, SIO dan sertifikasi kompetensi	Required	C			
3	Menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan akomodasi lainnya untuk tenaga kerja SUBCONTRACTOR	Required	C			
4	Menyediakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat dan kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh PP	Required	C			
5	Penyediaan area laydown untuk pelaksanaan pekerjaan Open Cut, Auger Boring serta entak material pipeline sesuai dengan volume pekerjaan	Required	C			
6	Menyediakan lahan kerja konstruksi untuk pelaksanaan pekerjaan	Required	C			
7	Melakukan koordinasi dan sosialisasi untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan pemilik lahan, warga terdampak, instansi-instansi terkait serta pihak-pihak lain yang perlu	Required	C			
8	Melakukan survei untuk konstruksi dan dokumentasi kondisi awal dan kondisi akhir area kerja	Required	C			
9	Menyediakan workshop untuk melakukan kegiatan fabrikasi untuk pelaksanaan pekerjaan (Cold Bend, CWC jika ada), penyimpanan material sisa dll	Required	C			
10	WPS dan PQT	Required	C			
5	Survey Works					
1	Test pit untuk kebutuhan pekerjaan (teknik metode kerja)	Yes, Required	C			
2	Survei kondisi awal dan akhir lokasi kerja (dokumentasi dan pencatatan)	Yes, Required	C			
3	Survei penempatan rel dan mesin (alignment survey)	Yes, Required	C			
	Engineering Works					
1	Menyediakan gambar konstruksi / field sketch (termasuk design Open Cut dan Auger Boring, machine layout, rute transportasi mesin, bore plan, as built, dll)	Yes, Required	C			
2	Menyediakan dokumen Metode Kerja dan Prosedur	Yes, Required	C			
3	Menyediakan dokumen kalkulasi (Open Cut and Auger Boring Calculation, sheet pile calculation, anchoring calculation, dll)	Yes, Required	C			
6	Technical Compliance					
1	Metodologi Pelaksanaan	Detail metode kerja Open Cut & Auger (step-by-step, prosedur safety, depth control)	C			
2	Sequence & Equipment Deployment	Rencana mobilisasi alat, layout kerja, work sequence	C			
3	Desain Auger Boring	Kedalaman, diameter bore, metode casing jika diperlukan	C			
4	Desain Open Cut Trenching	Lebar trench, depth, backfilling method, shoring system	C			
5	Material dan Equipment List	Mesin auger boring, excavator, rig, casing, shoring, dll	C			
6	Soil Stabilization & Dewatering Plan	Untuk area tanah lunak, rawan air	C			
7	Reinstatement Plan	Rencana pengembalian kondisi jalan, ROW, dan lingkungan	C			
8	Drawing / Sketsa Pelaksanaan	Diagram layout boring, trenching section, section crossing	C			
7	Personnel Qualification					
1	Project Manager	Berpengalaman min. 3 proyek sejenis	C			
2	Site Engineer	Mengetahui metode auger boring dan open cut	C			

		PENYEDIAAN JASA PIPANISASI BBM CIKAMPEK - PLUMPANG TECHNICAL BID EVALUATION FOR OPEN CUT & AUGER BORING WORKS PACKAGE				 CONSTRUCTION & INVESTMENT Empowering The Future
C = Comply A = Acceptable deviation		X = Not acceptable VTC = Bidder to confirm / inform				PCP-EPC-08-PL-195-008 REV. A
No.	REQUIREMENTS	CLARIFICATION REQUEST	PT SEMANGAT WAJA TAMA			REMARK
			SUBCOM Proposal / Response	Acceptance Status	Score	
3	Boring Machine Operator	Bersertifikat & berpengalaman	C			
4	Safety Officer	Bersertifikat AKSU / K3 proyek konstruksi	C			
5	Surveyor	Untuk identifikasi bawah tanah	C			
8	Equipment & Tools Availability					
1	Auger Boring Machine	Spesifikasi diameter, torque, thrust, dan panjang jangkauan	C			
2	Excavator, Dump Truck	Dukungan logistik pekerjaan trench	C			
3	Dewatering System	Pompa, settling tank (jika diperlukan)	C			
4	Shoring & Trench Box	Untuk keselamatan kerja trench dalam	C			
5	Kalibrasi & Sertifikat Alat	Bersertifikat alat survey dan alat berat	C			
9	HSE (Health, Safety, and Environment) Evaluation					
1	HSE Plan Proyek	Disesuaikan dengan scope pekerjaan Open Cut dan Auger	C			
2	JSA dan HIRA	Spesifik untuk pekerjaan boring dan trenching	C			
3	Emergency Response Plan	Terutama untuk area crossing jalan aktif atau pipa eksisting	C			
4	Program Pelatihan & Induksi	Buku pelatihan safety operator alat berat	C			
5	Statistik Kecelakaan	LTI, TRIR, dll. selama 3 tahun terakhir (jika ada)	C			
6	Prosedur waste management drilling mud & cuttings	Soft disposal, lumpur bor, material tidak terpakai	C			
7	Sertifikat personel K3	Yes, Required	C			
5	Technical Evaluation Result (Filled by PTP)					
1	ACCEPTABILITY					
2	NOTE					
Acceptability Range Value (0 - 10) 8.5 and Above : Accepted Below 8.5 : Not Accepted						

Diperiksa



Hana Gus Dwi Wulana
PT Semangat Waja Tama



CONSTRUCTION & INVESTMENT



SEMANGAT WAJA TAMA
Unlimited Spirits



PENYEDIAAN JASA PIPANISASI CIKAMPEK - PLUMPANG



SEMANGAT WAJA TAMA
Ultimate Spirit

CONSTRUCTION & INVESTMENT

INFORMASI PROYEK

PT.Pertamina Patra Niaga berencana untuk membangun jaringan pipa Cikampek menuju Plumpang sepanjang +- 96 Km.

Tujuan pembangunan jaringan pipa Cikampek – Plumpang adalah:

1. Percepatan Pembangunan infrastruktur energi
 2. Meningkatkan keandalan operasional dalam penyaluran BBM
- Jaringan pipa Cikampek – Plumpang akan mengangkut produk BBM dari kilang minyak KPI Balongan, Indramayu, Jawa Barat menuju TBBM Cikampek dan TBBM Plumpang dengan volume sekitar 4,6 juta Kl/tahun.






CONSTRUCTION & INVESTMENT



SEMANGAT WAJA TAMA
Ultimate Spirit

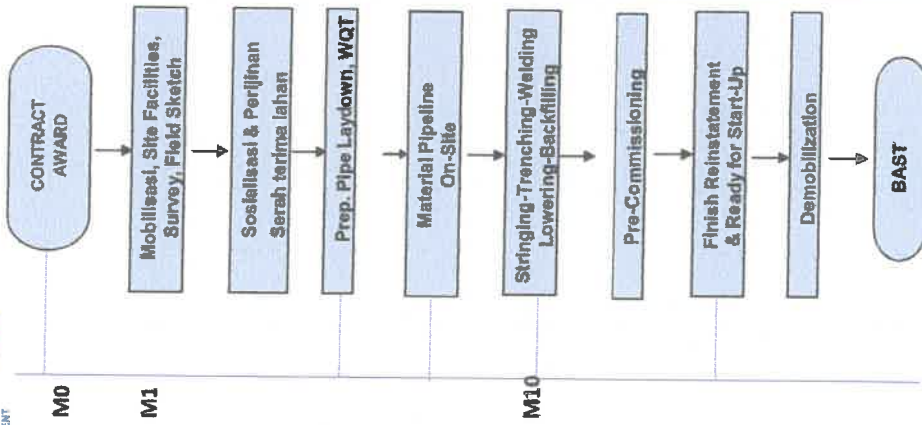

RENCANA KONSTRUKSI





CONSTRUCTION & INVESTMENT



SEMANGAT WAJA TAMA
Ultimate Service

RENCANA KONSTRUKSI

Preparation

1. WQT (Welder Qualification Test)
2. Pre-qualification test (field joint coating, Inspection)
3. Medical Check Up
4. Safety induction

WQT



SAFETY INDUCTION



PRE - QUALIFICATION TEST





CONSTRUCTION & INVESTMENT



SEMANGAT WAJA TAMA
Ultimate Spirit

RENCANA KONSTRUKSI

SITE SURVEY & TEST PIT

1. Surveyor menandai batasan untuk pekerjaan *clearing* dan *grading* jika di butuhkan.
2. Setelah pekerjaan *clearing* dan *grading* selesai, surveyor melakukan survey topography untuk menentukan kontur tanah pada area kerja.
3. Surveyor melakukan tracing kondisi pipa existing dan utilitas sepanjang ROW menggunakan pipe locator
4. Setelah mendapatkan data utilitas existing dilakukan test pit dengan rentang 50 Meter, 25 Meter atau dalam interval diperlukan
5. Peak tim test pit ada 6 tim dengan masing-masing 4 orang sehingga total 24 orang
6. Membuat Field Sketch drawing area centerline pipa dan utilitas existing





CONSTRUCTION & INVESTMENT



SEMANGAT WAJA TAMA
Ultimate Series

LOADING, UNLOADING, STRINGING



Pengiriman pipa menggunakan flat bed trailer untuk proses loading unloading menggunakan TMC. Apabila lahan tidak memungkinkan maka akan dilakukan hauling manual dengan alat bantu (Doli)

RENCANA KONSTRUKSI



Stringing (pengeceran pipa) menggunakan excavator, Rigger membantu memposisikan pipa menggunakan safety line



CONSTRUCTION & INVESTMENT



SEMANGAT WAJA TAMA
Ultimate Success

RENCANA KONSTRUKSI

FIT-UP & WELDING

1. Pipe Fitter menyiapkan pipa pertama dengan mengangkat pipa tersebut setinggi ± 50 cm diatas permukaan tanah dan diberikan *sand bag/band wall* dibawah pipa tersebut. *Sand bag* harus ditempatkan di samping pipa guna menghindari tergulingnya pipa ke arah samping.
2. External clamp akan dipasangkan pada ujung pipa, kemudian dilanjutkan dengan fit-up pada kedua pipa dengan alat manual (*tripod, chain block*) atau alat berat (*Excavator*).
3. QC inspector harus mengawasi pipa yang sudah di fit-up sebelumnya agar dapat dilanjutkan pengelasan (*welding*) sesuai prosedur yang ditentukan.
4. Lakukan Pengelasan (root pass, hot pass, filler pass and final pass).
5. Apabila memungkinkan string Panjang (4-6 batang) bisa dilakukan. Apabila terkendala maka dilakukan pengelasan string pendek (2-3 batang)



Welding Menggunakan External Clamp



CONSTRUCTION & INVESTMENT



SEMANGAT WAJA TAMA
Ultimate Spirit

RENCANA KONSTRUKSI

NON-DESTRUCTIVE TEST (NDT) & (FIELD JOINT COATING (FJC)

1. NDT dapat dimulai setelah pekerjaan welding selesai (*complete weld*).
2. Setelah hasil NDT dinyatakan lulus oleh Klien maupun *third party*, Field Joint Coating dapat dilakukan.



NDT Radiography



Field joint Coating




CONSTRUCTION & INVESTMENT




RENCANA KONSTRUKSI

Open Cut

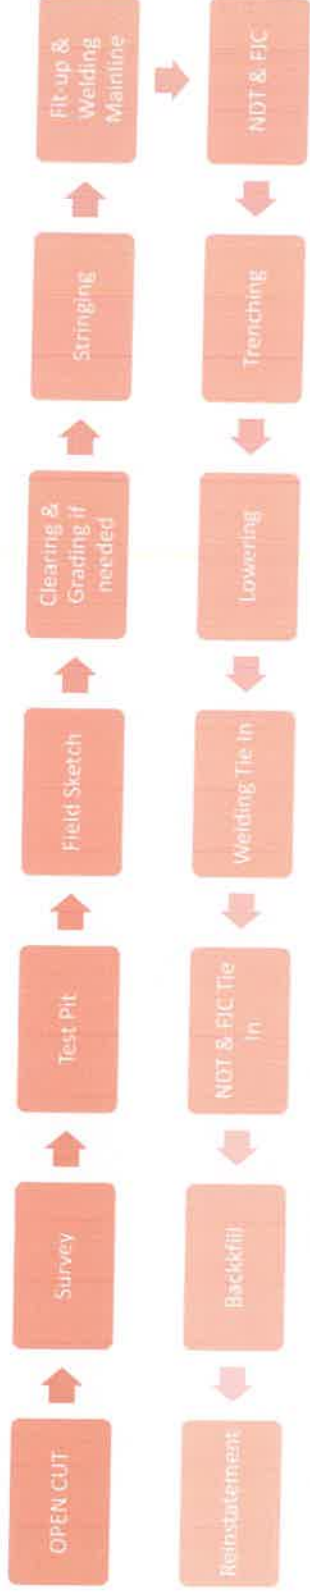

- A - Surveying and Clearing of Site
- B - Laying Out Pipe Sections
- C - Welding Pipe Sections Together
- D - Digging Pipeline Trench

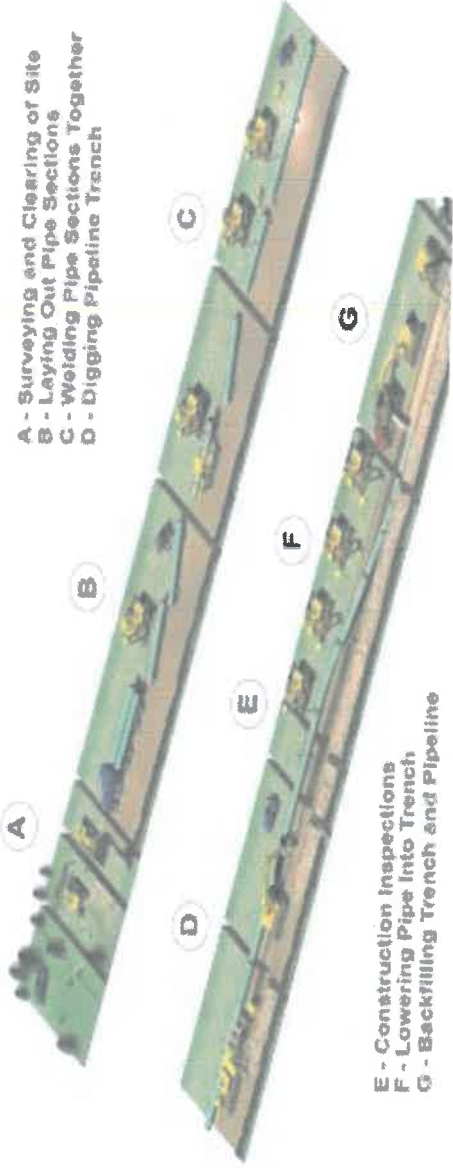

- E - Construction Inspections
- F - Lowering Pipe Into Trench
- G - Backfilling Trench and Pipeline




SEMANGAT WAJA TAMA
Adapted Spirit

CONSTRUCTION & INVESTMENT

TRENCHING (PENGGAJIAN)

RENCANA KONSTRUKSI

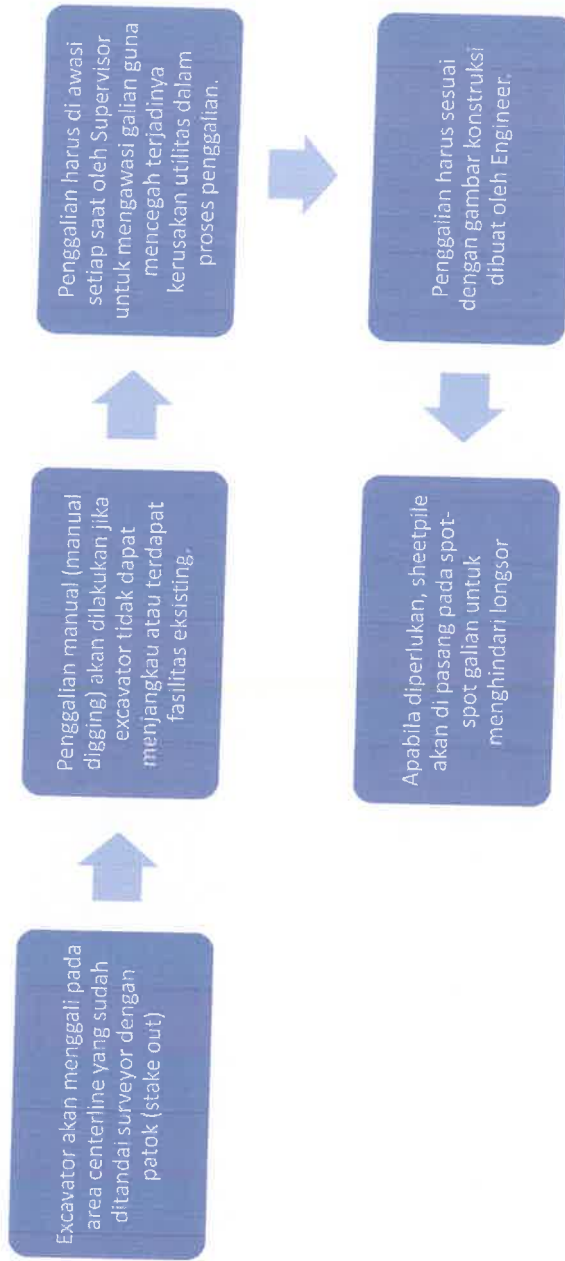

Penggalian di area Rumija



CONSTRUCTION & INVESTMENT



SEMANGAT WAJA TAMA
Ultimate Spirit

RENCANA KONSTRUKSI

PENURUNAN PIPA (LOWERING)

1. Penurunan pipa harus dilakukan oleh personil yang berpengalaman dan berada dalam pengawasan Supervisor. QC Inspector akan melakukan inspeksi agar sesuai persyaratan baik saat melakukan lowering maupun sesudah, dan membuat laporan inspeksi kepada Klien.
2. Pipa tidak boleh diseret atau digeser, pada saat proses penurunan pipa.
3. Sebelum melakukan penurunan pipa harus dilakukan *holiday test*, jika ada *coating* yang luka, maka harus segera diperbaiki sebelum pipa diturunkan kedalam galian.
4. Apabila lahan memungkinkan dapat dilakukan penurunan pipa dengan string panjang (4-6 Batang). Namun, apabila tidak memungkinkan maka dapat dilakukan penurunan dengan string pendek (2-3 Batang)





SEMANGAT WAJA TAMA
Ultimate Series

CONSTRUCTION & INVESTMENT

RENCANA KONSTRUKSI

BACKFILLING (PENIMBUNAN)

1. Penimbunan kembali harus dilakukan oleh personal yang berpengalaman dan diawasi oleh Supervisor.
2. Saat posisi pipeline sudah di as-built (elevasi dan posisi) penimbunan kembali dapat dilakukan.
3. Pipa akan di timbun kembali sesuai dengan prosedur yang telah disetujui dan menggunakan material hasil penggalian. Material timbunan harus dipilih agar tidak ada sampah atau benda keras untuk menghindari kerusakan pada coating pipa dan material pipa tersebut.
4. Marker Tape akan di gelar Ketika backfill telah dilakukan sebanyak 50%
5. Semua penimbunan kembali harus dipadatkan dengan bucket excavator untuk meminimalisir penurunan.






CONSTRUCTION & INVESTMENT



SEMANGAT WAJA TAMA
Ultimate Spirit

RENCANA KONSTRUKSI

TAHAPAN PEKERJAAN METODE AUGER BORING

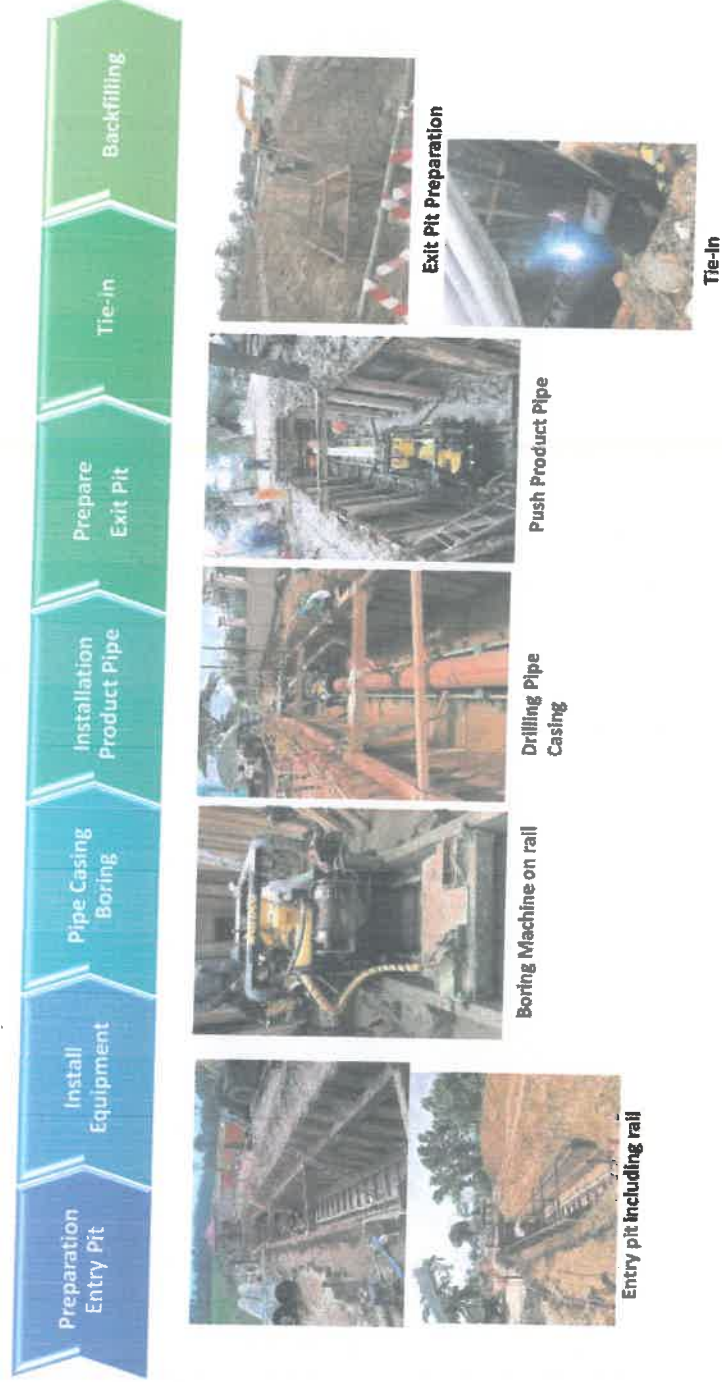




CONSTRUCTION & INVESTMENT



SEMANGAT WAJA TAMA
Unlimited Spirit

ORGANIZATION CHART

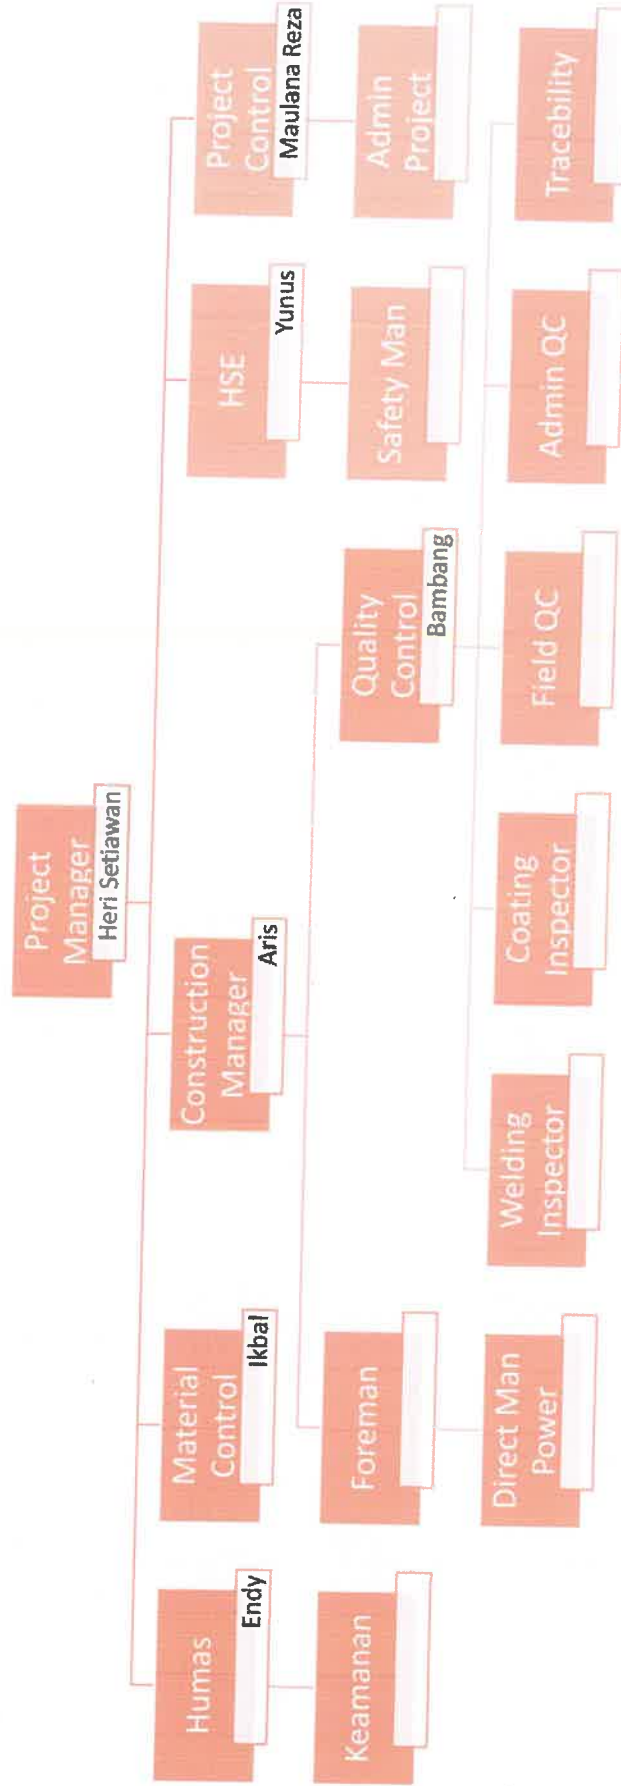



CONSTRUCTION & INVESTMENT



SEMANGAT WAJA TAMA
Unlimited Spirit

TARGET PRODUKTIVITAS PAKET 1

NO	DESKRIPSI	PROJECT MONTH										Length	Productivity (m/day)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total Group Month		
1	Tim Mainline HDD		1	2	2	2	2	2	2	2	15	9565	21,26
2	Tim Mainline	2	2	1	1	1	1	1	1	1	11	9350	28,33
3	Tim TLB		1	2	2	2	2	2	2	2	15	9350	20,78
	Total	2	4	5	5	5	5	5	5	5	41		

EXCAVATOR PLAN

DESKRIPSI	PROJECT MONTH									Excavator Month
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
String HDD		1	2	2	2	2	2	2	2	15
Malhline & Clearing	2	2	1	1	1	1	1	1	1	11
TLB 1		2	2	2	2	2	2	2	2	16
TLB 2			2	2	2	2	2	2	2	14
Total	2	5	7	7	7	7	7	7	7	56



CONSTRUCTION & INVESTMENT

SEMANGAT WAJA TAMA
Ultimate Spirit

MANPOWER LOADING PAKET 1

NO	DESKRIPSI	PROJECT MONTH										Total	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Man Month	Man Hour	
I	INDIRECT												
1	Project Manager	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,160	
2	Foreman	2	4	5	5	5	5	5	5	5	41	9,840	
3	Project Control	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,160	
4	Material Control	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,160	
5	Safetyman	2	1	5	5	5	5	5	5	5	38	9,120	
6	Quality Control	2	1	3	3	3	3	3	3	3	24	5,760	
7	Drafter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,160	
8	Surveyor	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	4,320	
9	Admin Project	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,160	
10	Driver	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,160	
11	Mechanic	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,160	
12	Humas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,160	
13	Coating Inspector	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,160	
14	Welding Inspector	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,160	
15	Field Engineer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,160	
16	Paramedic	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,160	
II	DIRECT MAN POWER OPEN CUT												
1	Welder	4	8	10	10	10	10	10	10	10	82	19,680	
2	Fitter	2	4	5	5	5	5	5	5	5	41	9,840	
3	Grinder	4	8	10	10	10	10	10	10	10	82	19,680	
4	Helper	6	12	15	15	15	15	15	15	15	123	28,520	
5	Rigger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,160	
6	Operator Excavator	2	5	7	7	7	7	7	7	7	56	13,440	
7	Keamanan	4	8	10	10	10	10	10	10	10	70	16,800	
8	Flagman	2	4	5	5	5	5	5	5	5	41	9,840	
9	Operator TMC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,160	
10	Tukang Gali	8	12	18	20	24	24	12	12	12	128	30,720	
	TOTAL	54	70	90	90	90	90	90	97	85	870	208,800	
	Man Hour	9,200	14,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	17,000	17,000			



CONSTRUCTION & INVESTMENT

SEMANGAT WAJA TAMA
Unlimited Spirit

EQUIPMENT LOADING PAKET 1

NO	DESKRIPSI	PROJECT MONTH									Total		Remarks	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Equipment Month	Equipment Hour		
I	Alat berat													
1	Excavator PC 100/ 200	2	5	7	7	7	7	7	7	7	56	13440	Vendor	
2	TMC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2160	Vendor	
3	Augher Boring Set				1	1	1	1			4	960	Vendor	
II	Equipment													
4	Pickup	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2160		
5	Elf	2	3	3	3	3	3	3	3	3	26	6240	Vendor	
6	Light Vehicle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2160		
7	Miller	4	8	10	10	10	10	10	10	10	82	19680	Vendor	
8	Theodolite TS	1	1	2	2	2	2	2	2	2	16	3840	Vendor	
9	NDT RT Kit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2160	Vendor	
10	Genset	2	2	4	4	4	4	4	4	4	32	7680		
11	Holiday Test Detector	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2160		
12	Water Pump	4	4	10	10	10	10	10	10	10	78	18720		
13	Tripod Chainblock	8	8	20	20	20	20	20	20	20	156	37440		
14	External Clamp	3	3	7	7	7	7	7	7	7	55	13200		
15	Pipe Locator	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2160		
16	Mesin Bending		1	1	1	1	1	1	1	1	8	1920	Vendor	

SCHEDULE PAKET 3

[illegible]



CONSTRUCTION & INVESTMENT



SEMANGAT WAJA TAMA
Ultimate Spirit

TARGET PRODUKTIVITAS PAKET 3

NO	DESKRIPSI	PROJECT MONTH									Total		Length	Productivity (m/day)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Group	Month		
1	Tim Mainline HDD	2	2	1	1	1	1	1	1		10		8371	27,90
2	Tim Mainline			2	1	1	1	1	1		7		7560	36,00
3	Tim TLB		1	1	2	2	2	2	2	1	13		7560	19,38
Total		2	3	4	4	4	4	4	4	1	30			

EXCAVATOR PLAN

DESKRIPSI	PROJECT MONTH									Excavator Month
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
String HDD	2	2	1	1	1	1	1	1		10
Mainline & Clearing			3	1	1	1	1	1		8
TLB 1			2	2	2	2	2	2		12
TLB 2				2	2	2	2	2		12
Total	2	2	6	6	6	6	6	6	2	42



CONSTRUCTION & INVESTMENT

SEMANGAT WAJA TAMA
Ultimate Spirit

MANPOWER LOADING PAKET 3

NO	DESKRIPSI	PROJECT MONTH										TOTAL	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Man Month	Man Hour	
1	INDIRECT												
1	Project Manager	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160	
2	Foreman	2	3	4	4	4	4	4	4	1	30	7.200	
3	Project Control	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160	
4	Material Control	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160	
5	Safetyman	2	1	5	5	5	5	5	5	5	38	9.120	
6	Quality Control	2	1	3	3	3	3	3	3	3	24	5.760	
7	Drafter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160	
8	Surveyor	1	1	2	2	2	2	2	2	2	16	3.840	
9	Admin Project	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160	
10	Driver	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160	
11	Mechanic	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160	
12	Humas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160	
13	Coating Inspector	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160	
14	Welding Inspector	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160	
15	Field Engineer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160	
16	Paramedic	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160	
DIRECT MAN POWER OPEN CUT													
1	Welder	4	6	8	8	8	8	8	8	2	60	14.400	
2	Fitter	2	3	4	4	4	4	4	4	1	30	7.200	
3	Grinder	4	6	8	8	8	8	8	8	2	60	14.400	
4	Helper	6	9	12	12	12	12	12	12	3	90	21.600	
5	Rigger	1	2	2	2	2	2	2	2	2	17	4.080	
6	Operator Excavator	2	2	4	4	6	6	6	6	6	42	10.080	
7	Keamanan	4	4	6	6	8	8	8	8	8	60	14.400	
8	Flagman	2	3	4	4	4	4	4	4	1	30	7.200	
9	Operator TMC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.160	
10	Tukang Gali	8	12	16	20	24	24	24	24	12	128	30.720	
TOTAL		53	53	74	74	78	78	78	78	48	605		
Man Hour		10.800	12.960	18.000	18.000	18.960	18.960	18.960	18.960	11.760		147.360	



CONSTRUCTION & INVESTMENT

SEMANGAT WAJA TAMA
Ultimate Series

EQUIPMENT LOADING PAKET 3

NO	DESKRIPSI	PROJECT MONTH										Total		Remarks
		Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Equipment Month	Equipment Hour		
I	Alat berat	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Excavator PC 100/ 135	2	2	4	6	6	6	6	6	4	42	10080	Vendor	
2	TMC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2160	Vendor	
4	Augher Boring Set				1	1	1				3	720	Vendor	
II	Equipment													
4	Pickup	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2160		
5	Elf	2	2	3	3	4	4	4	4	4	30	7200	Vendor	
6	Light Vehicle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2160		
7	Miller	4	4	6	6	8	8	8	8	8	60	14400	Vendor	
8	Theodolite TS	1	1	2	2	2	2	2	2	2	16	3840	Vendor	
9	NDT RT Kit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2160	Vendor	
10	Genset	2	2	4	4	4	4	4	4	4	32	7680		
11	Holiday Test Detector	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2160		
12	Water Pump	4	4	10	10	10	10	10	10	10	78	18720		
13	Tripod Chainblock	8	8	20	20	20	20	20	20	20	156	37440		
14	External Clamp	3	3	7	7	7	7	7	7	7	55	13200		
15	Pipe Locator	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2160		
16	Mesin Bending		1	1	1	1	1	1	1	1	8	1920	Vendor	



CONSTRUCTION & INVESTMENT



SEMANGAT WAJA TAMA
Unlimited Services

QC PLAN

Preparation

- Welder Qualification Test
- Bending Qualification Test
- Tools list & certificate
- Pad Eye Excavator Test

Construction

- As Built Drawing Report
- Hauling Report
- Stringing Report
- Welding Report
- NDT Report
- Field Joint Coating Report
- Holiday Test Report
- Trenching, Lowering, Backfill Report
- Reinstatement Report

HSE PLAN





CONSTRUCTION & INVESTMENT



SEMANGAT WAJA TAMA
Ultimate Spirit

DISKUSI DAN TANYA JAWAB

PENYEDIAAN PIPANISASI CIKAMPEK PLUMPANG



CONSTRUCTION & INVESTMENT



SEMANGAT WAJA TAMA
Unlimited Spirits
